

**Raport monitoringowy z realizacji zadań ujętych
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju
do roku 2020**



Jastrzębie-Zdrój

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	2
1.1. Źródło danych	2
1.2. Definicje przyjęte w niniejszym opracowaniu	2
2. Metodologia przeprowadzenia monitoringu	3
3. Analiza osiągniętych wskaźników projektowych	5
4. Analiza finansowych założeń z realizacji projektów	31
5. Analiza osiągniętych wskaźników monitoringowych	42
6. Podsumowanie	47
7. Uwagi	48

1. WSTĘP

Rewitalizacja - proces wyprowadzania obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane na tym terenie oraz prowadzone przez interesariuszy tego procesu.

Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do roku 2020 przyjęty został Uchwałą nr IV.18.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2017 r. Dokument został opracowany na podstawie współpracy pomiędzy Urzędem Miasta, a m.in. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2. Dokument stanowi aktualizację *Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015*. W kolejnym okresie LPR Jastrzębia-Zdroju do roku 2020 ulegał aktualizacji o kolejne projekty inwestycyjne i miękkie. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 25.01.2018 r. (Uchwała nr II.15.2018 z dnia 25.01.2018 r.).

Zmiany wskazano w *Tabeli 36 Lista i opis projektów głównych, realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji* oraz w tabeli *38 Tabela finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji*. Zamiany uwzględniono również w części wskaźnikowej dokumentu.

Opracowany Raport z monitoringu służy wyznaczeniu wskaźników, a także badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dążenia do założonych celów oraz poziomu ich osiągnięcia.

1.1. ŹRÓDŁO DANYCH

Informacje i dane, na podstawie których opracowany został przedstawiony raport, pozyskano w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębia-Zdroju oraz instytucjach i jednostkach z terenu miasta, m.in. w:

- Urządzie Miasta,
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- Powiatowym Urzędzie Pracy,
- Miejskim Ośrodkiem Kultury,
- Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2,
- JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.,
- Miejskim Zarządzie Nieruchomości,
- Orthogonie Sp. z o.o.
- ARCHiTEKT Studio Projektowe Paweł Kuczyński

1.2. DEFINICJE PRZYJĘTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

- **Zleceniodawca:** Miasto Jastrzębie-Zdrój.
- **Projekt/Zadanie/Raport:** Raport monitoringowy z realizacji zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do roku 2020.
- **RPO WSL:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- **PR:** Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do roku 2020.
- **Raport:** Zestawienie w formie jednolitego dokumentu informacji i wskaźników dotyczących stanu realizacji PR.
- **Monitoring:** Proces systematycznego zbierania, analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanego projektu w aspekcie finansowym i rzeczowym.
- **Okres sprawozdawczy:** Okres sprawozdawczy jest to okres, za który sporządza się sprawozdanie np. miesiąc, półrocze, rok.
- **Cel główny/strategiczny:** Cel odnoszący się do kluczowego problemu definiowany w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest on rezultatem wykorzystania powstałych produktów.
- **Wskaźniki monitoringowe, stanowiące podstawę oceny stopnia realizacji Programu. Wskaźniki projektowe/rezultatu:** Fizyczny efekt osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośredni wpływ

zrealizowanych działań/stworzonych produktów, osiągnięty natychmiast po realizacji projektu - określa zmiany jakie nastąpiły u beneficjentów.

- **Oddziaływanie:** Długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla beneficjentów pośrednich, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów.

2. METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA MONITORINGU

Istotą monitoringu jest gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji przydatnych w zarządzaniu rewitalizacją i wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji jest realizacja działań i projektów uwzględnionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służy system współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi program oraz analiza osiąganych wskaźników. Dane niezbędne do przygotowania raportu pozyskane zostały przez Wydział Merytoryczny Miasta m.in. od wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz poszczególnych podmiotów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Na potrzeby monitoringu w Programie Rewitalizacji określony został zestaw wskaźników monitoringowych, do których przyporządkowane zostały poszczególne cele operacyjne. Do tego opracowany został również wzór *Karty raportu monitoringowego z realizacji zadania ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji*

Rekomendowane wskaźniki monitoringowe, stanowiące podstawę oceny stopnia realizacji Programu, zamieszczone zostały poniżej. Zestaw wskaźników powstał w ścisłej korelacji z listą działań przyjętych do realizacji w ramach Programu. Punktem wyjścia dla monitorowania wskaźników w ramach Programu Rewitalizacji jest moment przyjęcia dokumentu, stanowiący jednocześnie punkt „0” dla działań związanych z monitoringiem i ewaluacją. Wskaźniki są monitorowane przyrostowo, przy czym poziomem bazowym jest poziom „0”, nie zaś stan bazowy wskaźnika ustalony na dzień przyjęcia Programu. Taka metodologia pomiaru wskaźników umożliwia monitoring uwzględniający jedynie działania zrealizowane w ramach procesu rewitalizacji, nie zaś działania prowadzone w okresie wcześniejszym, w ramach innych przedsięwzięć. Monitoring ilościowy przeprowadzony został na poziomie wskaźników podstawowych rozumianych jako wskaźniki projektowe/rezultaty.

PO-I) Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez kompleksowe działania o charakterze infrastrukturalno-architektonicznym [sfera przestrzenna].

Kierunek działania	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
K1 - Odnowa urbanistyczna obszarów miejskich i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej, K2 - Rozbudowa i optymalizacja układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej miasta, K3 - Rewitalizacja substancji mieszkaniowej, K4 - Tworzenie rozwiązań infrastrukturalnych wspierających rozwój gospodarczy, K5 - Rewitalizacja terenów i obiektów przemysłowych, K6 - Przebudowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, K7 - Poprawa jakości i konkurencyjności infrastruktury ochrony zdrowia, K8 - Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta, K9 - Rozwiązania systemowo-infrastrukturalne dla poprawy jakości środowiska naturalnego.	<ul style="list-style-type: none"> - Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - Liczba elementów infrastruktury udostępniającej /zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego - Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - Liczba nowopowstałych obiektów na cele sportowe oraz rekreacyjne - Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych i tras rowerowych - Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego - Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych, - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją, - Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

PO-II) Aktywizacja ekonomiczna obszaru wsparcia dzięki podniesieniu konkurencyjności i trwałej reorganizacji struktury gospodarczej [sfera gospodarcza].

Kierunek działania	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
<p>K10 - Aktywizacja gospodarcza mieszkańców i ułatwianie przekwalifikowania zawodowego,</p> <p>K11 - Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności oraz tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP),</p> <p>K12 - Kompleksowa promocja miasta skierowana na przyciągnięcie inwestorów,</p> <p>K13 - Podnoszenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta,</p> <p>K14 - Kształtowanie systemu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Liczba zrealizowanych staży - Liczba zrealizowanych dotacji - Liczba zrealizowanych prac interwencyjnych - Liczba zrealizowanych doposażeń stanowiska pracy - Liczba zaplanowanych do realizacji staży - Liczba zaplanowanych do realizacji dotacji - Liczba zaplanowanych do realizacji doposażeń
<p>PO-III) Wyrównywanie szans życiowych i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru wsparcia poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego [sfera społeczna].</p>	
Kierunek działania	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
<p>K15 - Aktywna polityka społeczna w celu neutralizacji zjawisk wykluczenia społecznego, marginalizacji i bierności,</p> <p>K16 - Walka z bezrobociem i biernością zawodową poprzez działania skierowane na podnoszenie kwalifikacji, aktywizację zawodową i rozwój osobowościowy mieszkańców,</p> <p>K17 - Poprawa bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii i dezintegracji społecznej,</p> <p>K18 - Przeciwdziałanie migracji zewnętrznej mieszkańców poprzez wzmacnianie identyfikacji mieszkańców z miastem oraz kształtowanie tożsamości lokalnej,</p> <p>K19 - Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców oraz propagowanie aktywnego stylu życia,</p> <p>K20- Wsparcie i podniesienie aktywności organizacji pozarządowych,</p> <p>K21 - Wykorzystanie i rozwój istniejącego potencjału edukacyjnego,</p> <p>K22 - Kształtowanie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy,</p> <p>K23- Aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób długotrwale bezrobotnych zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób z niepełnosprawnościami zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania - Liczba dzieci biorących udział w prezentacji młodych talentów - Liczba mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym - Liczba zorganizowanych pokazów filmowych - Liczba wydarzeń kulturalnych

Źródło: Opracowanie własne.

3. ANALIZA OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTOWYCH

Do *Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do roku 2020* zgłoszone zostały 64 projekty, których beneficjentami są m.in. Miasto Jastrzębie-Zdrój, instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje, inwestorzy prywatni czy organizacje pozarządowe. Na liście podstawowych projektów rewitalizacyjnych (*Tabela 36 Lista i opis projektów głównych, realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, str. od 130 Programu Rewitalizacji*) ujętych zostało 60 projektów natomiast na liście pozostałych projektów rewitalizacyjnych (*Tabela 37 Lista projektów rezerwowych, str. od 212 Lokalnego Programu Rewitalizacji*) 4 projekty. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich projektów i stopnia ich realizacji pod kątem wskaźników projektowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1 Stan realizacji projektów z listy podstawowej - wskaźniki projektowe

Lp.*	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu
1.	O krok do przodu Wsparcie dla osób z terenów rewitalizowanych	Ośrodek Pomocy Społecznej	<p>Projekt ma na celu pobudzenie aktywności lokalnej dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.</p> <p>W ramach projektu kontynuowane są prace Klubu Integracji Społecznej przy ul. Wrzosowej 4-8-12 w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społeczno-zawodowej uczestników projektu. Realizowane są również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praca socjalna z uczestnikami projektu prowadząca do motywowania i wspomagania uczestników do osiągnięcia możliwie pełnej aktywności zawodowej, - Zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym treningi, warsztaty, szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, - Organizacja grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, - Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla rodzin z grup wsparcia, - Praca asystenta dla osób niepełnosprawnych i opiekunów w mieszkaniu chronionym dla osób niepełnosprawnych, - Prowadzenie terapii uzależnień w noclegowni dla bezdomnych, - Praca asystenta usamodzielniania w mieszkaniach chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. 	PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020	Osiągnięte wskaźniki stan na 27.03.19: - liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym: 70 - liczba osób z niepełnosprawnościami: 19
2.	Wakacyjna Akademia poprzedni tytuł: Akademia seniora – organizowanie wspólnych warsztatów na rzecz zdobywanej umiejętności i uczenia przez całe życie	Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej PARTNER: Miejska Biblioteka Publiczna	<p>W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grecki na wakacje – warsztaty językowe. - Zumba – warsztaty taneczne. - Gimnastyka umysłu – warsztaty usprawniające prace mózgu. - Wakacyjna przygoda z lustrzanką – warsztaty fotograficzne. - Pszczoły i ich produkty – apiterapia, apitoksynoterapia, - 3XFIT - pilates, stretching, zdrowy kręgosłup, - Tabata i nie tylko – szczupła sylwetka w 4 minuty. - Technologia bez barier – warsztaty komputerowe, 	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany 03.07.2017 – 30.08.2018	Osiągnięte wskaźniki: - liczba osób biorących udział w warsztatach (w wieku 50 lat i więcej): 977.

			<ul style="list-style-type: none"> - How are You? – angielski na wakacje – warsztaty językowe, - Tworzenie biżuterii – warsztaty rękodzieła, - Podstawy malowania – warsztaty artystyczne, - Wakacje bez stresu – warsztaty samodoskonalenia, - Płaski brzuch – warsztaty sportowe, - Latino dance – warsztaty taneczne, - Joga – warsztaty relaksacyjne, - Zdrowa dieta – warsztaty estetyki żywnościowej. 			
3.	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	<p>Projekt polega na realizacji usług i instrumentów rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2015 poz. 149 z późn. zm.) na rzecz 72 bezrobotnych mieszkańców obszaru wsparcia. Realizowane są i będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe prowadzone w oparciu o przygotowany dla każdego uczestnika indywidualny Plan Działania, - szkolenia zawodowe dla 18 uczestników projektu, - staże dla 18 uczestników projektu, - prace interwencyjne dla 12 uczestników projektu. - refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 12 uczestników projektu, - środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 12 uczestników projektu. 	PO II) gospodarcza PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 01.01.15 – 30.04.16 01.01.16 – 31.12.16 01.01.17 – 31.12.18 01.01.19 – 31.12.20	<p>Osiągnięte wskaźniki: 01.01.15 – 30.04.16</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 103 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 56 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 9 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 24 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 83 <p>01.01.16 – 31.12.16</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 90 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 54 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 7 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 12 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 61 <p>01.01.17 – 31.12.18</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 246 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 124 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 17

						<ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 43 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 188
4.	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ na obszarze rewitalizowanym	Powiatowy Urząd Pracy	<p>Projekt polega na realizacji działań w zakresie aktywizacji zawodowej, poprzez wykorzystanie instrumentów i usług rynku pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - służących indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej oraz - skierowanych do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji - służących zdobyciu doświadczenia zawodowego. <p>Kierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia dla których ustalono I lub II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z grup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osoba powyżej 50 roku życia, -kobiety, -osoby niepełnosprawne, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby o niskich kwalifikacjach. <p>Przewidywana jest realizacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w oparciu o przygotowany dla każdego uczestnika Indywidualny Plan Działania. - szkoleń dla 5 uczestników projektu, - staż dla 15 uczestników projektu, - prac interwencyjnych dla 10 uczestników projektu. <p>Działania te będą dopełnieniem działań w obszarze rewitalizacji.</p>	PO II) gospodarcza PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 01.03.2019 – 28.02.2021	<p>Osiągnięte wskaźniki na dzień 21.03.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 0 - Liczba osób, długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 0 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 0 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 0 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 0
6.	Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój	Powiatowy Urząd Pracy	<p>Projekt polega na realizacji usług i instrumentów rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 poz. 149 z późn. zm.) na rzecz 213 osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych). Realizowane są i będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe prowadzone w oparciu o przygotowany dla każdego uczestnika indywidualny Plan Działania, b) staże dla 183 uczestników projektu, c) dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla 30 uczestników projektu. 	PO II) gołspodarcza PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 01.01.15 – 31.12.15 01.01.16 – 31.12.16 01.01.17 – 31.12.18 01.01.19 – 31.12.20	<p>Osiągnięte wskaźniki na dzień 23.03.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Liczba osób objętych wsparciem - 30 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie w 2015 roku: 128 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie w 2016 roku: 88 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie w latach 2017-2018: 168

						<ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie w latach 2019-2020: 74 - Liczba zrealizowanych staży (2015 - 2018): 787 - Liczba zrealizowanych dotacji (2015-2018): 124 - Liczba zrealizowanych prac interwencyjnych (2015-2018): 25 - Liczba zrealizowanych doposażeń stanowiska pracy (2018): 14
7.	Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych (JCOP) poprzedni tytuł: Centrum wolontariatu i organizacji pozarządowych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał na celu aktywizację społeczności lokalnej, pobudzenie aktywności organizacji pozarządowych i usług świadczonych przez nie, prowadzenie działalności edukacyjnej dla różnych grup wiekowych oraz pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, - dążenie do konsolidacji środowiska organizacji pozarządowych, a przede wszystkim stworzenia systemu informacji dla podmiotów ekonomii społecznej.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.01.2017 – 01.12.2018	Osiągnięte wskaźniki: - liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 3220 - liczba zorganizowanych akcji dla seniorów: 528
8.	Festiwal organizacji pozarządowych poprzedni tytuł: Forum Ekonomii Społecznej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Podczas Forum stworzono wspólną przestrzeń do wymiany doświadczeń, wzorców do naśladowania i budowania partnerstwa, wskazano przykłady dobrych praktyk w obrębie sektora ekonomii społecznej, zatrudniania w przedsiębiorstwach społecznych, nawiązania partnerstwa międzysektorowego, podjęto szeroką dyskusję o roli ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju. Zorganizowano warsztaty o tematyce: 1. Współpraca transgraniczna. 2. Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju. 3. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach Publicznych. 4. Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.01.2017 – 01.12.2018	Osiągnięte wskaźniki: - liczba organizacji/ osób biorących udział w społecznej akcji/ festiwalu: 110 osób - liczba spotkań/warsztatów: 4
9.	Festiwal Sztuk Wszelkich Zderzenia Działań Wrażliwych	Miejski Ośrodek Kultury	W ramach wydarzenia zrealizowane zostały (2017r.): - spektakle teatralne „Futerko z obłoków”, „ZABAWA”, Dla mnie bomba”, „GOULD	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 09.10.2017 – 22.10.2017 22.10.2018 - 26.10.2018	Osiągnięte wskaźniki: - liczba organizacji biorących udział w festiwalu: 10 - liczba uczestników: 1381

			<p>Wariacje”, „Tyglikowe marzenia”, „KOLEJKA ZUSOWSKA Sen Autora”, „WOMAN POWER czyli Św. Hildegarda z Binden”, „PUSTE NOCE”, „Frida”, „ZUPA RYBNA W ODESSIE”,</p> <p>-koncerty zespołów „Max Brawura”, „GRZYBY”,</p> <p>-wystawa fotograficzna klubów „SJKF Niezależni” i M6 z Rybnika oraz scenografii Teatru Mariana Bednarka i Teatru Monitoring,</p> <p>-spotkania autorskie z poetami: Maciej Melecki, Arkadiusz Kremza, Marcin Bies, Bogdan Prejs.</p> <p>-happeningi (m. in. czytanie fragmentów „Wesela” S. Wyspiańskiego) oraz warsztaty edukacyjno-artystyczne.</p> <p>W ramach wydarzenia (22-26.10.2018 r.) odbyły się: spektakle teatralne, koncerty oraz warsztaty artystyczne.</p>			
10.	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	Miejski Ośrodek Kultury	<p>Realizacja imprezy miała na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta. Integrowała ona uczestników, a także zapewniała przestrzeń na spędzenie wolnego czasu dla dzieci i rodziców.</p> <p>W ramach wydarzenia odbyły się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokaz iluzji i magii – Maciej Pol, - GWARDIA GRYFA: Spektakl „Cztery żywioły”, pokaz chorągwiarzy i tancerzy, szcudlarze, bańki mydlane, - pokaz tańca Breakdance – b-boye z Katowic, - pokaz tańca towarzyskiego – Duet ELITA z Krakowa, - balonikowe zoo, malowanie twarzy, - dyskoteka pod chmurką – DJ, - pokaz psich sztuczek, - prezentacja jastrzębskich talentów. 	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 04.06.2017	<p>Osiągnięte wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba dzieci biorących udział w prezentacji młodych talentów: 500 - liczba zorganizowanych zabaw i animacji: 9
11.	Jarmark Sztuki Wiosna Ludów	Miejski Ośrodek Kultury	<p>W ramach wydarzenia odbyły się wydarzenia artystyczne, muzyczno-teatralne, przybliżające innowacyjne nurty w dziedzinie muzyki i teatru.</p>	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 6-8.05.2016	<p>Osiągnięte wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba osób biorących udział w warsztatach: 500 - liczba artystów poniżej 25 r. życia biorących udział w wydarzeniu: 3
13.	Jastrzębskie Lato Muzyczne	Miejski Ośrodek Kultury	<p>W ramach wydarzenia odbyły się spotkania artystów, muzyków z terenu Polski i zagranicy</p>	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 09.07.2017 - 20.08.2017	<p>Osiągnięte wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba mieszkańców miasta

			<p>oraz spotkania z artystami i muzykami znanymi z ekranu.</p> <p>Zorganizowano 12 koncertów w ramach cyklu „Jastrzębskie Lato Muzyczne”. Co niedzielę w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju wystąpiły dwa zespoły reprezentujące różne gatunki muzyczne. W wybranym okresie były to zespoły: „Brygida i Robert Łukowski”, „Jolanta i Jacek Kierok”, „Ewa Kopczyńska”, „Krzysztof Koniarek”, „DAREK NOWICKI”, „ZESPÓŁ EMI BAND ORAZ ANDRZEJ MIŚ”, Orkiestra Dęta KWK „JAS-MOS”, Zespół „GRAFIT”, Orkiestra Dęta KWK „Zofiówka”, „Alexander Martinez”, Big Band KWK „Borynia”, "DUO FENIX-DWA FYNIKI". Ze względu na rozpoczęty remont i przebudowę Parku Zdrojowego w 2018 r. Koncerty nie odbyły się.</p>			<p>zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w koncertach: 4750</p> <p>- liczba koncertów odbywających się w ramach projektu: 12</p>
14.	<p>Transgraniczne zacytanie</p> <p>poprzedni tytuł: Językowa akademia kultury pogranicza – wsparcie inicjatyw kulturalno-edukacyjnych</p>	<p>Miejska Biblioteka Publiczna</p> <p>PARTNER Biblioteka Publiczna w Karwinie</p>	<p>W ramach wydarzenia odbyły się: warsztaty językowe, warsztaty kulturalno-artystyczne, wydanie polsko-czeskiego poradnika językowego zawierającego tekst i zdjęcia obiektów kulturalnych pogranicza, jarmark książkowy, spotkania autorskie.</p> <p>Projekt zakładał stworzenie lepszych warunków do obcowania ze współczesną literaturą polsko-czeską oraz do świadomego i krytycznego jej odbioru. Poprzez warsztaty zintensyfikowane zostały spotkania polskiej i czeskiej młodzieży.</p> <p>Zorganizowano spotkanie integracyjne uczestników projektu oraz koncert podczas jarmarku książkowego w Karwinie. Spotkanie połączone było ze zwiedzaniem Biblioteki oraz Pałacu we Fryszacie.</p>	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 28.08.2017 - 31.03.2018	<p>Osiągnięte wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba partnerów zaangażowanych w realizację projektu: 1 - liczba osób uczestniczących w warsztatach: 252 - liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie edukacji: 7
15.	Letnie Kino Parkowe	Miejski Ośrodek Kultury	<p>Projekt miał na celu zaspokojenie dostępu do kultury. Skierowany był do szerokiego grona odbiorców sprzyjając integracji społecznej. Poprzez zwiększenie okazji do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych uświadamia potrzebę udziału w kulturze. W ramach projektu budowano również więzi społeczne oraz stworzono platformę integracji społecznej.</p> <p>Zrealizowano cykl seansów filmowych</p>	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 03.07.2017 - 28.08.2017	<p>Osiągnięte wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba zorganizowanych pokazów filmowych: 9 - Liczba osób korzystających z oferty: 900

			wyświetlanych w poniedziałki lipca i sierpnia w Parku Zdrojowym. W repertuarze znalazły się zarówno produkcje polskie i zagraniczne. Oferta była bezpłatna dla widzów			
17.	Muzyczne Środy	Miejski Ośrodek Kultury	W ramach projektu zorganizowano 9 koncertów w ramach cyklu „Muzyczne środy”. Co środę w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju wystąpił jeden zespół reprezentujący inny gatunek muzyczny. W wybranym okresie były to zespoły: „Coria”, „Kurczak”, „Blend”, „Ziggie Piggie”, „Grooversi”, „Paweł Kamiński Quartet”, „Tabu”, „Koniec świata”. Każdy z koncertów był świetnym urozmaicheniem wakacyjnego tygodnia.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 05.07.2017 - 30.08.2017	Osiągnięte wskaźniki: - liczba koncertów odbywających się w ramach projektu: 9 - liczba osób uczestniczących w koncertach: 3450 - liczba artystów (zespołów) biorących udział w wydarzeniu: 9
18.	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój PARTNER Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika	Projekt zrealizowano w ramach partnerstwa przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS – liderem projektu, Miastem Żory i Powiatem wodzisławskim. Z oferty OWES korzystały m.in. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego oraz podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, WTZ, ZAZ, CIS, KIS itp.) i ich pracownicy. W ramach projektu prowadzono następujące działania: - animowanie, inkubowanie, - wspieranie w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw społecznych, - udzielanie informacji dotyczących: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia statutowej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej, możliwych do pozyskania środków na działalność, zmieniających się przepisów prawa itp. W ramach doradztwa utworzono 3 organizacje pozarządowe prowadząca działalność odpłatną, 2 organizacje pozarządowe w wyniku działań OWES rozpoczęły prowadzenie działalności odpłatnej. - promocja ekonomii społecznej.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.04.2016 – 31.07.2018	Osiągnięte wskaźniki: - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 50 - liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 21 - liczba nowopowstałych miejsc pracy: 7

20.	Piknik w kurorcie	Miejski Ośrodek Kultury	21.05.2017 r. - IV Piknik w kurorcie – impreza plenerowa, utrzymana w klimacie lat 20 i 30 XX w., odbyła się na terenie Parku Zdrojowego. W ramach wydarzenia wystąpiły 3 zespoły, Teatr Monitoring oraz odbył się dancing w Domu Zdrojowym. Uczestnicy mogli także wziąć udział w przejażdżce samochodami z epoki oraz skorzystać z usług pacybuta oraz fryzjera. 09.06.2017 r. - Promocja książki „Letnisko Oficerskie” odbył się w Galerii Historii Miasta w ramach IV Pikniku w kurorcie. W ramach zadania wydrukowano książkę oraz zorganizowano jej promocję.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 21.05.2017, 09.06.2017	Osiągnięte wskaźniki: - wskaźnik produktu - liczba wydarzeń kulturalnych skierowana do mieszkańców: 2
21.	Wsparcie w starcie poprzedni tytuł: Promocja samozatrudnienia na obszarze rewitalizowanym w ramach działania 7.3.2	SWIG Delta Partner PARTNER Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup. W ramach projektu odbywają się rozmowy z doradcą oraz usługi szkoleniowo-doradcze, a także udzielane są dotacje na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie pomostowe.	PO II) gospodarcza	Projekt w trakcie realizacji: 01.06.2018 – 31.07.2019	Osiągnięte wskaźniki na dzień 01.08.2018: - Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcia działalności gospodarczej w programie: 4 - Liczba osób, które wzięły udział w indywidualnych konsultacjach: 9 - Liczba wydanych zaświadczeń ukończenia kursów: 4
23.	Ćwiczenie nie zna granic poprzedni tytuł: Siłownia na wolnym powietrzu	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt polega na: 1) przygotowaniu terenu, 2) przygotowaniu projektu inwestycji, 3) realizacji projektu - montaż urządzeń. Projekt powiązany jest z projektem „Skate park”. W ramach „Siłowni na wolnym powietrzu” zrealizowane zostanie zadanie polegające na budowie i rozbudowie siłowni zewnętrznych z elementami street workout. Realizacja rzeczowa projektu „Siłownia...” jest powiązana z projektem unijnym „Ćwiczenie nie zna granic”, który nie został zgłoszony do LPR-u.	PO I) przestrzenna PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 02.07.2018 – 30.06.2019	Osiągnięte wskaźniki na dzień 03.04.2018: - liczba nowopowstałych obiektów na cele sportowe oraz rekreacyjne: 1
26.	Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Gwarków	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał za zadanie zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalno – sportowych. W ramach projektu odbyły się takie wydarzenia jak: - Sport to zdrowie,	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 16.06.2018 16.09.2018 12.10.2018 16.10.2018 08.12.2018 12-28.02.2018.	Osiągnięte wskaźniki: - liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 6

			<ul style="list-style-type: none"> - Leonowa Miła, - Sportowo dla seniorów, - Gwarkowe gole, - Przedszkolaki na sportowo, - Pierwszoklasista i sport. 			
27.	Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Zofiówka	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	<p>Projekt miał na celu zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach. W ramach wydarzenia odbyły się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konkurencje sportowe dla mieszkańców-festyn, - Festyn na sportowo, - Mikołajowe zabawy i konkursy, - Mikołaj dla wszystkich. 	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 15.06.2018 17.06.2018 28,29.11.2018 06.12.2018	Osiągnięte wskaźniki: - liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 4
28.	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla 1000-lecia	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	<p>Projekt miał na celu zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalnych. Zorganizowano konkurs w ramach zakończenia lata oraz Dzień Świętego Mikołaja.</p>	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 08.09.2018 06.12.2018	Osiągnięte wskaźniki: - liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 2
29.	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	<p>Projekt miał na celu zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalnych tj. udział w konkursie Wiosenne kwiaty w oczach dzieci, „Dziedzictwo i tradycja Górnego Śląska” - konkurs gwary Śląskiej i skeczów, impreza miejska plenerowa, udział w Dożynkach oraz Dożynkowych igraszkach . Zorganizowano Dożynkowe rywalizacje sportowe i kulturalne, zabawę karnawałową, dzień „Witaj Wiosno” Dzień Dziecka, Festyn Osiedlowy.</p>	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 26.01.2018 17.06.2018 30.06.2018 29.07.2018 26.08.2018	Osiągnięte wskaźniki: - liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 5
30.	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Przyjaźń	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	<p>Projekt miał na celu zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalnych tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ozdoba świąteczna Bożego Narodzenia, - Boisko GLIKA, - Piłka plażowa, - SKAT – Przyjaźń kontra reszta Miasta <p>Zorganizowano również Turniej Szachowy oraz XVI Turniej Mini Piłki Nożnej Przedszkolaków.</p>	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 15.06.2018 26.04.2018 22.05.2018 15.06.2018 06.10.2018 14.12.2018	Osiągnięte wskaźniki: - liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 6

31.	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Zdrój	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał na celu spędzanie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalnych tj. udział w wydarzeniach pt. Święta, tuż, tuż... W anielskim nastroju, Zwierzak duży i mały – mój przyjaciel, 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.07.2018 07.11.2018 10-12.12.2018	Osiągnięte wskaźniki: - liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 3
32	Krok w przód Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju poprzedni tytuł: Promocja samozatrudnienia na obszarze rewitalizowanym w ramach działania 7.3.2	SWIG Delta Partner PARTNER Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Zadania w projekcie oparte są na aktywizacji zawodowej poprzez wykorzystanie instrumentów i usług rynku pracy: - służących indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej; - skierowanych do osób, u których zidentyfikowano potrzebę zdobycia /uzupełnienia umiejętności i kompetencji; - służących zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących teren objęty rewitalizacją, dla których ustalono I lub II profil pomocy, będących powyżej 30 r. życia oraz należących do co najmniej jednej z grup: - os. powyżej 50 r. życia; - kobiety; - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne; -osoby o niskich kwalifikacjach. Realizowane są: - pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego prowadzonych w oparciu o przygotowany dla każdego Indywidualny Plan Działania. - szkoleń dla uczestników; - staży/przygotowanie zawodowe; - prac interdyscyplinarnych.	PO-III) społeczna PO-I) przestrzenna	Projekt w trakcie realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2020	Osiągnięte wskaźniki na dzień 03.04.2019: - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 44 - liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 10
34.	Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój PARTNER Miasto Karvina	Celem projektu było zintensyfikowanie współpracy służb z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny poprzez organizację: -kursów językowych dla przedstawicieli służb z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny, -konferencji tematycznej dla przedstawicieli miast, służb mundurowych i medycznych nt. profilaktyki antynarkotykowej i zapobiegania rozprzestrzeniania się chemicznych środków odurzających typu dopalacze	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.07.2017 – 30.10.2018	Osiągnięte wskaźniki: - liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania: 2

			<p>-konferencji tematycznej dla przedstawicieli miast, służb mundurowych i medycznych nt. prewencji kryminalnej, działań profilaktycznych kierowanych do różnych grup społecznych</p> <p>-warsztatów dla przedstawicieli miast, służb mundurowych i medycznych nt. wymiany doświadczeń.</p> <p>Wynikiem realizacji projektu jest zintensyfikowanie współpracy straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju podczas rozwiązywania problemów pojawiających się po obu stronach granicy. Dzięki realizacji projektu doszło do wymiany doświadczeń, dostosowania systemu i reguł wzajemnej współpracy oraz poprawy oferowanych przez instytucje włączone do projektu.</p> <p>W ramach projektu zrealizowano działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „System do znakowania i rejestracji rowerów”, - „Promocja”, - „Szkolenia Językowe”, - „Konferencja Karwina”, - „Konferencja Jastrzębie”, - „Warsztat”, - „Film. 			
35.	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	<p>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</p> <p>PARTNERZY</p> <p>SRiWR Olza Euroregion Śląsk Cieszyński</p> <p>Dolni oblast Vitkovice</p> <p>Moravian-Silesian Tourism</p>	<p>W ramach projektu zostanie podjęty szereg działań mający na celu stworzenie trwałego i atrakcyjnego produktu turystycznego, dzięki któremu dojdzie do rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim.</p> <p>Do głównych działań projektu należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stworzenie trwałych narzędzi transferu know-how w zakresie rewitalizacji i adaptacji postindustrialnych obiektów na cele społeczno-kulturowe z DOV na stronę polską, 2. Powstanie Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego, w ramach którego powstanie ekspozycja pokazująca historię rozwoju przemysłu wydobywczego, kultury górniczej, urbanistycznego rozwoju Górnego Śląska, który jest komplementarnym i spójnym nawiązaniem do ekspozycji w Dolnym Obszarze Vitkovice, 3. Stworzenie nowej ekspozycji w budynku nr 6 w Dolnym Obszarze Vitkovice w Ostrawie dotyczącej historii i dziedzictwa przemysłu 	PO-II) gospodarcza PO-III) społeczna PO-I) przestrzenna	Projekt w trakcie realizacji: 01.01.2017 – 31.03.2021	<p>Osiągnięte wskaźniki na dzień 26.03.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: 0 - liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: 0 - wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin: 100%

			<p>metalurgicznego nawiązującej do wspólnego kontekstu społeczno-kulturowego regionu,</p> <p>4. Stworzenie transgranicznej trasy turystycznej Węgla i Stali łączącej przez granicę wybrane obiekty postindustrialne śląskiej Trasy Zabytków Techniki (PL) i morawsko-śląskiej Technotrasy (CZ).</p> <p>5. W oparciu o transgraniczny szlak stworzenie systemu obsługi turystów z drugiej strony. DOV i Jastrzębie będą stanowiły centrum obsługi i informacji turystów (hub) dla całego transgranicznego szlaku.</p>			
36.	Żelazny szlak rowerowy	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	<p>W ramach działań projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stworzono sieć ścieżek i tras rowerowych prowadzącej po zabytkach przemysłowych i kolejnictwa z XIX wieku, -szlak będzie ma charakter dydaktyczny, został uzupełniony o tablice informacyjne dotyczące historii poszczególnych elementów dziedzictwa historycznego i kulturowego, - zostały stworzone punkty geocachingu i gry dydaktyczne -poznawczej, - działania informacyjno – promocyjne dotyczące unikatowego szlaku. W Mieście Jastrzębie - Zdrój: Zakres pierwszego etapu robót obejmował budowę nowej trasy rowerowej na odcinku 370,3m od granicy z Gminą Godów. Opracowanie obejmuje także budowę zjazdu, drogi dojazdowej wraz z organizacją ruchu oraz wykonanie miejsca rekreacyjnego i pozostałej infrastruktury. Zakres drugiego etapu robót obejmuje budowę nowej trasy rowerowej na odcinku 215,0 m od granicy z Gminą Zebrzydowice. Opracowanie obejmuje także budowę zjazdu z organizacją ruchu oraz wykonanie pozostałej infrastruktury. 	PO-I) przestrzenna PO -III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.01.2017 – 30.11.2018	Osiągnięte wskaźniki na dzień 17.09.2018: - długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych i tras rowerowych: 0,585 km
37.	V polsko-czeskie spotkania branżowe	<p>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</p> <p>PARTNERZY Miasto Hawierzów Miasto Karwina</p>	<p>Celem trzech samorządów jest tworzenie przestrzeni do prowadzenia współpracy transgranicznej swoich podmiotów oraz wspieranie ich w tych działaniach, co ma doprowadzić do aktywizacji działań transgranicznych w różnych obszarach tematycznych, których korzyść odczuwać będą mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Kolejna edycja projektu jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie - jakie</p>	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 2016	Osiągnięte wskaźniki: - liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania: 2

			<p>od dłuższego czasu zgłaszają m.in. szkoły, stowarzyszenia, kluby sportowe – w kontekście finansowego wsparcia swojej działalności w ujęciu transgranicznym.</p> <p>W ramach projektu powołano sześć tematycznych grup branżowych: sport, kultura (poszerzono o turystykę); edukacja; bezpieczeństwo publiczne; biznes; polityka młodzieżowa; samorząd lokalny, gdzie wyłoniono polskich i czeskich liderów tych grup. Nad pracą grup oraz charakterem poszczególnych spotkań czuwał każdorazowo lider grupy. Oprócz zaplanowanych w projekcie spotkań, odbywały się także dodatkowe spotkania, wynikające z potrzeb danej grupy.</p> <p>Realizacja projektu pozwoliła zweryfikować potencjał współpracy transgranicznej we wskazanych w projekcie obszarach tematycznych. Trudną w prowadzeniu projektowym okazała się być grupa Biznes, z uwagi na specyfikę tej grupy (indywidualne potrzeby biznesowe każdego uczestnika) oraz bardzo lokalne potrzeby przedstawicieli tego obszaru kierowane do poszczególnych samorządów.</p> <p>Ciekawym doświadczeniem były działania promocyjne, realizowane poza obszarem wsparcia. W Ambasadach RP w Pradze oraz RCZ w Warszawie zaprezentowano m.in. prowadzoną z powodzeniem intensywną aktywność transgraniczną pomiędzy miastami. O randze tych wydarzeń świadczy fakt, iż zechcieli w nich uczestniczyć przedstawiciele instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego oraz eksperci. Oba eventy były pozytywnie odebrane i komentowane przez zgromadzonych gości. Można sądzić, iż działanie to może mieć swoje pozytywne efekty w okresie trwałości projektu.</p>			
39.	Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	<p>W ramach projektu:</p> <p>I. Wyposażono pracownię do praktycznej nauki zawodu technik elektryk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju w:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stoły elektrotechniczne 2. Zestaw do badania silników asynchronicznych 3. Zestaw do badania maszyn 	PO-III) społeczna PO-I) przestrzenna	Projekt zrealizowany: 30.08.2018 - 29.03.2019	Osiągnięte wskaźniki: - potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 260 - liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego: 2

			<p>4. Zestaw do badania instalacji elektrycznej</p> <p>II. Wyposażono pracownię do praktycznej nauki zawodu chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu -Zdroju w:</p> <p>a) Stanowisko demonstracyjne Pompa ciepła</p> <p>b) Stanowisko wolnostojące - Badanie rekuperatora</p> <p>c) Modułowe stanowisko dydaktyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne-stanowisko wolnostojące</p> <p>d) Stanowisko montażowe sprężarkowych układów chłodniczych – stanowisko na biurko</p> <p>e) Stanowisko montażowe zestawu klimatyzacyjnego w budynku – stanowisko wolnostojące</p> <p>f) Dydaktyczna instalacja chłodnicza - stanowisko wolnostojące</p> <p>g) Zestaw do lutowania twardego</p> <p>h) Stacja napełniania czynnika R134A i R410A</p> <p>i) Stacja odzysku czynnika R134A i R410A</p> <p>j) Stół montażowy z rozdzielnicą</p> <p>k) System klimatyzacji Climatronic</p> <p>III. Wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w:</p> <p>1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe</p> <p>2. Stanowiska instalatorskie</p>			
40.	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju	<p>SWIG Delta Partner</p> <p>PARTNER</p> <p>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</p>	<p>W ramach projektu odbywają się zajęcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, - Doradztwo zawodowe dla uczniów i uczennic szkół objętych projektem, - Kursy zawodowe wraz z egzaminami <p>Projekt realizowany jest w szkołach: Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 9 oraz Zespół Szkół nr 2 .</p>	<p>PO-III) społeczna</p> <p>PO-I) przestrzenna</p>	Projekt w trakcie realizacji: 01.09.2018 - 31.08.2021	<p>Osiągnięte wskaźniki na dzień 03.04.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 23 - liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 4
41.	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz	<p>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</p>	<p>Przedmiotem projektu jest rozbudowa, termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 na Zespół Szkłono- przedszkolny. Realizacja projektu polegać będzie na wykonaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> •drogi pożarowej; •25 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych; 	<p>PO-I) przestrzenna</p>	Projekt w trakcie realizacji: 23.05.2017 – 15.12.2020	<p>Osiągnięte wskaźniki na dzień 03.04.2019: 0</p>

	<p>wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju</p> <p>poprzedni tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 i PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju</p>		<ul style="list-style-type: none"> •placu zabaw dla dzieci; •ogrodzenia; •elementów małej architektury; •wycinki oraz przesadzeniu części drzew, a także wykonanie nowych nasadzeń; •wiaty śmietnikowej; •przyłącza mediów; •chodników oraz schodów terenowych •rozbiórki istniejącego dawnego domu nauczyciela; •termomodernizacji budynku – ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachu; •przebudowy sanitariatów na poziomie parteru i piętra; •rynny i rur spustowych; •instalacji gazowych, odgromowych, fotowoltaicznych, elektryczne, oświetlenia zewnętrznego, dozorowych obiektu i otoczenia (kamery), teletechniczna; •kanalizacji sanitarnej, deszczowej; •wentylacji grawitacyjnej, wspomaganą wentylatorami mechanicznymi. <p>A nade wszystko zastąpieniu kotłowni węglowej nowoczesnym i energooszczędnym sposobem ogrzewania za pomocą kotła opalanego gazem, wspomaganym energią pochodzącą z ogniw fotowoltaicznych.</p>			
42.	<p>Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem</p>	<p>Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój</p>	<p>Projekt swoim zakresem obejmuje m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Inwentaryzację obiektu II. Roboty termoizolacyjne III. Dostosowanie obiektu do przepisów IV. Przebudowa wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych V. Remont wejść VI. Przebudowa łazienek (dostosowanie do aktualnych przepisów) VII. Przebudowa kuchni (dostosowanie do aktualnych przepisów) VIII. Roboty instalacyjne 	<p>PO-I) przestrzenna</p>	<p>Projekt w trakcie realizacji: 23.05.2017 – 15.12.2020</p>	<p>Osiągnięte wskaźniki na dzień 03.04.2019: 0</p>

	terenu					
	poprzedni tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju					
43.	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt swoim zakresem obejmuje m.in.: 1.Roboty Termomodernizacyjne: 2.Roboty instalacyjne – instalacja ogniw fotowoltaicznych 3.Roboty instalacyjne – sanitarne 4. Montaż klimatyzacji sal lekcyjnych 0,+1 oraz +2 zlokalizowanych od południowej strony budynku dydaktycznego.	PO-I) przestrzenna	Projekt w trakcie realizacji: 06.06.2017 – 15.12.2020	Osiągnięte wskaźniki na dzień 03.04.2019: - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej: 1 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 0,040 Mwe - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 30,53 Mwe/rok - Redukcja PM10: 24,79
45.	Rewitalizacja zabytkowego budynku Willi Antonina przy ulicy Zdrojowej w Jastrzębiu-Zdroju	ARCHiTEKT studio projektowe	Projekt obejmuje wzmocnienie funkcji społecznej polegającej na stworzeniu w zrewitalizowanym obiekcie centrum edukcyjno - naukowego promującego nowoczesne, ekologiczne technologie w budownictwie oraz funkcji/walorów architektonicznych budynku. Zakłada się rewitalizację budynku przez odtworzenie walorów, detali architektonicznych z okresu świetności obiektu, zastosowanie pierwotnych materiałów wykończeniowych i wprowadzenie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań stosowanych w budownictwie, np. odnawialne źródła energii.	PO I) przestrzenna PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji 01.12.2017 r. – 31.12.2020 r.	Brak osiągniętego wskaźnika na dzień 03.04.2019r.
48.	Zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne obiektu „Łazienki III” w Jastrzębiu-Zdroju	Miejski Ośrodek Kultury	Projekt zakłada dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację istniejącego obiektu Łazienki III mieszczącego się w obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdrój do pełnienia funkcji kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Budynek obecnie jest nieużytkowany. W wyniku realizacji projektu w obrębie budynku utworzone zostaną: - w piwnicy pomieszczenia: techniczne, gospodarcze i warsztatowe oraz archiwum i ciemnia.	PO I) przestrzenna PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji 21.07.2017 r. – 30.06.2020 r.	Brak osiągniętego wskaźnika na dzień 03.04.2019r.

			<p>- na parterze: pomieszczenia sali wystawienniczej mieszczącej do 50 osób, zaplecza technicznego, pomieszczeń biurowych i wc.</p> <p>- na piętrze znajdować się będą pomieszczenia biurowe, pracownie, poczekalnie z punktem informacji, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia wc.</p> <p>Projektowany obiekt zostanie dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.</p> <p>W zmodernizowanym zabytkowym obiekcie świadczona będzie nowa oferta kulturowa.</p> <p>W ramach projektu przewidziano również prace związane z zagospodarowaniem terenu.</p>			
52.	<p>Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju</p> <p>poprzedni tytuł: Czym zaskoczyć świadczeniobiorcę czyli niestandardowo w Poradniach Specjalistycznych Przychodni, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Pracowniach diagnostycznych i zabiegowych WSzZ Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju</p>	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	<p>Projekt polega na świadczeniu usług zdrowotnych ponadstandardowych, na działalności edukacyjnej i profilaktycznej z różnych dziedzin oraz na szeroko pojętym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych mających zastosowanie w teleopiece. Wśród zaplanowanych działań należy wymienić: a) Objęcie pacjentów teleopieką (Kardio Tel/ Bezpieczny senior/KTG czyli zdalna opieka nad ciężarzą) b) Ponadstandardowe wizyty patronażowe realizowane przez położne POZ c) Aktywizacja poprzez stworzenie możliwości skorzystania z zaplecza Szpitala - Sala ćwiczeń z dowozem pacjentów na w/w ćwiczenia, d) Działalność edukacyjną i profilaktyczną z różnych dziedzin, między innymi profilaktyka chorób przewlekłych, wykorzystanie działalności poradni dietetycznej, nowoczesne materiały edukacyjne a w nich treści dotyczące np. zapobieganie odleżynom, właściwego odżywiania. e) uruchomienie nowatorskich metod leczenia ran przewlekłych w Poradni Chirurgii Ogólnej, na bazie współpracy ze Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, f) objęcie Mieszkańców koordynowaną opieką kardiologiczną, rehabilitacyjną i ortopedyczną, g) uruchomienie jedynej w Mieście Poradni Neonatologicznej.</p>	PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji 01.01.2014 r. – 30.06.2020 r.	<p>Osiągnięte wskaźniki na dzień 16.04.2019 :</p> <p>- liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projekt: 1</p> <p>- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych: 1</p>

53.	<p>Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu</p> <p>poprzedni tytuł: Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Oddział Neurochirurgii, Zakład Diagnostyki Obrazowej – usługi ponadstandardowe jako wzmocnienie świadczeń realizowanych w ramach umowy z NFZ</p>	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	<p>Szpital planuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykorzystać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki w diagnostyce i leczeniu wskazanej kategorii schorzeń. 2. Utworzyć, w ramach niestandardowej aktywizacji, sali ćwiczeń z dowozem pacjentów na w/w ćwiczenia, w której pod czujnym okiem trenera następowałaby stopniowy wzrost formy, samodzielności oraz stopniowy powrót do społeczeństwa i być może pracy zawodowej. 3. Działalność edukacyjna i profilaktyczna z różnych dziedzin, między innymi profilaktyka chorób przewlekłych, wykorzystanie działalności poradni dietetycznej, nowoczesne materiały edukacyjne a w nich treści dotyczące np. zapobieganie odleżynom, właściwego odżywiania. 4. Działalność patronażowa realizowana przez członków Zespołu ds. Rehabilitacji społecznej. Aktualnie rozstrzygnięto projekt na roboty budowlane 	PO III) społeczna	<p>Projekt w trakcie realizacji 29.01.2018 r. – 31.10.2019 r.</p>	<p>Osiągnięte wskaźniki: - liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu: 1.</p>
-----	--	---	--	-------------------	--	---

54.	<p>Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju</p> <p>poprzedni tytuł: Dotrzymaj im kroku czyli Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla Matki i Dziecka dla Rodziny</p>	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	W wyniku realizacji projektu zostanie rozszerzona baza gabinetów zabiegowych. Celem projektu jest stworzenie warunków lokalowo-technicznych do uruchomienia nowych, komfortowych dla matek i dzieci oraz pozostałych pacjentów rozwiązań diagnostycznych. Zakres projektu został zdefiniowany w oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczne.	PO III) społeczna	<p>Projekt w trakcie realizacji 01.08.2018 r – 31.12.2020</p>	<p>Osiągnięte wskaźniki: - Wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia satysfakcji z macierzyństwa, w tym z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem: 200.</p>
-----	--	---	---	-------------------	---	---

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR.

Tabela 2 Stan realizacji pozostałych projektów z listy podstawowej

Lp.*	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Stopień realizacji
5.	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w ramach działania 7.1.2	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt nie zostanie zrealizowany – brak środków finansowych
12.	Jastrzębie – Zdrój Dom Solidarności – studium wykonalności wraz z elementami koncepcji architektonicznej	Miasto Jastrzębie-Zdrój	Projekt nie zostanie zrealizowany - brak zgody na zwiększenie planu wydatków majątkowych na pokrycie kosztów projektu budowlanego. Projekt na etapie poszukiwania źródeł finansowania
16.	Rewitalizacja budynku na potrzeby utworzenia miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych	Miasto Jastrzębie-Zdrój	Projekt nie zostanie zrealizowany Zmiana zakresu projektu - rewitalizacja budynku na potrzeby którego złożono fiszkę projektową będzie zrealizowana w ramach innego projektu, który został złożony i otrzymał dofinansowanie (Zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne obiektu „Łazienki III” w Jastrzębiu-Zdroju), natomiast rewitalizacja społeczna jest realizowana poprzez działania miękkie w ramach projektu „Krok w przód” Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju
19.	Stworzenie miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych	Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizację projektu przesunięto na lata 2021 - 2022
22.	Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu	Miejski Zarząd Nieruchomości	Realizację projektu przesunięto. Projekt planowany do realizacji ze środków własnych lub BGK.
24.	Skate-Park	Miasto Jastrzębie-Zdrój Zarząd Os. Zofiówka	Projekt planowany do realizacji. Projekt jest częścią składową realizowanego projektu „Ćwiczenie nie zna granic”, w ramach którego na Os. Zofiówka powstanie siłownia na wolnym powietrzu z elementami do workout
25.	Słowo i obraz w przestrzeni międzypokoleniowej – zajęcia w obszarze kultury i sztuki angażujące różne pokolenia	Miejska Biblioteka Publiczna	Projekt nie zostanie zrealizowany – brak środków finansowych

Lp.*	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Stopień realizacji
33.	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju	Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizację projektu przesunięto na lata 2021 - 2022 z uwagi na powiązanie projektu miękkiego z projektem inwestycyjnym
38.	Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego	Miasto Jastrzębie-Zdrój	Projekt nie otrzymał dofinansowania, nie zostanie zrealizowany – projekt na etapie poszukiwania źródeł finansowania
44.	Rewitalizacja terenów zbiorników przy ulicy Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju	Miasto Jastrzębie-Zdrój	Projekt nie otrzymał dofinansowania, nie zostanie zrealizowany – projekt na etapie poszukiwania źródeł finansowania
46.	Nowe funkcje produkcyjne i zawodowe w CLP-B	Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.	Projekt nie zostanie zrealizowany - rezygnacja wnioskodawcy z realizacji
47.	Poprawa dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie miejsc w Zakładach Opieki Długoterminowej, w którym uzyskają krótkookresową całodobową opiekę osoby niesamodzielne w zastępstwie opiekunów fizycznych	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt planowany do realizacji po uzyskaniu środków finansowych
49.	Ratując jedno życie ratuję świat. Miejsce działań ratunkowych – Izba Przyjęć WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt nie zostanie zrealizowany – brak środków finansowych
50.	Usługi społeczne i zdrowotne dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej wraz ze wsparciem dla ich rodzin	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt nie zostanie zrealizowany - rezygnacja wnioskodawcy z realizacji


Lp.*	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Stopień realizacji
51.	Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym – daj sobie szansę	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt nie zostanie zrealizowany – brak środków finansowych
55.	Termomodernizacja wraz z zabudową instalacji solarnej budynku przychodni zdrowia Orthogon w Jastrzębiu-Zdroju	ORTHOGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Projekt planowany do realizacji po uzyskaniu środków finansowych
56.	Podniesienie efektywności energetycznej obiektu Szpitala przy ul. Krasickiego 21	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt planowany do realizacji po uzyskaniu środków finansowych
57.	Rewitalizacja wraz z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacyjnego dla osób przewlekle chorych i starszych	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt nie zostanie zrealizowany – brak środków finansowych
58.	„Aktywizacja i integracja społeczna” Nowe szanse integracji i rozwoju społeczno-zawodowego	JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt planowany do realizacji po uzyskaniu środków finansowych
59.	Nowe szanse prowadzenia działalności gospodarczej	JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt nie zostanie zrealizowany – brak środków finansowych
60.	Nowe szanse rozwoju w JSWSiG	JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt planowany do realizacji po uzyskaniu środków finansowych

*Zgodnie z tabelą 36. „Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do roku 2020”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR.

Na poniższym wykresie zaprezentowany został stan realizacji projektów objętych Programem Rewitalizacji.

Wykres 1 Stan realizacji projektów podstawowych

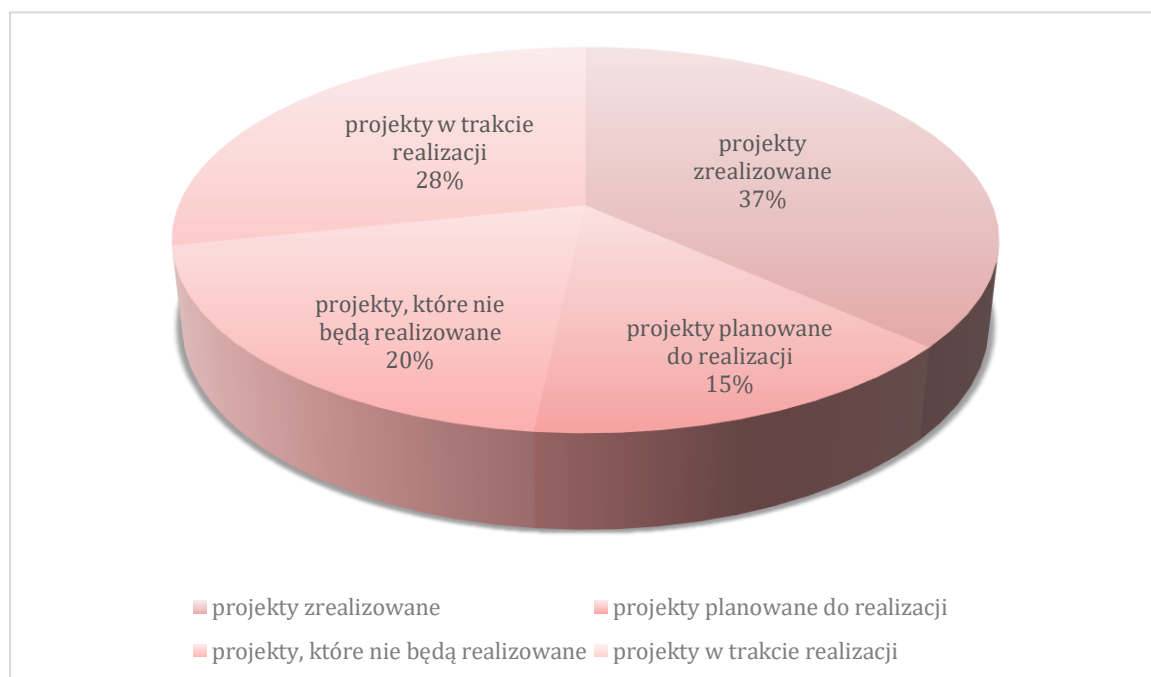

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Zgodnie z powyższą wizualizacją:

- 22 projekty zostały zrealizowane i zakończone,
- 17 jest w trakcie realizacji,
- 9 jest planowanych do zrealizowania w przyszłości,
- w stosunku do 12 projektów podjęto decyzję o rezygnacji.

W kolejnej tabeli zawarto ocenę stopnia realizacji projektów rezerwowych.

Tabela 3 Stopień realizacji projektów z listy rezerwowej


Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Stopień realizacji
Remont boiska szkolnego i szkoły na os. 1000-lecia Szeroka oraz wybudowanie placu zabaw przy małej szkole dla małych dzieci	Miasto Jastrzębie-Zdrój	Projekt planowany do realizacji.
Zagospodarowanie terenu na os. Zofiówka	Miasto Jastrzębie-Zdrój	Projekt zrealizowany. Projekt powiązany jest z projektem „Ćwiczenie nie zna granic”, ponieważ w ramach siłowni na wolnym powietrzu zrealizowane zostało zadanie polegające na budowie i rozbudowie siłowni zewnętrznych urządzeń street workout, natomiast w ramach „Zagospodarowania” na osiedlu Zofiówka utworzono 57 nowych miejsc parkingowych oraz przebudowano kolidujące uzbrojenie podziemne i naziemne.

Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Stopień realizacji
Rewitalizacja byłego uzdrowiska Jastrzębie-Zdrój w kierunku utworzenia ośrodka opieki nad ludźmi w podeszłym wieku	Miasto Jastrzębie-Zdrój	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków finansowych.
Poprawa komunikacji z sąsiednią Karwiną	Miasto Jastrzębie-Zdrój	Projekt zrealizowany. W ramach realizowanego przez miasto projektu „V polsko-czeskie spotkania branżowe”, na wniosek miasta Jastrzębie-Zdrój i miasta Karwina wystąpiono o zniesienie ograniczenia tonażowego na przejeździe granicznym Markłowice-Pertovice na potrzeby organizacji przejazdów np. autokarów szkolnych-

Źródło Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Poniżej zaprezentowane zostały wnioski z powyższej tabeli w formie graficznej.

Wykres 2 Stan realizacji projektów rezerwowych

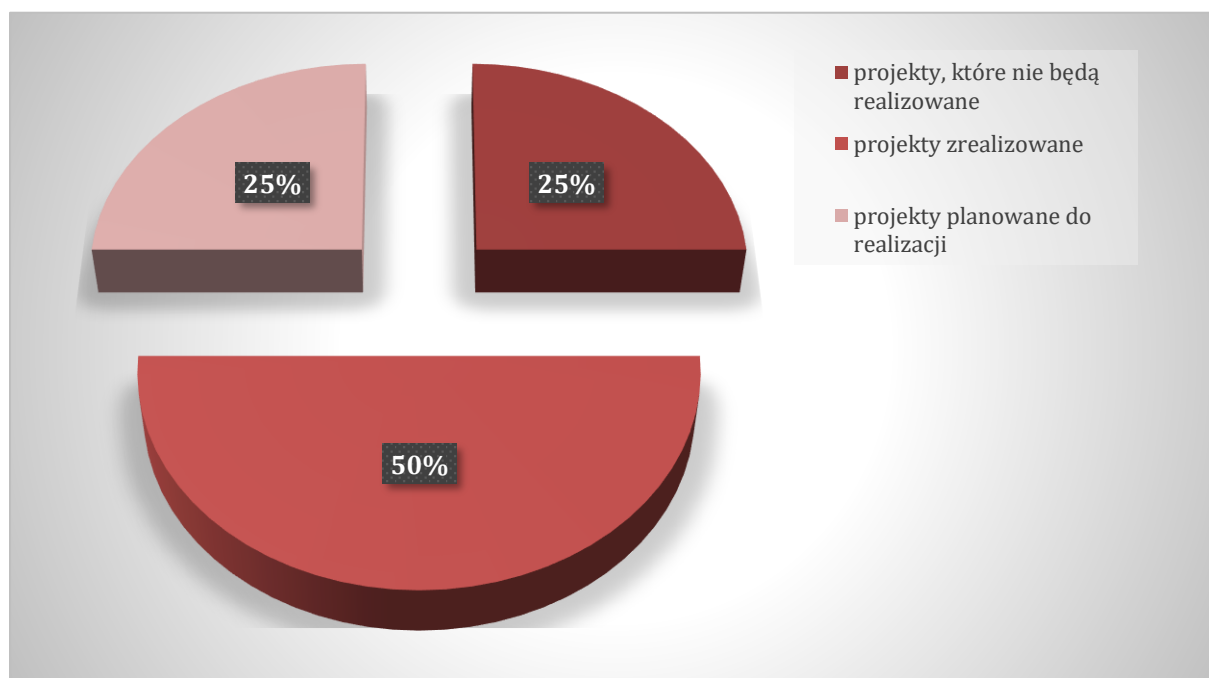

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR.

4. ANALIZA FINANSOWYCH ZAŁOŻEŃ Z REALIZACJI PROJEKTÓW

W tabelach poniżej zestawiono wartościowo projekty włączone do Programu Rewitalizacji oraz wskazano źródła, z których zaplanowano ich realizację.

Projekty, których realizacja jeszcze się nie rozpoczęła (oraz te, które nie będą realizowane) nie zostały ujęte w niniejszej tabeli. Natomiast (w niektórych przypadkach) wartość poszczególnych projektów będących obecnie w trakcie realizacji została wskazana na podstawie kwot wskazanych w LPR. W zakresie pozostałych (zrealizowanych już) projektów szczegółowe informacje umieszczono w poniższej tabeli:

Tabela 4 Tabela finansowania Programu Rewitalizacji

L p.	Nazwa projektu	Okres realizacji	w zł					
			Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
1	O krok do przodu Wsparcie dla osób z terenów rewitalizowanych	Projekt w trakcie realizacji 01.01.2018 - 31.12.2020	732 285,99 ¹	614 713,40	0,00	117 572,59	0,00	2 049 826,91
2	Wakacyjna Akademia poprzedni tytuł: Akademia seniora – organizowanie wspólnych warsztatów na rzecz zdobywanej umiejętności i uczenia przez całe życie	Projekt zrealizowany 03.07.2017 - 30.08.2018	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Projekt w trakcie realizacji: 2015 - 2020	0,00 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00
4	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ na obszarze rewitalizowanym	Projekt w trakcie realizacji: 01.03.2019 - 28.02.2021	0,00 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	958 446,45
5	Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój	Projekt w trakcie realizacji: 2015 - 2020	0,00 ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 909,07
6	Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych (JCOP) poprzedni tytuł:	Projekt zrealizowany 01.01.2017 - 01.12.2018	126 451,76	0,00	121 451,76	5 000,00	0,00	126 451,76

¹ Wartość na dzień 27.03.2019 r. projekt w trakcie realizacji.

² Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji projektu.

³ Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji projektu.

⁴ Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji projektu.

L p.	Nazwa projektu	Okres realizacji	w zł					
			Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
	Centrum wolontariatu i organizacji pozarządowych							
7	Festiwal organizacji pozarządowych – Forum Ekonomii Społecznej	Projekt zrealizowany 01.01.2017 - 01.12.2018	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
8	Festiwal Sztuk Wszelkich Zderzenia Działań Wrażliwych	Projekt zrealizowany 09.10.2017 - 22.10.2017	57 850,61	42 000,00	0,00	15 850,41	0,00	81 250,61
		22.10.2018 - 26.10.2018	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	
9	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	Projekt zrealizowany 04.06.2017	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
10	Jarmark Sztuki Wiosna Ludów	Projekt zrealizowany 6-8.05.2016	11 987,60	0,00	0,00	0,00	11 987,60	11 987,60
11	Jastrzębskie Lato Muzyczne	Projekt zrealizowany 09.07.2017 - 20.08.2017	50 952,35	0,00	0,00	50 952,35	0,00	50 952,35

L p.	Nazwa projektu	Okres realizacji	w zł					
			Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
12	Transgraniczne zaczytanie poprzedni tytuł: Językowa akademia kultury pogranicza – wsparcie inicjatyw kulturalno-edukacyjnych	Projekt zrealizowany 28.08.2017 - 31.08.2018	75 931,55	64 541,82	7 593,15	3 796,58	0,00	75 931,55
13	Letnie Kino Parkowe	Projekt zrealizowany 03.07.2017 - 28.08.2017	3075,00	0,00	0,00	3075,00	0,00	3075,00
14	Muzyczne Środy	Projekt zrealizowany 05.07.2017 - 30.08.2017	29 983,98	0,00	0,00	29 983,98	0,00	29 983,98
15	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Projekt zrealizowany 01.04.2016 - 31.07.2018	132 950,00	0,00	0,00	132 950,00	0,00	132 950,00
16	Piknik w kurorcie	Projekt zrealizowany 21.05.2017 - 09.06.2017	50 793,93	0,00	0,00	50 793,93	0,00	50 793,93
17	Krok w przód Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt w trakcie realizacji 01.07.2018 - 30.06.2020	69 016,00 ⁵	69 016,00	0,00	0,00	0,00	1 738 474,80
18	Wsparcie w starcie poprzedni tytuł: Promocja samozatrudnienia na obszarze rewitalizowanym w ramach działania 7.3.2	Projekt w trakcie realizacji: 01.06.2018 - 31.07.2019	220 716,56 ⁶	220 716,56	0,00	0,00	0,00	275 895,70

⁵ Wartość na dzień 03.04.2019 r.

⁶ Wartość na dzień 07.05.2019 r.

L p.	Nazwa projektu	Okres realizacji	w zł					
			Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
19	Ćwiczenie nie zna granic poprzedni tytuł: Siłownia na wolnym powietrzu	Projekt w trakcie realizacji 02.07.2018 - 0.06.2019	170 000,00	0,00	0,00	170 000,000	0,00	170 000,00
20	Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Gwarków	Projekt zrealizowany 16.06.2018, 16.09.2018, 12.10.2018, 16.10.2018, 08.12.2018 12-28.02.2018	6 997,56	0,00	0,00	6 997,56	0,00	6 997,56
21	Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Zofiówka	Projekt zrealizowany 15.06.2018, 17.06.2018, 28-29.11.2018, 06.12.2018	6 967,00	0,00	0,00	6 967,00	0,00	6 967,00
22	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla 1000-lecia	Projekt zrealizowany 08.09.2018 06.12.2018	6 998,74	0,00	0,00	6 998,74	0,00	6 998,74
23	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Przyjaźń	Projekt zrealizowany 15.06.2018, 26.04.2018, 22.05.2018, 15.06.2018, 06.10.2018, 14.12.2018	6 982,83	0,00	0,00	6 982,83	0,00	6 982,83
24	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Zdrój	Projekt zrealizowany 01.07.2018, 07.11.2018, 10-12.12.2018	2 299,11	0,00	0,00	2 299,11	0,00	2 299,11

L p.	Nazwa projektu	Okres realizacji	w zł					
			Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
25	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt w trakcie realizacji: 01.09.2018 - 31.08.2021	47 556,51 ⁷	0,00	0,00	22 843,99	24 712,52	1 918 953,60
26	Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju	Projekt zrealizowany 21.07.2017 –30.10.2018	158 268,04	134 527,83	0,00	23 740,21	0,00	158 268,04
27	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	Projekt w trakcie realizacji 01.01.2017 - 31.03.2021	0,00 ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249 443,00
28	Żelazny szlak rowerowy	Projekt zrealizowany 01.01.2017 - 30.11.2021	1 234,781,74	590 598,20	0,00	644 183,54 zł	0,00	1 234 781,74
29	V polsko-czeskie spotkania branżowe	Projekt zrealizowany 2016	85 178,27	75 546,14	3 210,71	6 421,42	0,00	85 178,27
31	Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt zrealizowany 30.08.2018 - 29.09.2019	935 700,00	795 345,00	0,00	140 355,00	0,0	935 700,00
32	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju poprzedni tytuł:	Projekt w trakcie realizacji 23.05.2017 - 15.12.2020	13 933,00 ⁹	0,00	0,00	13 933,00	0,00	11 975 263,00

⁷ Wartość na dzień 03.04.2019 r.

⁸ Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji projektu.

⁹ Wartość na dzień 29.03.2019 r.

L p.	Nazwa projektu	Okres realizacji	w zł					
			Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 i PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju							
33	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu poprzedni tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt w trakcie realizacji 23.05.2017 - 15.12.2020	13 933,00 ¹⁰	0,00	0,00	13 933,00	0,00	3 875 356,00
34	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt w trakcie realizacji 06.06.2017 - 15.12.2020	393 986,76 ¹¹	0,00	0,00	393 986,76	0,00	4 187 746,54
35	Rewitalizacja zabytkowego budynku Willi Antonina przy ulicy Zdrojowej w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt w trakcie realizacji 01.12.2017 - 31.12.2020	100 000,00 ¹²	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 005 000,00
36	Zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne obiektu „Łazienki III” w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt w trakcie realizacji 21.07.2017 - 30.06.2020	9 244,00 ¹³	0,00	0,00	9 244,00	0,00	7 556 118,92

¹⁰ Wartość na dzień 29.03.2019 r.

¹¹ Wartość na dzień 29.03.2019 r.

¹² Wartość na dzień 03.04.2019 r.

¹³ Wartość na dzień 29.03.2019 r.

L p.	Nazwa projektu	Okres realizacji	w zł					Koszt całego projektu
			Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	
37	<p>Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju</p> <p>poprzedni tytuł: Czym zaskoczyć świadczeniobiorcę czyli niestandardowo w Poradniach Specjalistycznych Przychodni, Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Pracowniach diagnostycznych i zabiegowych WSzZ Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju</p>	Projekt w trakcie realizacji 01.01.2014 - 30.06.2020	200 000,00 ¹⁴	140 000,00	0,00	0,00	60 000,00	10 002 077,61
38	<p>Przebudowa, wyposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu</p> <p>poprzedni tytuł: Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Oddział Neurochirurgii, Zakład Diagnostyki Obrazowej – usługi ponadstandardowe jako wzmocnienie świadczeń</p>	Projekt w trakcie realizacji 29.01.2014 - 30.06.2020	80 000,00 ¹⁵	32 000,00	0,00	0,00	48 000,00	3 424 905,01

¹⁴ Wartość na dzień 16.04.2019 r.

¹⁵ Wartość na dzień 16.04.2019 r.

L p.	Nazwa projektu	Okres realizacji	w zł					
			Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
	realizowanych w ramach umowy z NFZ.							
39	<p>Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju</p> <p>Poprzedni tytuł: Dotrzymaj im kroku czyli Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla Matki i Dziecka dla Rodziny</p>	Projekt w trakcie realizacji 01.08.2018 - 31.12.2020	70 000,00 ¹⁶	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	149 865,50
<i>Łączna wartość środków finansowych zaplanowanych w LPR na realizację wszystkich projektów</i>			-	70 581 240,00	1 360 000,00	72 305 750,00	1 845 250,00	-
<i>Łączna wartość środków finansowych poniesionych na realizację projektów na dzień sporządzenia raportu z monitoringu LPR. Ostateczna refundacja z funduszy strukturalnych zostanie ustalona po zakończeniu projektu (rozliczenie końcowe)</i>			5 159 221,89	4 202 772,00	132 255,62	1 793 311,00	283 700,12	71 187 832,18

¹⁶ Wartość na dzień 16.04.2019 r.

L p.	Nazwa projektu	Okres realizacji	w zł					
			Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
<i>Wskaźnik finansowej realizacji projektów [%]</i>			-	5,95%	9,72%	2,48%	15,37%	7,25%*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR.

*Wskaźnik obliczony został w następujący sposób: $(5\ 159\ 221,89 * 100\%) / 71\ 187\ 832,18 = 7,25\%$

Ze względu na fakt, że niniejszy raport przygotowywany jest po raz pierwszy (PR został przyjęty 23 lutego 2017), część projektów nie zostało jeszcze rozpoczętych, bądź są obecnie w trakcie realizacji. W związku z powyższym – wraz z postępem w realizacji poszczególnych zadań – wskaźniki procentowe będą wzrastać.

Zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji *Tabela 38 Tabela finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji* orientacyjny koszt wszystkich zgłoszonych w latach 2016 – 2018 projektów planowany był na około 163 336 960,00 zł z czego na wkład własny (podmiotów realizujących projekt) składać się miała kwota około 1 845 250,00 zł.

Pozostałe źródła finansowania pochodzić miały m.in.:

- z funduszy unijnych w kwocie 70 581 240,00 zł.,
- środków budżetu państwa w kwocie 1 360 000,00 zł.

Na etapie tworzenia LPR wielu wnioskodawców zgłosiło potencjalne projekty do realizacji z udziałem funduszy unijnych znając tylko wstępne wytyczne w tym zakresie. Niejednokrotnie po ogłoszeniu dedykowanych konkursów w wielu przypadkach okazało się, że regulamin konkursu nie dopuszcza możliwości aplikowania o środki unijne, dlatego też wnioskodawcy niektórych zgłoszonych projektów odstąpili od ich realizacji z uwagi na brak możliwości uzyskania potencjalnego dofinansowania. Projekty realnie zaplanowane do realizacji zostały w dużej części zrealizowane, bądź znajdują się w fazie realizacji.

W niektórych przypadkach część projektów nie uzyskała dofinansowania w ramach dostępnych źródeł, dlatego też niektórzy wnioskodawcy z braku środków własnych zrezygnowali z realizacji zadania lub też będą realizować zadanie w późniejszym terminie w ramach dostępnych środków własnych.

Analiza stopnia realizacji LPR wykazała, iż w badanym okresie zrealizowano w pełni 22 projekty z listy projektów podstawowych (*tabela nr 36 LPR*) na łączną kwotę 3 038 550,07 zł.

Natomiast 17 projektów jest w trakcie realizacji, na które do chwili obecnej przeznaczono 2 120 671,82 zł.

Należy podkreślić, iż z w związku z brakiem środków finansowych w zakładanym pierwotnie terminie nie zrealizowano dotychczas 9 projektów, których celem była m.in. eliminacja problemów wskazanych w sferze społecznej i gospodarczej na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, są to projekty:

1. „*Stworzenie miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych*” - planowany termin realizacji 2021 – 2022.
2. „*Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju*” - planowany termin realizacji 2021 – 2022.
3. „*Poprawa dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie miejsc w Zakładach Opieki Długoterminowej, w którym uzyskają krótkookresową całodobową opiekę osoby niesamodzielne w zastępstwie opiekunów fizycznych*” - projekt planowany do realizacji po uzyskaniu środków finansowych.
4. „*Termomodernizacja wraz z zabudową instalacji solarnej budynku przychodni zdrowia Orthogon w Jastrzębiu-Zdroju*” - projekt planowany do realizacji po uzyskaniu środków finansowych.
5. „*Podniesienie efektywności energetycznej obiektu Szpitala przy ul. Krasickiego 21*” - projekt planowany do realizacji po uzyskaniu środków finansowych.
6. „*Aktywizacja i integracja społeczna. Nowe szanse integracji i rozwoju społeczno-zawodowego*” - projekt planowany do realizacji po uzyskaniu środków finansowych.
7. „*Nowe szanse rozwoju w JSWSiG*” - projekt planowany do realizacji po uzyskaniu środków finansowych.
8. „*Skate-Park*” - Projekt planowany do realizacji. Projekt jest częścią składową realizowanego projektu „*Ćwiczenie nie zna granic*”, w ramach którego na Os. Zofiówka powstanie siłownia na wolnym powietrzu oraz urządzenia do workout.
9. „*Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu*” - Realizację projektu przesunięto. Projekt planowany do realizacji ze środków własnych lub BGK.

5. ANALIZA OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW MONITORINGOWYCH

PO-I) Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez kompleksowe działania o charakterze infrastrukturalno-architektonicznym [sfera przestrzenna].		
Kierunek działania	Osiągnięte wskaźniki realizacji celów Programu	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
<p>K1 - Odnowa urbanistyczna obszarów miejskich i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej,</p> <p>K2 -Rozbudowa i optymalizacja układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej miasta,</p> <p>K3 - Rewitalizacja substancji mieszkaniowej,</p> <p>K4 - Tworzenie rozwiązań infrastrukturalnych wspierających rozwój gospodarczy,</p> <p>K5 - Rewitalizacja terenów i obiektów przemysłowych,</p> <p>K6 - Przebudowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej i społecznej,</p> <p>K7 - Poprawa jakości i konkurencyjności infrastruktury ochrony zdrowia,</p> <p>K8 - Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta,</p> <p>K9 - Rozwiązania systemowo-infrastrukturalne dla poprawy jakości środowiska naturalnego.</p>	<p>Żelazny szlak rowerowy - długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych i tras rowerowych: 0,585 km</p> <p>Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju - liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego: 2</p> <p>Ćwiczenie nie zna granic (siłownia na wolnym powietrzu) - liczba nowopowstałych obiektów na cele sportowe oraz rekreacyjne: 1</p> <p>Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju - Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego: 4</p> <p>Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju -liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej: 1, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 0,040 Mwe, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 30,53 Mwhe/rok, Redukcja PM10: 24,79.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - Liczba elementów infrastruktury udostępniającej /zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego - Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - Liczba nowopowstałych obiektów na cele sportowe oraz rekreacyjne - Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych i tras rowerowych - Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego - Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych, - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją, - Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury
PO-II) Aktywizacja ekonomiczna obszaru wsparcia dzięki podniesieniu konkurencyjności i trwałe reorganizacji struktury gospodarczej [sfera gospodarcza].		
Kierunek działania	Osiągnięte wskaźniki realizacji celów Programu	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
<p>K10 - Aktywizacja gospodarcza mieszkańców i ułatwianie przekwalifikowania zawodowego,</p> <p>K11 - Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności oraz tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP),</p> <p>K12 - Kompleksowa promocja miasta skierowana na przyciągnięcie inwestorów,</p> <p>K13 - Podnoszenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta,</p> <p>K14 - Kształtowanie systemu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.</p>	<p>Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</p> <p>01.01.15 – 30.04.16</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 103 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 56 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie : 9 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Liczba zrealizowanych staży - Liczba zrealizowanych dotacji - Liczba zrealizowanych prac interwencyjnych - Liczba zrealizowanych doposażeń stanowiska pracy - Liczba zaplanowanych do realizacji staży - Liczba zaplanowanych do realizacji dotacji - Liczba zaplanowanych do realizacji doposażeń

	<ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 83 01.01.16 – 31.12.16 Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 90 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 54 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 7 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 12 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 61 01.01.17 – 31.12.18 - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 246 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 124 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie : 17 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 43 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 188 Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój - Liczba osób objętych wsparciem - 30 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie w 2015 roku: 128 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie w 2016 roku: 88 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie w latach 2017-2018: 168 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie w latach 2019-2020: 74 - Liczba zrealizowanych staży (2015 - 2018): 787 - Liczba zrealizowanych dotacji (2015-2018): 124 - Liczba zrealizowanych prac interwencyjnych (2015-2018): 25 - Liczba zrealizowanych doposażeń stanowiska pracy (2018): 14 Wsparcie w starcie (promocja samozatrudnienia na obszarze rewitalizowanym w ramach działania 7.3.2) – Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcia działalności gospodarczej w programie: 4 - Liczba osób, które wzięły udział w indywidualnych konsultacjach: 9 - Liczba wydanych zaświadczeń ukończenia kursów: 4 	
--	---	--

PO-III) Wyrównywanie szans życiowych i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru wsparcia poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego [sfera społeczna].		
Kierunek działania	Osiągnięte wskaźniki realizacji celów Programu	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
<p>K15 - Aktywna polityka społeczna w celu neutralizacji zjawisk wykluczenia społecznego, marginalizacji i bierności,</p> <p>K16 - Walka z bezrobociem i biernością zawodową poprzez działania skierowane na podnoszenie kwalifikacji, aktywizację zawodową i rozwój osobowościowy mieszkańców,</p> <p>K17 - Poprawa bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii i dezintegracji społecznej,</p> <p>K18 - Przeciwdziałanie migracji zewnętrznej mieszkańców poprzez wzmacnianie identyfikacji mieszkańców z miastem oraz kształtowanie tożsamości lokalnej,</p> <p>K19 - Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców oraz propagowanie aktywnego stylu życia,</p> <p>K20- Wsparcie i podniesienie aktywności organizacji pozarządowych,</p> <p>K21 - Wykorzystanie i rozwój istniejącego potencjału edukacyjnego,</p> <p>K22 - Kształtowanie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy,</p> <p>K23- Aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych.</p>	<p>Wakacyjna Akademia - liczba osób biorących udział w warsztatach (w wieku 50 lat i więcej): 977.</p> <p>O krok do przodu - Wsparcie dla osób z terenów rewitalizowanych - liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym: 70 liczba osób z niepełnosprawnościami: 19</p> <p>Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych (JCOP) - liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 3220, liczba zorganizowanych akcji dla seniorów: 528</p> <p>Festiwal organizacji pozarządowych - liczba organizacji/ osób biorących udział w społecznej akcji/ festiwalu: 110 osób, liczba spotkań/warsztatów: 4</p> <p>Festiwal Sztuk Wszelkich Zderzenia Działań Wrażliwych - liczba organizacji biorących udział w festiwalu: 10, liczba uczestników: 1381</p> <p>Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - liczba dzieci biorących udział w prezentacji młodych talentów: 500, liczba zorganizowanych zabaw i animacji: 9</p> <p>Jarmark Sztuki Wiosna Ludów - liczba osób biorących udział w warsztatach: 500, liczba artystów poniżej 25 r. życia biorących udział w wydarzeniu: 3</p> <p>Jastrzębskie Lato Muzyczne - liczba mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w koncertach: 4750, liczba koncertów odbywających się w ramach projektu: 12</p> <p>Transgraniczne zacytanie - liczba partnerów zaangażowanych w realizację projektu: 1, liczba osób uczestniczących w warsztatach: 252, liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób długotrwale bezrobotnych zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób z niepełnosprawnościami zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania - Liczba dzieci biorących udział w prezentacji młodych talentów - Liczba mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym - Liczba zorganizowanych pokazów filmowych - Liczba wydarzeń kulturalnych

	<p>edukacji: 7</p> <p>Letnie Kino Parkowe - liczba zorganizowanych pokazów filmowych: 9</p> <p>Muzyczne Środy - liczba koncertów odbywających się w ramach projektu: 9, liczba osób uczestniczących w koncertach: 3450, liczba artystów (zespołów) biorących udział w wydarzeniu: 9</p> <p>Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 50, liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 21, liczba nowopowstałych miejsc pracy: 7</p> <p>Piknik w kurorcie - wskaźnik produktu - liczba wydarzeń kulturalnych skierowana do mieszkańców: 2</p> <p>Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Gwarków, Przyjaźń, Zdrój, Zofiówka, 1000-lecia, Górne i Dolne - liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 26</p> <p>Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju - liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania: 2</p> <p>Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin: 100%</p> <p>V polsko-czeskie spotkania branżowe - liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania: 2</p> <p>Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projekt: 1, liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych: 1</p> <p>Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz</p>	
--	--	--

	<p>Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu - liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu: 1.</p> <p>Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia satysfakcji z macierzyństwa, w tym z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem: 200.</p>	
--	--	--

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdroju. Dane zostały opracowane na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR.

6. PODSUMOWANIE

Kluczowe założenia w zakresie efektów wdrażania niniejszego Programu, sformułowane w oparciu o materiały zebrane w części diagnozującej, przekładają się na docelową wizję obszaru rewitalizowanego, którą można sformułować w następujący sposób:

Jastrzębie-Zdrój w roku 2020 to miasto:

- spójne społecznie i gospodarczo,
- aktywnie i skutecznie przeciwdziałające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
- oferujące mieszkańcom stały dostęp do trwałych i konkurencyjnych miejsc pracy,
- dbające o zachowanie tożsamości lokalnej i kształtowanie dobrych relacji między mieszkańcami,
- umożliwiające efektywną współpracę różnych środowisk,
- gwarantujące swoim mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa,
- zapewniające wysoką estetykę i funkcjonalność przestrzeni miejskiej.

Powyżej wskazane punkty składają się na docelową wizję obszaru rewitalizacji określoną w Lokalnym Programie Rewitalizacji, której odzwierciedleniem jest określony Cel Strategiczny, który brzmi:

Neutralizacja problemów skoncentrowanych w granicach obszaru rewitalizacji w celu zapewnienia spójnego rozwoju społeczno-gospodarczego Jastrzębia-Zdroju.

Celem realizacji założonych w Programie Rewitalizacji projektów jest zagwarantowanie:

- rozwoju społecznego,
- rozwoju przestrzennego,
- rozwoju gospodarczego,

na terenie zdefiniowanym jako obszar rewitalizacji.

Warunkiem brzegowym wdrożenia nakreślonej wizji jest realizacja kompleksowych działań uwzględnionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji i – w ich efekcie – neutralizacja problemów koncentrujących się na wytyczonym obszarze rewitalizacji, co umożliwi zachowanie spójności społecznej miasta i stworzy warunki dla długofalowego i zrównoważonego rozwoju całego miasta.

Podsumowując stopień realizacji poszczególnych projektów wskazanych w *Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Jastrzębi-Zdrój do roku 2020* należy stwierdzić, iż PR na chwilę obecną osiągnął stosunkowo wysoki stopień realizacji, zwłaszcza z uwagi na fakt, że niniejszy raport przygotowywany jest po raz pierwszy (LPR został przyjęty 23 lutego 2017). Niemniej, szereg projektów będzie dopiero realizowana, co zwiększy ilość osiągniętych wskaźników monitoringowych.

7. UWAGI

Biorąc pod uwagę przekazane z poszczególnych jednostek karty do Raportu monitoringowego z realizacji zadania ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji oraz zawarte w nich dane proponuje się aktualizację *Załącznika pn. Raport monitoringowy z realizacji zadania ujętego w Programie Rewitalizacji*, aby zbierane dane były bardziej szczegółowe i pozwoliły na dogłębniejszą analizę, poprzez:

1. Dodanie pkt. 5. Wartość całkowita projektu
2. Rozbudowanie pkt. 6. Realizacja zadania od – do oraz o kolumnę zawierającą źródło finansowania,
3. Dodanie pkt. 7. Zakres robót/działań przewidzianych do realizacji
4. Dodanie pkt. 8. Koszty wraz z kolumną stanowiącą wartość całkowitą zadania,
5. Dodanie pkt. 9. Wskaźniki monitoringowe,
6. Dodanie pkt. 10. Przyczyny niezrealizowania projektu.

W chwili obecnej kolumny w tabeli wskazanej w pkt. 5 przedmiotowego załącznika są zbyt ogólne, co powoduje brak możliwości pełnego zebrania informacji na temat źródeł uzyskanych środków.

Po zmianach *Załącznik Raport monitoringowy z realizacji zadania ujętego w Programie Rewitalizacji* przyjmie formę następującą:

Karta do Raportu monitoringowego z realizacji zadania ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji

1. Zadanie:

Nr z LPR	Nazwa Zadania

2. Instytucja odpowiedzialna za wykonanie zadania (sporządzająca sprawozdanie):

--

3. Partnerzy:

--

4. Beneficjenci zadania:

--

5. Wartość całkowita zadania

--

6. Realizacja zadania od – do (DD-MM-RR)

Opis realizacji zadania (z wyszczególnieniem działań wszystkich wykonawców działania w danym okresie)	Instytucja realizująca	Poniesione koszty na dzień złożenia karty (w zł)	Źródła finansowania*

* należy wskazać środki pochodzące z UE, Budżetu Państwa, Budżetu Miasta, własne

7. Zakres robót/ działań przewidzianych do realizacji

Opis robót / działań	Planowane koszty (w zł)	Źródła finansowania*

* należy wskazać środki pochodzące z UE, Budżetu Państwa, Budżetu Miasta, własne

8. Koszty

Czy podane koszty to koszty całkowite w zakresie przedmiotowego projektu?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>	Wartość całkowita projektu (w zł)

9. Wskaźniki realizacji zadania:

Nazwa wskaźnika	Wartość	Data

10. Proszę o podanie wartości wskaźników, które dotyczą przedmiotowego projektu (należy wskazać minimum jeden wskaźnik z każdego PO, jeżeli dotyczy)

PO-I) Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez kompleksowe działania o charakterze infrastrukturalno-architektonicznym [sfera przestrzenna]
--

Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu	Wartość
PO-II) Aktywizacja ekonomiczna obszaru wsparcia dzięki podniesieniu konkurencyjności i trwałej reorganizacji struktury gospodarczej [sfera gospodarcza]	
Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu	Wartość
PO-III) Wyrównanie szans życiowych i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru wsparcia poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego [sfera społeczna]	
Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu	Wartość

11. Przyczyny niezrealizowania projektu

--

Imię i nazwisko osoby wypełniającej kartę	Nr telefonu
