

**Raport monitoringowy z realizacji zadań ujętych
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju
do 31 grudnia 2023 roku**



Jastrzębie-Zdrój

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	1
1.1.	Źródło danych	1
1.2.	Definicje przyjęte w niniejszym opracowaniu	1
2.	Metodologia przeprowadzenia monitoringu	3
3.	Analiza osiągniętych wskaźników projektowych	6
4.	Analiza finansowych założeń z realizacji projektów	59
5.	Analiza osiągniętych wskaźników monitoringowych	71
6.	Analiza zmian wskaźnikowych na obszarze rewitalizacji	82
6.1	Poziom interwencji policji	82
6.2.	Poziom bezrobocia	83
6.3.	Poziom wsparcia ośrodka pomocy społecznej	84
6.4.	Poziom przedsiębiorczości	84
6.5.	Liczba osób zamieszkujących w mieszkaniach	85
7.	Podsumowanie	86
8.	Uwagi	88
9.	Spis tabel	88
10.	Spis wykresów	88

1. WSTĘP

Rewitalizacja - proces wyprowadzania obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane na tym terenie oraz prowadzone przez interesariuszy tego procesu.

Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 31 grudnia 2023 przyjęty został Uchwałą nr IV.18.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2017 r. Dokument został opracowany na podstawie współpracy pomiędzy Urzędem Miasta, a m.in. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2. Dokument stanowi aktualizację *Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015*. W kolejnym okresie LPR Jastrzębia-Zdroju ulegał aktualizacji o kolejne projekty inwestycyjne i miękkie. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 26.03.2020 r (Uchwała nr III.42.2020 z dnia 26 marca 2020). Natomiast z uwagi na konieczność realizacji do 2023 r. m.in. projektu wpisanego do LPR -"Rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul 1 Maja, Uchwałą z dnia 25.02.2021 r. nr II.31.2021 nastąpiło wydłużenie okresu obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji do 31.12.2023 r.

Zmiany wskazano w *Tabeli 36 Lista i opis projektów głównych, realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji* oraz w tabeli 38 *Tabela finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji*. Zmiany uwzględniono również w części wskaźnikowej dokumentu.

Opracowany Raport z monitoringu służy wyznaczeniu wskaźników, a także badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dążenia do założonych celów oraz poziomu ich osiągania.

1.1. ŹRÓDŁO DANYCH

Informacje i dane, na podstawie których opracowany został przedstawiony raport, pozyskano w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębia-Zdroju oraz instytucjach i jednostkach z terenu miasta, które realizowały bądź realizują poszczególne projekty wchodzące w skład programu rewitalizacji. Dodatkowo pozyskane zostały dane uzupełniające z:

- Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju,
- Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju,
- Spółdzielni mieszkaniowej JAS-MOS,
- Miejskiego Zarządu Nieruchomościami,
- Gminnej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa.

1.2. DEFINICJE PRZYJĘTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

Zlecniodawca: Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Projekt/Zadanie/Raport: Raport monitoringowy z realizacji zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 31 grudnia 2023.

RPO WSL: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

PR: Lokalny Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 31 grudnia 2023.

Raport: Zestawienie w formie jednolitego dokumentu informacji i wskaźników dotyczących stanu realizacji PR.

Monitoring: Proces systematycznego zbierania, analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanego projektu w aspekcie finansowym i rzeczowym.

Okres sprawozdawczy: Okres sprawozdawczy jest to okres, za który sporządza się sprawozdanie np. miesiąc, półrocze, rok.

Cel główny/strategiczny: Cel odnoszący się do kluczowego problemu definiowany w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest on rezultatem wykorzystania powstałych produktów.

Wskaźniki monitoringowe, stanowiące podstawę oceny stopnia realizacji Programu. Wskaźniki projektowe/rezultatu: Fizyczny efekt osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośredni wpływ zrealizowanych działań/stworzonych produktów, osiągany natychmiast po realizacji projektu - określa zmiany jakie nastąpiły u beneficjentów.

Oddziaływanie: Długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla beneficjentów pośrednich, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów.

2. METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA MONITORINGU

Istotą monitoringu jest gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji przydatnych w zarządzaniu rewitalizacją i wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji jest realizacja działań i projektów uwzględnionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służy system współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi program oraz analiza osiąganych wskaźników. Dane niezbędne do przygotowania raportu pozyskane zostały przez Wydział Merytoryczny Miasta m.in. od wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz poszczególnych podmiotów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Na potrzeby monitoringu w Programie Rewitalizacji określony został zestaw wskaźników monitoringowych, do których przyporządkowane zostały poszczególne cele operacyjne. Do tego opracowany został również wzór *Karty raportu monitoringowego z realizacji zadania ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji*

Rekomendowane wskaźniki monitoringowe, stanowiące podstawę oceny stopnia realizacji Programu, zamieszczone zostały poniżej. Zestaw wskaźników powstał w ścisłej korelacji z listą działań przyjętych do realizacji w ramach Programu. Punktem wyjścia dla monitorowania wskaźników w ramach Programu Rewitalizacji jest moment przyjęcia dokumentu, stanowiący jednocześnie punkt „0” dla działań związanych z monitoringiem i ewaluacją. Wskaźniki są monitorowane przyrostowo, przy czym poziomem bazowym jest poziom „0”, nie zaś stan bazowy wskaźnika ustalony na dzień przyjęcia Programu. Taka metodologia pomiaru wskaźników umożliwia monitoring uwzględniający jedynie działania zrealizowane w ramach procesu rewitalizacji, nie zaś działania prowadzone w okresie wcześniejszym, w ramach innych przedsięwzięć. Monitoring ilościowy przeprowadzony został na poziomie wskaźników podstawowych rozumianych jako wskaźniki projektowe/rezultaty.

Dodatkowo, czego nie ujęto w poprzednim raporcie, dokonano oceny stopnia realizacji celów Programu Rewitalizacji na podstawie porównania stanu wskaźników bazowych wykorzystanych do wytyczenia obszaru rewitalizacji, ustalonego w momencie opracowania Programu, z obecnym poziomem wskaźników dotyczących sfery społecznej, przestrzennej oraz gospodarczej (wyniki zestawione zostały w rozdziale 6 Analiza zmian wskaźnikowych na obszarze rewitalizacji na stronie 82).

PO-I) Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez kompleksowe działania o charakterze infrastrukturalno-architektonicznym [sfera przestrzenna].

Kierunek działania	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
K1 - Odnowa urbanistyczna obszarów miejskich i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej, K2 - Rozbudowa i optymalizacja układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej miasta, K3 - Rewitalizacja substancji mieszkaniowej, K4 - Tworzenie rozwiązań infrastrukturalnych wspierających rozwój gospodarczy, K5 - Rewitalizacja terenów i obiektów przemysłowych, K6 - Przebudowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, K7 - Poprawa jakości i konkurencyjności infrastruktury ochrony zdrowia, K8 - Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta,	- Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - Liczba elementów infrastruktury udostępniającej /zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego - Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - Liczba nowopowstałych obiektów na cele sportowe oraz rekreacyjne - Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych i tras rowerowych - Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego - Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych,

K9 - Rozwiązania systemowo-infrastrukturalne dla poprawy jakości środowiska naturalnego.	- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją, - Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury
PO-II) Aktywizacja ekonomiczna obszaru wsparcia dzięki podniesieniu konkurencyjności i trwale reorganizacji struktury gospodarczej [sfera gospodarcza].	
Kierunek działania	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
K10 - Aktywizacja gospodarcza mieszkańców i ułatwianie przekwalifikowania zawodowego, K11 - Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności oraz tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), K12 - Kompleksowa promocja miasta skierowana na przyciągnięcie inwestorów, K13 - Podnoszenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta, K14 - Kształtowanie systemu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	- Liczba zrealizowanych staży - Liczba zrealizowanych dotacji - Liczba zrealizowanych prac interwencyjnych - Liczba zrealizowanych doposażeń stanowiska pracy - Liczba zaplanowanych do realizacji staży - Liczba zaplanowanych do realizacji dotacji - Liczba zaplanowanych do realizacji doposażeń
PO-III) Wyrównywanie szans życiowych i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru wsparcia poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego [sfera społeczna].	
Kierunek działania	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
K15 - Aktywna polityka społeczna w celu neutralizacji zjawisk wykluczenia społecznego, marginalizacji i bierności, K16 - Walka z bezrobociem i biernością zawodową poprzez działania skierowane na podnoszenie kwalifikacji, aktywizację zawodową i rozwój osobowościowy mieszkańców, K17 - Poprawa bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii i dezintegracji społecznej, K18 - Przeciwdziałanie migracji zewnętrznej mieszkańców poprzez wzmacnianie identyfikacji mieszkańców z miastem oraz kształtowanie tożsamości lokalnej, K19 - Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców oraz propagowanie aktywnego stylu życia, K20 - Wsparcie i podniesienie aktywności organizacji pozarządowych, K21 - Wykorzystanie i rozwój istniejącego potencjału edukacyjnego, K22 - Kształtowanie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy,	- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób długotrwale bezrobotnych zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób z niepełnosprawnościami zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania - Liczba dzieci biorących udział w prezentacji młodych talentów - Liczba mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym - Liczba zorganizowanych pokazów filmowych

K23- Aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych.	- Liczba wydarzeń kulturalnych
--	--------------------------------

Źródło: Opracowanie własne.

3. ANALIZA OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTOWYCH

Do *Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju* do 31 grudnia 2023 zgłoszone zostały 64 projekty główne których beneficjentami są m.in. Miasto Jastrzębie-Zdrój, instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje, inwestorzy prywatni czy organizacje pozarządowe. Na liście podstawowych projektów rewitalizacyjnych (*Tabela 36 Lista i opis projektów głównych, realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, str. od 130 Programu Rewitalizacji*) ujętych zostało 64 projektów natomiast na liście pozostałych projektów rewitalizacyjnych (*Tabela 37 Lista projektów rezerwowych, str. od 212 Lokalnego Programu Rewitalizacji*) 4 projekty. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich projektów i stopnia ich realizacji pod kątem wskaźników projektowych przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 1 Projekty zrealizowane w okresie do marca 2019 r.

Nr projektu w LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2019	Budżet
2.	Wakacyjna Akademia poprzedni tytuł: Akademia seniora – organizowanie wspólnych warsztatów na rzecz zdobywanej umiejętności i uczenia przez całe życie	Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej PARTNER: Miejska Biblioteka Publiczna	W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania: - Grecki na wakacje – warsztaty językowe. - Zumba – warsztaty taneczne. - Gimnastyka umysłu – warsztaty usprawniające pracę mózgu. - Wakacyjna przygoda z lustrzanką – warsztaty fotograficzne. - Pszczoły i ich produkty – apiterapia, apitoksynoterapia, - 3XFIT - pilates, stretching, zdrowy kręgosłup, - Tabata i nie tylko – szczupła sylwetka w 4 minuty. - Technologia bez barier – warsztaty komputerowe, - How are You? – angielski na wakacje – warsztaty językowe, - Tworzenie biżuterii – warsztaty rękodzieła, - Podstawy malowania – warsztaty artystyczne, - Wakacje bez stresu – warsztaty samodoskonalenia, - Płaski brzuch – warsztaty sportowe, - Latino dance – warsztaty taneczne, - Joga – warsztaty relaksacyjne, - Zdrowa dieta – warsztaty estetyki żywnościowej.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany 03.07.2017 – 30.08.2018	- Liczba osób biorących udział w warsztatach (w wieku 50 lat i więcej): 977.	9 200 Źródło: Środki własne Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju
7.	Jastrzębskie Centrum Organizacji	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał na celu: - aktywizację społeczności lokalnej – dzieci, młodzieży i seniorów, - prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży, -	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.01.2017	- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	128 040 Źródło:

Nr projektu w LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2019	Budżet
	Pozarządowych (JCOP) poprzedni tytuł: Centrum wolontariatu i organizacji pozarządowych		organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, - dążenie do konsolidacji środowiska organizacji pozarządowych, a przede wszystkim stworzenia systemu informacji dla podmiotów ekonomii społecznej.		– 01.12.2018	objętych wsparciem w programie: 30 -Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 30 -Liczba zorganizowanych akcji dla seniorów: 60 -Liczba spotkań/warsztatów: 50	BP
8.	Festiwal organizacji pozarządowych poprzedni tytuł: Forum Ekonomii Społecznej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Podczas Forum stworzono wspólną przestrzeń do wymiany doświadczeń, wzorców do naśladowania i budowania partnerstwa, wskazano przykłady dobrych praktyk w obrębie sektora ekonomii społecznej, zatrudniania w przedsiębiorstwach społecznych, nawiązania partnerstwa międzysektorowego, podjęto szeroką dyskusję o roli ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju. Zorganizowano warsztaty o tematyce: 1. Współpraca transgraniczna. 2. Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju. 3. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach Publicznych. 4. Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.01.2017 – 01.12.2018	-Liczba zorganizowanych spotkań: 1 - Liczba organizacji /osób biorących udział w społecznej akcji/festiwalu: 16 -Liczba spotkań/warsztatów [Liczba]: 10 - Liczba innych podmiotów uczestniczących w wydarzeniu: 20	1 700 Źródło: BM
9.	Festiwal Sztuk Wszelkich Zderzenia Działań Wrażliwych	Miejski Ośrodek Kultury	W ramach wydarzenia zrealizowane zostały (2017 r.): - spektakle teatralne „Futerko z obłoków”, „ZABAWA”, „Dla mnie bomba”, „GOULD Wariacje”, „Tyglikowe marzenia”, „KOLEJKA	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 09.10.2017 –	- Liczba organizacji biorących udział w festiwalu: 10 - Liczba uczestników: 1381	81 250,61 Źródło:

Nr projektu w LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2019	Budżet
			ZUSOWSKA Sen Autora”, „WOMAN POWER czyli Św. Hildegarda z Binden”, „PUSTE NOCE”, „Frida”, „ZUPA RYBNA W ODESSIE”, -koncerty zespołów „Max Brawura”, „GRZYBY”, -wystawa fotograficzna klubów „SJKF Niezależni” i M6 z Rybnika oraz scenografii Teatru Mariana Bednarka i Teatru Monitoring, -spotkania autorskie z poetami: Maciej Melecki, Arkadiusz Kremza, Marcin Bies, Bogdan Prejs. -happeningi (m. in. czytanie fragmentów „Wesela” S. Wyspiańskiego) oraz warsztaty edukacyjno-artystyczne. W ramach wydarzenia (22-26.10.2018 r.) odbyły się: spektakle teatralne, koncerty oraz warsztaty artystyczne.		26.10.2018	- Liczba wydarzeń: 29	Środki własne MOK środki własne MkiDN
10.	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	Miejski Ośrodek Kultury	Realizacja imprezy miała na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta. Integrowała ona uczestników, a także zapewniała przestrzeń na spędzenie wolnego czasu dla dzieci i rodziców. W ramach wydarzenia odbyły się: - pokaz iluzji i magii – Maciej Pol, - GWARDIA GRYFA: Spektakl „Cztery żywioły”, pokaz chorągwiarzy i tancerzy, szczudlarze, bańki mydlane, - pokaz tańca Breakdance – b-boye z Katowic, - pokaz tańca towarzyskiego – Duet ELITA z Krakowa, - balonikowe zoo, malowanie twarzy, - dyskoteka pod chmurką – DJ,	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 04.06.2017	- Liczba dzieci biorących udział w prezentacji młodych talentów: 500 - Liczba zorganizowanych zabaw i animacji: 9 - Liczba artystów: 34 - Liczba osób: 3950	56 581,47 Źródło: Środki własne MOK

Nr projektu w LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2019	Budżet
			- pokaz psich sztuczek, - prezentacja jastrzębskich talentów.				
11.	Jarmark Sztuki Wiosna Ludów	Miejski Ośrodek Kultury	W ramach wydarzenia odbyły się wydarzenia artystyczne, muzyczno-teatralne, przybliżające innowacyjne nurty w dziedzinie muzyki i teatru.	PO III) społeczna	"Projekt zrealizowany: 6-8.05.2016"	Osiągnięte wskaźniki: - liczba osób biorących udział w warsztatach: 500 - liczba artystów poniżej 25 r. życia biorących udział w wydarzeniu: 3	11 987,60 Źródło: Środki własne MOK
13.	Jastrzębskie Lato Muzyczne	Miejski Ośrodek Kultury	W ramach wydarzenia odbyły się spotkania artystów, muzyków z terenu Polski i zagranicy oraz spotkania z artystami i muzykami znanymi z ekranu. Zorganizowano 12 koncertów w ramach cyklu „Jastrzębskie Lato Muzyczne”. Co niedzielę w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju wystąpiły dwa zespoły reprezentujące różne gatunki muzyczne. W wybranym okresie były to zespoły: „Brygida i Robert Łukowski”, „Jolanta i Jacek Kierok”, „Ewa Kopczyńska”, „Krzysztof Koniarek”, „DAREK NOWICKI”, „ZESPÓŁ EMI BAND ORAZ ANDRZEJ MIŚ”, Orkiestra Dęta KWK „JAS-MOS”, Zespół „GRAFIT”, Orkiestra Dęta KWK „Zofiówka”, „Alexander Martinez”, Big Band KWK „Borynia”, "DUO FENIX-DWA FYNIKI". Ze względu na rozpoczęty remont i przebudowę Parku Zdrojowego w 2018 r. Koncerty nie odbyły się.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 09.07.2017 – 20.08.2017	- Liczba mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w koncertach: 4750 - Liczba koncertów odbywających się w ramach projektu: 11 - Liczba wykonawców: 11	60 222,98 Źródło: Środki własne MOK
14.	Transgraniczne zaczytanie	Miejska Biblioteka Publiczna	W ramach wydarzenia odbyły się: warsztaty językowe, warsztaty kulturalno-artystyczne, wydanie polsko-czeskiego poradnika językowego zawierającego tekst i zdjęcia obiektów	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 28.08.2017	- Liczba partnerów zaangażowanych w realizację projektu: 2	68 533,05 Źródło:

Nr projektu w LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2019	Budżet
	poprzedni tytuł: Językowa akademia kultury pogranicza – wsparcie inicjatyw kulturalno- edukacyjnych	PARTNER Biblioteka Publiczna w Karwinie	kulturalnych pogranicza, jarmark książkowy, spotkania autorskie. Projekt zakładał stworzenie lepszych warunków do obcowania ze współczesną literaturą polsko- czeską oraz do świadomego i krytycznego jej odbioru. Poprzez warsztaty zintensyfikowane zostały spotkania polskiej i czeskiej młodzieży. Zorganizowano spotkanie integracyjne uczestników projektu oraz koncert podczas jarmarku książkowego w Karwinie. Spotkanie połączone było ze zwiedzaniem Biblioteki oraz Pałacu we Frysztacie.		– 31.03.2018	- Liczba osób uczestniczących w warsztatach: 252 - Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie edukacji: 7 -Liczba uczestników wspólnych programów edukacyjnych oraz przygotowania zawodowego w celu transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży, zwiększenia możliwości edukacyjnych kształcenia wyższego i przygotowania zawodowego: 238	UE BM BP
15.	Letnie Kino Parkowe	Miejski Ośrodek Kultury	Projekt miał na celu zaspokojenie dostępu do kultury. Skierowany był do szerokiego grona odbiorców sprzyjając integracji społecznej. Poprzez zwiększenie okazji do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych uświadamia potrzebę udziału w kulturze. W ramach projektu budowano również więzi społeczne oraz stworzono platformę integracji społecznej. Zrealizowano cykl seansów filmowych wyświetlanych w poniedziałki lipca i sierpnia w Parku Zdrojowym. W repertuarze znalazły się zarówno produkcje polskie i zagraniczne. Oferta była bezpłatna dla widzów	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 03.07.2017 – 28.08.2017	- Liczba zorganizowanych pokazów filmowych: 13 - Liczba osób korzystających z oferty: 1150 - Liczba zorganizowanych pokazów filmowych: 13	5 670,30 Źródło: Środki własne MOK
17.	Muzyczne Środy	Miejski Ośrodek Kultury	W ramach projektu zorganizowano 9 koncertów w ramach cyklu „Muzyczne środy”. Co środę w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju wystąpił jeden zespół reprezentujący inny gatunek muzyczny.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 05.07.2017	- Liczba koncertów odbywających się w ramach projektu: 9	29 983,98 Źródło:

Nr projektu w LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2019	Budżet
			W wybranym okresie były to zespoły: „Coria”, Kurczat”, „Blend”, „Ziggie Piggie”, Grooversi”, Paweł Kamiński Quartet”, „Tabu”, „Koniec świata”. Każdy z koncertów był świetnym urozmaicheniem wakacyjnego tygodnia.		– 30.08.2017	- Liczba osób uczestniczących w koncertach: 3450 - Liczba artystów (zespołów) biorących udział w wydarzeniu: 9	Środki własne MOK
18.	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój PARTNER Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika	Projekt zrealizowano w ramach partnerstwa przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS – liderem projektu, Miastem Żory i Powiatem wodzisławskim. Z oferty OWES korzystały m.in. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego oraz podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, WTZ, ZAZ, CIS, KIS itp.) i ich pracownicy. W ramach projektu prowadzono następujące działania: - animowanie, inkubowanie, - wspieranie w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw społecznych, - udzielanie informacji dotyczących: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia statutowej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej, możliwych do pozyskania środków na działalność, zmieniających się przepisów prawa itp. W ramach doradztwa utworzono 3 organizacje pozarządowe prowadząca działalność odpłatną, 2 organizacje pozarządowe w wyniku działań OWES rozpoczęły prowadzenie działalności odpłatnej. - promocja ekonomii społecznej.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.04.2016 – 31.07.2018	- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 50 - Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 21 - Liczba nowopowstałych miejsc pracy: 7	132 950,00 Źródło: UM BM

Nr projektu w LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2019	Budżet
20.	Piknik w kurorcie	Miejski Ośrodek Kultury	21.05.2017 r. - IV Piknik w kurorcie – impreza plenerowa, utrzymana w klimacie lat 20 i 30 XX w., odbyła się na terenie Parku Zdrojowego. W ramach wydarzenia wystąpiły 3 zespoły, Teatr Monitoring oraz odbył się dancing w Domu Zdrojowym. Uczestnicy mogli także wziąć udział w przejażdżce automobilami z epoki oraz skorzystać z usług pucybuta oraz fryzjera. 09.06.2017 r. - Promocja książki „Letnisko Oficerskie” odbył się w Galerii Historii Miasta w ramach IV Pikniku w kurorcie. W ramach zadania wydrukowano książkę oraz zorganizowano jej promocję.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 21.05.2017 – 09.06.2017	- Liczba wydarzeń kulturalnych skierowana do mieszkańców: 6 - Liczba osób biorących udział w wydarzeniach: 1000	45 293, 93 Źródło: Środki własne MOK
26.	Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Gwarków	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał za zadanie zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalno – sportowych. W ramach projektu odbyły się takie wydarzenia jak: - Sport to zdrowie, - Leonowa Miła, - Sportowo dla seniorów, - Gwarkowe gole, - Przedszkolaki na sportowo, - Pierwszoklasista i sport.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 16.06.2018 – 28.02.2018.	- Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 6	6 997,56 Źródło: BM
27.	Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Zofiówka	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał na celu zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach. W ramach wydarzenia odbyły się: - Konkurencje sportowe dla mieszkańców-festyn,	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 15.06.2018 – 06.12.2018	- Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 4	6 967 Źródło: BM

Nr projektu w LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2019	Budżet
			- Festyn na sportowo, - Mikołajowe zabawy i konkursy, - Mikołaj dla wszystkich.				
28.	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla 1000-lecia	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał na celu zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalnych. Zorganizowano konkurs w ramach zakończenia lata oraz Dzień Świętego Mikołaja.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 08.09.2018 – 06.12.2018	- Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 2	6 998,74 Źródło: BM
29.	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał na celu zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalnych tj. udział w konkursie Wiosenne kwiaty w oczach dzieci, „Dziedzictwo i tradycja Górnego Śląska” - konkurs gwary Śląskiej i skeczów, impreza miejska plenerowa, udział w Dożynkach oraz Dożynkowych igraszkach. Zorganizowano Dożynkowe rywalizacje sportowe i kulturalne, zabawę karnawałową, dzień „Witaj Wiosno” Dzień Dziecka, Festyn Osiedlowy.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 26.01.2018 – 26.08.2018	- Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 5	11 218,70 Źródło: BM
30.	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Przyjaźń	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał na celu zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalnych tj.: - Ozdoba świąteczna Bożego Narodzenia, - Boisko GLIKA, - Piłka plażowa, - SKAT – Przyjaźń kontra reszta Miasta Zorganizowano również Turniej Szachowy oraz XVI Turniej Mini Piłki Nożnej Przedszkolaków.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 15.06.2018 – 14.12.2018	- Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 6	8 782,83 Źródło: BM

Nr projektu w LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2019	Budżet
31.	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Zdrój	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał na celu spędzanie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalnych tj. udział w wydarzeniach pt. Święta, tuż, tuż... W anielskim nastroju, Zwierzak duży i mały – mój przyjaciel, 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.07.2018 – 10-12.12.2018	- Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 3	2 299,11 Źródło: BM
34.	Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój PARTNER Miasto Karvina	Celem projektu było zintensyfikowanie współpracy służb z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny poprzez organizację: -kursów językowych dla przedstawicieli służb z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny, -konferencji tematycznej dla przedstawicieli miast, służb mundurowych i medycznych nt. profilaktyki antynarkotykowej i zapobiegania rozprzestrzeniania się chemicznych środków odurzających typu dopalacze -konferencji tematycznej dla przedstawicieli miast, służb mundurowych i medycznych nt. prewencji kryminalnej, działań profilaktycznych kierowanych do różnych grup społecznych -warsztatów dla przedstawicieli miast, służb mundurowych i medycznych nt. wymiany doświadczeń. Wynikiem realizacji projektu jest zintensyfikowanie współpracy straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju podczas rozwiązywania problemów pojawiających się po obu stronach granicy. Dzięki realizacji projektu doszło do wymiany doświadczeń, dostosowania systemu i reguł wzajemnej współpracy oraz poprawy oferowanych przez instytucje włączone do projektu. W ramach projektu zrealizowano działania:	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.07.2017 – 30.10.2018	- Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania: 2	158 268,04 Źródło: UE BM

Nr projektu w LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2019	Budżet
			- „System do znakowania i rejestracji rowerów”, - „Promocja”, - „Szkolenia Językowe”, - „Konferencja Karwina”, - „Konferencja Jastrzębie”, - „Warsztat”, - „Film”.				
36.	Żelazny szlak rowerowy	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	W ramach działań projektu: - stworzono sieć ścieżek i tras rowerowych prowadzącej po zabytkach poprzemysłowych i kolejnictwa z XIX wieku, -szlak będzie ma charakter dydaktyczny, został uzupełniony o tablice informacyjne dotyczące historii poszczególnych elementów dziedzictwa historycznego i kulturowego, - zostały stworzone punkty geocachingu i gry dydaktyczne -poznawczej, - działania informacyjno – promocyjne dotyczące unikatowego szlaku. W Mieście Jastrzębie - Zdrój: Zakres pierwszego etapu robót obejmował budowę nowej trasy rowerowej na odcinku 370,3m od granicy z Gminą Godów. Opracowanie obejmuje także budowę zjazdu, drogi dojazdowej wraz z organizacją ruchu oraz wykonanie miejsca rekreacyjnego i pozostałej infrastruktury. Zakres drugiego etapu robót obejmuje budowę nowej trasy rowerowej na odcinku 215,0 m od granicy z Gminą Zebrzydowice. Opracowanie obejmuje także budowę zjazdu z organizacją ruchu oraz wykonanie pozostałej infrastruktury.	PO-I) przestrzenna PO -III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.01.2017 – 30.11.2018	- Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych i tras rowerowych: 0,585 km	1 304 782,96 Źródło: BM UE
37.	V polsko-czeskie spotkania branżowe	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Celem trzech samorządów jest tworzenie przestrzeni do prowadzenia współpracy transgranicznej swoich podmiotów oraz wspieranie ich w tych działaniach,	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 2016	- Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania: 3	64 214,22

Nr projektu w LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2019	Budżet
		PARTNERZY Miasto Hawierzów Miasto Karwina	co ma doprowadzić do aktywizacji działań transgranicznych w różnych obszarach tematycznych, których korzyść odczuwać będą mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Kolejna edycja projektu jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie - jakie od dłuższego czasu zgłaszają m.in. szkoły, stowarzyszenia, kluby sportowe – w kontekście finansowego wsparcia swojej działalności w ujęciu transgranicznym. W ramach projektu powołano sześć tematycznych grup branżowych: sport, kultura (poszerzono o turystykę); edukacja; bezpieczeństwo publiczne; biznes; polityka młodzieżowa; samorząd lokalny, gdzie wyłoniono polskich i czeskich liderów tych grup. Nad pracą grup oraz charakterem poszczególnych spotkań czuwał każdorazowo lider grupy. Oprócz zaplanowanych w projekcie spotkań, odbywały się także dodatkowe spotkania, wynikające z potrzeb danej grupy. Realizacja projektu pozwoliła zweryfikować potencjał współpracy transgranicznej we wskazanych w projekcie obszarach tematycznych. Trudną w prowadzeniu projektowym okazała się być grupa Biznes, z uwagi na specyfikę tej grupy (indywidualne potrzeby biznesowe każdego uczestnika) oraz bardzo lokalne potrzeby przedstawicieli tego obszaru kierowane do poszczególnych samorządów. Ciekawym doświadczeniem były działania promocyjne, realizowane poza obszarem wsparcia. W Ambasadach RP w Pradze oraz RCZ w Warszawie zaprezentowano m.in. prowadzoną z powodzeniem intensywną aktywność transgraniczną pomiędzy miastami. O randze tych wydarzeń świadczy fakt, iż zechcieli w nich			- zrealizowane projekty we współpracy transgranicznej: 7	Źródło: UE BP BM

Nr projektu w LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2019	Budżet
			uczestniczyć przedstawiciele instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego oraz eksperci. Oba eventy były pozytywnie odebrane i komentowane przez zgromadzonych gości. Można sądzić, iż działanie to może mieć swoje pozytywne efekty w okresie trwałości projektu.				
39.	Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	W ramach projektu: I. Wyposażono pracownię do praktycznej nauki zawodu technik elektryk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju w: 1. Stoły elektrotechniczne 2. Zestaw do badania silników asynchronicznych 3. Zestaw do badania maszyn 4. Zestaw do badania instalacji elektrycznej II. Wyposażono pracownię do praktycznej nauki zawodu chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu -Zdroju w: a) Stanowisko demonstracyjne Pompa ciepła b) Stanowisko wolnostojące - Badanie rekuperatora c) Modułowe stanowisko dydaktyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne-stanowisko wolnostojące d) Stanowisko montażowe sprężarkowych układów chłodniczych – stanowisko na biurko e) Stanowisko montażowe zestawu klimatyzacyjnego w budynku – stanowisko wolnostojące f) Dydaktyczna instalacja chłodnicza - stanowisko wolnostojące g) Zestaw do lutowania twardego	PO-III) społeczna PO-I) przestrzenna	Projekt zrealizowany: 30.08.2018 – 29.03.2019	- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 260 - Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego: 2 - Liczba placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 2	935 700 Źródło: UE BP BM

Nr projektu w LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2019	Budżet
			h) Stacja napełniania czynnika R134A i R410A i) Stacja odzysku czynnika R134A i R410A j) Stół montażowy z rozdzielnicą k) System klimatyzacji Climatronic III. Wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w: 1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe 2. Stanowiska instalatorskie				

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Podsumowanie:

W okresie **od roku 2016 do marca 2019 roku** (pierwszy okres sprawozdawczy) zrealizowano w pełni **22 projektów, co stanowi 34%** wszystkich projektów listy głównej. Budżet projektów zrealizowanych w tym okresie wyniósł **3 038 550,07 zł**.

Przedmiotowe projekty ukierunkowane były na:

1. Działania aktywizujące osoby mniej uprzywilejowane w społeczeństwie, takie jak osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 - edukacyjne i sportowe zajęcia dla seniorów w formie warsztatów na rzecz zdobywanej umiejętności i uczenia przez całe życie, związanych m. in. z poprawą umiejętności językowych mieszkańców, pielęgnacją ich talentów i zainteresowań oraz poprawą ich kondycji fizycznej. Uczestnikami warsztatów w dużej mierze były osoby w wieku 50 lat i więcej. W sumie liczba osób starszych biorących udział w warsztatach wyniosła 977.
 - zajęcia, których celem było produktywnie zagospodarowanie czasu wolnego wśród mieszkańców - szczególnie osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Organizowano liczne warsztaty (50), a w ramach działań wsparciem objęto 30 osób z niepełnosprawnościami, 60 seniorów oraz 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 - w ramach projektu polegającego na wsparciu podmiotów ekonomii społecznej w ich rozwoju wspomóżono 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich wsparciem w programie.

Z powyższych działań projektowych skorzystało:

- 1037 seniorów,
 - 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 - 30 osób z niepełnosprawnościami.
2. Działania związane z współpracą transgraniczną:
 - W ramach Festiwalu organizacji pozarządowych zorganizowano warsztaty poświęcone współpracy transgranicznej.
 - Głównym celem projektu „Transgraniczne zaczytanie” była organizacja warsztatów językowych związanych z współczesną literaturą polsko-czeską, wydanie polsko-czeskiego poradnika językowego zawierającego tekst i zdjęcia obiektów kulturalnych pogranicza oraz integracja młodzieży polskiej i czeskiej na jarmarku książkowym w Karwinie. Spotkanie połączone było ze zwiedzaniem Biblioteki oraz Pałacu we Frysztacie. W warsztatach wzięło udział 252 osób, zaś ze wspólnych programów edukacyjnych oraz przygotowania zawodowego w celu transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży, zwiększenia możliwości edukacyjnych kształcenia wyższego i przygotowania zawodowego, skorzystało 238 uczestników.
 - Działania jednego z projektów skupiały się na intensyfikacji współpracy transgranicznej straży miejskiej w Karwinie i w Jastrzębiu-Zdroju. Dla przedstawicieli służb zrealizowano m.in. lekcje czeskiego, konferencję nt. profilaktyki antynarkotykowej oraz środków odurzających oraz konferencję dla służb i przedstawicieli miast nt. prewencji kryminalnej. Dzięki realizacji projektu doszło do wymiany doświadczeń, dostosowania systemu i reguł współpracy oraz poprawy oferowanych przez instytucje włączone do projektu. W projekcie wzięło udział dwóch partnerów.
 - Zorganizowano polsko-czeskie spotkania branżowe związane ze współpracą transgraniczną w różnych obszarach tematycznych, których korzyści mieli odczuwać mieszkańcy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów. W ramach projektu powołano sześć tematycznych grup branżowych: sport, kultura (poszerzono o turystykę), edukacja, bezpieczeństwo publiczne, biznes, polityka młodzieżowa, samorząd lokalny. Wyłoniono polskich i czeskich liderów tych grup. W ramach tego zadania zrealizowano 7 projektów we współpracy transgranicznej.

Korzyści z realizacji projektów w formie wskaźników:

- Ilość partnerów zaangażowanych w działania transgraniczne: 3
 - Ilość projektów zrealizowanych we współpracy transgranicznej: 7
 - Ilość uczestników wspólnych programów edukacyjnych oraz przygotowania zawodowego w celu transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży, zwiększenia możliwości edukacyjnych kształcenia wyższego i przygotowania zawodowego: 238
 - Ilość uczestników warsztatów: 252
3. Działania związane z szerzeniem wiedzy na temat ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i planów rozwoju:
- organizacja Festiwalu organizacji pozarządowych. W ramach tego zadania odbyły się warsztaty m.in. o tematyce: ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach Publicznych oraz wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych. W ramach zadania zorganizowano także forum będące okazją do wymiany doświadczeń wśród organizacji pozarządowych. W ramach projektu zrealizowano 10 warsztatów, liczba organizacji pozarządowych biorących udział w Forum wyniosła 16, a liczba innych podmiotów biorących udział w wydarzeniu wyniosła 20.
 - Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ich rozwoju i tworzeniu poprzez udzielanie informacji dot. uzyskiwania środków, prowadzenia działalności. W ramach tego zadania utworzono 3 organizacje zajmujące się doradztwem. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 21. Liczba nowopowstałych miejsc pracy: 7.

Korzyści z realizacji projektów związanych z ekonomią w formie wskaźników:

- Organizacja warsztatów ekonomicznych w ilości: 10,
 - liczba organizacji pozarządowych biorących udział w Forum: 16,
 - liczba innych podmiotów biorących udział w Forum: 20,
 - Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 21,
 - Liczba nowopowstałych miejsc pracy: 7.
4. Wydarzenia kulturalne i sportowe o charakterze integracyjnym, zorganizowane dla mieszkańców poszczególnych osiedli w celu ich aktywizacji oraz budowania sąsiedzkich relacji:
- Wydarzenia zorganizowane dla mieszkańców osiedla Gwarków. Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 6.
 - Wydarzenia zorganizowane dla mieszkańców osiedla Zofiówka. Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 4.
 - Wydarzenia zorganizowane dla mieszkańców osiedla 1000-lecia. Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 2.
 - Wydarzenia zorganizowane dla mieszkańców osiedla Jastrzębie Dolne i Górne. Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 5.
 - Wydarzenia zorganizowane dla mieszkańców Osiedla Przyjaźń. Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 6.
 - Wydarzenie zorganizowane dla mieszkańców dla Osiedla Zdrój. Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 3.

Korzyści z realizacji projektów integracyjnych skierowanych dla mieszkańców poszczególnych osiedli w formie wskaźników:

- Suma wydarzeń: 26.
5. Działania kulturalne związane z zagadnieniami takimi jak: film, muzyka, teatr, rozrywka, będące okazją do integracji międzypokoleniowej:
- „Festiwal sztuk wszelakich” to projekt, w ramach którego zorganizowano m. in. spektakle, koncerty, wystawę fotograficzną, spotkania autorskie oraz warsztaty edukacyjno-artystyczne. W projekcie

wzięło udział 10 organizacji. W sumie w ramach zadania zorganizowano 29 wydarzeń, w których wzięło udział 1381 uczestników.

- "Jarmark sztuki- Wiosna Ludów", to projekt w ramach którego odbyły się wydarzenia artystyczne, muzyczno-teatralne, przybliżające nurty w dziedzinie muzyki i sztuki. W spotkaniach udział wzięło 500 osób w tym 3 artystów poniżej 25 roku życia.
- Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, w ramach którego miał miejsce m. in. pokaz iluzjonisty, spektakl, pokaz tańca, pokaz psich sztuczek oraz pokaz młodych talentów prezentowanych przez 500 dzieci. W ramach zadania zorganizowano 9 animacji i zaangażowano 34 artystów. W festynie wzięło udział 3950 osób.
- „Jastrzębskie lato muzyczne” to cykl 12 koncertów, spotkań z artystami i muzykami z polski i zagranicy, w których zaprezentowało się 11 wykonawców. W koncertach wzięły udział osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w liczbie 4750.
- W ramach projektu „Muzyczne środy” zorganizowano 9 koncertów muzycznych, a na każdym z nich występowali artyści reprezentujący inny gatunek muzyczny. Na scenie wystąpiło 9 artystów, a koncerty zobaczyło 3450 uczestników.
- Cykl seansów filmowych na świeżym powietrzu w ramach projektu „Letnie kino parkowe”. Zorganizowano 13 pokazów polskich i zagranicznych filmów. Z oferty skorzystało 1150 widzów.
- Impreza plenerowa w klimacie lat 20 i 30 (dancing, przejażdżka samochodem, fryzjer, pacybut). W ramach zadania miało również miejsce wydarzenie promujące książkę „Letnisko Oficerskie”. Projekt polegał więc na organizacji dwóch wydarzeń, w których łącznie występowało 6 artystów. W wydarzeniach wzięło udział 1000 osób.

Korzyści z realizacji projektów kulturalnych w formie wskaźników:

- Liczba organizacji biorących udział w festiwalu: 10,
 - Liczba artystów (zespołów lub wykonawców) biorących udział w wydarzeniach: 60,
 - Liczba wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców: 31,
 - Liczba zorganizowanych koncertów: 21,
 - Liczba zorganizowanych pokazów filmowych: 13,
 - Liczba zorganizowanych zabaw i animacji: 9,
 - Liczba dzieci biorących udział w prezentacji młodych talentów: 500,
 - Liczba osób korzystających z oferty: 15 681.
6. Działania ukierunkowane na poprawę infrastruktury miejskiej:
- Budowa szlaku rowerowego o długości 0,585 km – sieć ścieżek i tras o charakterze dydaktycznym, prowadzących po zabytkach przemysłowych oznaczonych tablicami informacyjnymi.
 - Korzyści z realizacji projektów związanych z infrastrukturą w formie wskaźników:
 - długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych i tras rowerowych: 0,585 km,
 - wyposażenie Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju i utworzenie profesjonalnych pracowników do praktycznej nauki zawodów: technik elektryk oraz technik informatyk oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu -Zdroju i utworzenie profesjonalnych pracowników do praktycznej nauki zawodu: chłodnictwo i klimatyzacja.

Korzyści z realizacji projektów w formie wskaźników:

- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 260
- Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego: 2
- Liczba placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących wyposażenie zakupione dzięki EFS: 2.

Tabela 2 Projekty zrealizowane w okresie od kwietnia 2019 r. do maja 2021 r.

Nr projekt u LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Budżet
4.	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ na obszarze rewitalizowanym	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt polegał na realizacji działań w zakresie aktywizacji zawodowej, poprzez wykorzystanie instrumentów i usług rynku pracy: - służących indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej oraz - skierowanych do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji - służących zdobyciu doświadczenia zawodowego. Kierowany był do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia dla których ustalono I lub II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z grup: - osoba powyżej 50 roku życia, -kobiety, -osoby niepełnosprawne, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby o niskich kwalifikacjach.	PO II) gospodarcza PO III) społeczna	Projekt Zrealizowany 01.03.2019 – 28.02.2021	- Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych: 27 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych: 16 - Liczba osób niepełnosprawnych zaplanowanych do objęcia wsparciem: 1 - Liczba osób 50 + zaplanowanych do objęcia programem: 6 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach: 27	254 616,25 Źródło: UE BP, Fundusz Pracy
5	Zmiana nazwy projektu 5.a - Praktyka i Praca - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt zakładał wsparcie uzupełniające dla działania 10.3.2 jako miękkie do projektu rewitalizowanego. Projekt zakładał zatrudnienie oraz utrzymanie stanowisk pracy przez okres, co najmniej równym odbywanym stażom / przygotowaniom zawodowym lub wynikający z zapisów umów o organizację prac interwencyjnych lub przez cały okres prac związanych z rewitalizacją	PO III) społeczna PO II) gospodarcza	5.a - projekt zrealizowany 5.b. projekt zrealizowany	Ad.5.a) -Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 134 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 76 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 10	Ad.5.a. 956 872,50 Źródło: UE BP,

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Budżet
	5.b. - Bliżej pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ Poprzedni tytuł: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w ramach działania 7.1.2 (Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju)		wyznaczonego budynku / terenu. Wpływie na sytuację osób na rynku pracy			- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 37 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 120 - Liczba osób pracujących, po opuszczeniu programu: 82 - odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 76 - odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 80 - odsetek uczestników niepełnosprawnych którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 67 - odsetek uczestników w wieku 50+ którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 64 - odsetek uczestniczek, które podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 78 Ad.5. b) - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 61 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 34 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 6 -Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 15	Fundusz Pracy Ad.5.b. 594 361,25 Źródło: UE BP, Fundusz Pracy

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Budżet
						- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 61 - Liczba osób pracujących, po opuszczeniu programu: 38 - odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, które podejmą pracę w okresie do 3 miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 79	
21.	Wsparcie w starcie poprzedni tytuł: Promocja samozatrudnienia na obszarze rewitalizowanym w ramach działania 7.3.2	SWIG Delta Partner PARTNER Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Grupę docelową stanowiły osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup. W ramach projektu odbywały się rozmowy z doradcą oraz usługi szkoleniowo-doradcze, a także udzielane były dotacje na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie pomostowe.	PO II) gospodarcza	Projekt zrealizowany 01.06.2018 – 31.07.2019	- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcia działalności gospodarczej w programie: 4 - Liczba osób, które wzięły udział w indywidualnych konsultacjach: 4 - Liczba wydanych zaświadczeń ukończenia kursów: 4	275 895,70 Źródło: UE BM
23. / 24	Ćwiczenie nie zna granic poprzedni tytuł: Siłownia na wolnym powietrzu Skate-park (Zarząd Osiedla „Zofiówka” przy współudziale	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Bogusława Marchewka, Przewodniczący Osiedla Zofiówka	Projekt polegał na: 1) przygotowaniu terenu, 2) przygotowaniu projektu inwestycji, 3) realizacji projektu - montaż urządzeń. Projekt powiązany jest z projektem „Skate park”.	PO I) przestrzenna PO III) społeczna	Projekt zrealizowany 02.07.2018 – 30.06.2019	- Liczba nowopowstałych obiektów na cele sportowe oraz rekreacyjne: 1	118 691,62 Źródło: UE BP BM

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Budżet
	Wydziału Infrastruktury i Inwestycji)						
25	Wakacyjne warsztaty międzypokoleniowe Poprzedni tytuł: Słowo i obraz w przestrzeni międzypokoleniowej -- zajęcia o obszarze kultury i sztuki angażujące różne pokolenia (Miejska Biblioteka Publiczna, Jastrzębie-Zdrój)	Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju	Planowane działania skupiały się wokół zagadnień związanych z filmem, teatrem i fotografią i obejmowały: warsztaty, spotkania, wykłady i wizyty studyjne. Wszystkie wydarzenia kładły nacisk na integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany 01.07.2019 – 29.08.2019	- Liczba zrealizowanych działań: 8 -Liczba uczestników: 150	4 060,00 Źródło: Środki własne Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej
38	38.a. Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic ZSZ w Jastrzębiu Zdroju 38.b. Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w ZS	Urząd Miasta w Jastrzębiu - Zdroju	Pierwotnie projekt pn. „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” nie uzyskał dofinansowania, jednakże został zrealizowany w oparciu o dwa projekty: 38. a. umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic ZSZ w Jastrzębiu Zdroju	PO-I) przestrzenna PO III) społeczna	Ad.38.a. Projekt zrealizowany: 2019 - 2021 Ad.38.b. Projekt zrealizowany:	- Liczba szkół i kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 2 - Liczba osób objętych wsparciem - instytucje objęte wsparciem: 160	Ad.38.a. 314 151,25 Źródło: UE BM Ad.38.b. 774 776,80

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Budżet
	2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu Zdroju poprzedni tytuł: Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego		38.b. Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w ZS 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu Zdroju		2019 - 2021		Źródło: UE BP BM
40.	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju	SWIG Delta Partner	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju	PO-III) społeczna PO-I) przestrzenna	Projekt zrealizowany: 01.09.2018 - 31.08.2021	- Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 23 - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 4	1 918 953,60 Źródło: UE BM BP

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Budżet
41.	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju poprzedni tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 i PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt obejmował rozbudowę, termomodernizację i przebudowę Szkoły Podstawowej nr 1 na Zespół Szkłono-przedszkolny w zakresie: •drogi pożarowej; •25 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych; •placu zabaw dla dzieci; •ogrodzenia; •elementów małej architektury; •wycinki oraz przesadzeniu części drzew, a także wykonanie nowych nasadzeń; •wiaty śmietnikowej; •przyłącza mediów; •chodników oraz schodów terenowych •rozbiorczy istniejącego dawnego domu nauczyciela; •termomodernizacji budynku – ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachu; •przebudowy sanitariatów na poziomie parteru i piętra; •rynny i rur spustowych; •instalacji gazowych, odgromowych, fotowoltaicznych, elektryczne, oświetlenia zewnętrznego, dozoru obiektu i otoczenia (kamery), teletechniczna; •kanalizacji sanitarnej, deszczowej; •wentylacji grawitacyjnej, wspomaganej wentylatorami mechanicznymi. A nade wszystko zastąpieniu kotłowni węglowej	PO-I) przestrzenna	Projekt zrealizowany 23.05.2017 – 15.12.2020	-Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]: 1550.83 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 1 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]: 736.86 - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [kWh/rok]: 180147.2 - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok]: 736.86 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok]: 15.692 Stopień redukcji PM 10 [tony/rok]: 0.000584	13 646 755,60 Źródło: UE BP BM

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Budżet
			nowoczesnym i energooszczędnym sposobem ogrzewania za pomocą kotła opalanego gazem, wspomaganym energią pochodzącą z ognia w fotowoltaicznych.				
42.	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu poprzedni tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt swoim zakresem obejmował m.in.: I. Inwentaryzację obiektu II. Roboty termoizolacyjne III. Dostosowanie obiektu do przepisów IV. Przebudowa wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych V. Remont wejść VI. Przebudowa łazienek (dostosowanie do aktualnych przepisów) VII. Przebudowa kuchni (dostosowanie do aktualnych przepisów) VIII. Roboty instalacyjne	PO-I) przestrzenna	Projekt zrealizowany 23.05.2017 – 21.12.2020	- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]: 2573 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]: 1 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]: 927.86 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]: 45.6754 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [kWh/rok]: 420767.2 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok]: 1092.160 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWh/rok] 16.15200 Stopień redukcji PM 10 [tony/rok]: 0.0006	10 975 775,57 Źródło: UE BP BM
47	Drugi Dom	Wojewódzki Szpital	Projekt polega na utworzeniu miejsc w Zakładach Opieki Długoterminowej, w	PO-I) przestrzenna	Projekt w trakcie	Osiągnięte wskaźniki stan na I półrocze 2021:	795 555,46 zł UE

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Budżet
	Poprzednia nazwa: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie miejsc w Zakładach Opieki Długoterminowej, w którym uzyskają krótkookresową całodobową opiekę osoby niesamodzielne w zastępstwie opiekunów faktycznych	Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	których uzyskają krótkookresową, całodobową opiekę osoby niesamodzielne w zastępstwie opiekunów faktycznych. Osoby uczestniczące w projekcie poza opieką lekarską, pielęgniarską zostaną objęte kompleksową rehabilitacją oraz opieką psychologiczną. Ponadto do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów będą adresowane działania edukacyjne, które będą obejmowały następujące zagadnienia: nauka zachowań prozdrowotnych, prawidłowe odżywianie, umiejętność radzenia sobie w warunkach domowych.	PO-III) społeczna	realizacji: 2019 - 2021	-Liczba wpartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 10 -Liczba osób zaangażowanych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 80	BP
52.	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt polegał na świadczeniu usług zdrowotnych ponadstandardowych, na działalności edukacyjnej i profilaktycznej z różnych dziedzin oraz na szeroko pojętym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych mających zastosowanie w teleopiece. Wśród zaplanowanych działań należy wymienić: a) Objęcie pacjentów teleopieką (Kardio Tel/ Bezpieczny senior/KTG czyli zdalna opieka nad ciężarną) b) Ponadstandardowe wizyty patronażowe realizowane przez położne POZ c) Aktywizacja poprzez stworzenie możliwości skorzystania z zaplecza Szpitala - Sala ćwiczeń z dowozem pacjentów na w/w ćwiczenia,	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany 01.01.2014 – 2020	- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu: 1 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych: 1 - Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi: 65 000 - Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej: 1 876 580,24	11 462 158,33 Źródło: RPO WSL Środki własne Szpitala PFRON Dotacja WSL

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Budżet
	poprzedni tytuł: Czym zaskoczyć świadczeniobiorcę, czyli niestandardowo w Poradniach Specjalistycznych Przychodniach, Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Pracowniach diagnostycznych i zabiegowych WSzZ Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju		d) Działalność edukacyjną i profilaktyczną z różnych dziedzin, między innymi profilaktyka chorób przewlekłych, wykorzystanie działalności poradni dietetycznej, nowoczesne materiały edukacyjne a w nich treści dotyczące np. zapobieganie odleżynom, właściwego odżywiania. e) uruchomienie nowatorskich metod leczenia ran przewlekłych w Poradni Chirurgii Ogólnej, na bazie współpracy ze Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, f) objęcie mieszkańców koordynowaną opieką kardiologiczną, rehabilitacyjną i ortopedyczną, g) uruchomienie jedynej w Mieście Poradni Neonatologicznej.				
53.	Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt obejmował: Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenia Roboty budowlane	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany 29.01.2018 – 2020	- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu: 1. - Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi: 1990 - Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej: 654 725,47	9 376 594,03 Źródło: UE Środki własne Szpitala

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Budżet
	diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu poprzedni tytuł: Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Oddział Neurochirurgii, Zakład Diagnostyki Obrazowej – usługi ponadstandardowe jako wzmocnienie świadczeń realizowanych w ramach umowy z NFZ						
55.	Termomodernizacja wraz z zabudową instalacji solarnej budynku przychodni zdrowia „ORTHOGON” w Jastrzębiu-Zdroju	„ORTHOGON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Projekt zakładał kompleksową termomodernizację budynku przychodni zdrowia, w ramach której zostały wykonane następujące prace: ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja c.w.u. i montaż kolektorów słonecznych, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo przewiduje się modernizację oświetlenia wewnętrznego	PO-I) przestrzenna	Projekt zrealizowany: 2019 – 2021	- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 199,01 CO₂, -Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. 15 szt. -Stopień redukcji ilości pyłu PM10 (t/rok) 0,02771 tony/rok, - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 20.582 MWh/rok, - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1461.8 GJ/rok	1 367 377,36 Źródło: UE Środki własne „ORTHOGON”

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Budżet
			budynku poprzez wymianę opraw ze świetlówkami liniowymi oraz żarówek na źródła światła w technologii LED. Łącznie do wymiany przewidziano 278 opraw			- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu 1512 GJ/rok	
58	58.a Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży górniczo - wiertniczej Poprzedni tytuł: Nowe szanse integracji i rozwoju społeczno-zawodowego	JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju	Ad.58. a. Projekt obejmował opracowanie dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 7 zawodów szkolnictwa branżowego (branża górniczo- wiertnicza), dla których określone zostały efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z programami ich nauczania we współpracy z trzema pracodawcami.	PO-II) gospodarcza PO-III) społeczna	Projekt zrealizowany: 2020 – 2021	- Liczba zawodów, w których osoby kształcące się w zawodach lub osoby dorosłe posiadające kwalifikacje zawodowe będą mogły uzyskać dodatkowe umiejętności zawodowe opracowane w ramach Programu: 7 -Liczba programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów opracowanych we współpracy z pracodawcami: 19	Ad.58.a. 783 750,00 Źródło: UE
60	60.a. Sektorowa Rama Kwalifikacji w Górnictwie poprzedni tytuł: Nowe szanse rozwoju w JSWSiG	JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju	Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla Górnictwa w Polsce	PO-II) gospodarcza PO-III) społeczna	Ad.60.a. Projekt zrealizowany: 2020r	Ad.60.a. Dostarczenie ostatecznego produktu (raportu końcowego oraz prezentacji multimedialnej): 1	Ad.60.a. 600 000,00 Źródło: UE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Podsumowanie:

W okresie **od kwietnia 2019 r. do maja 2021** (drugi okres sprawozdawczy) zrealizowano w pełni **15 projektów**, co stanowi **23%** wszystkich projektów listy głównej na łączną wartość **53 183 139,67 zł**.

Przedmiotowe projekty ukierunkowane były na:

1. Aktywizację zawodową osób zmniejszających obszar rewitalizacji. W szczególności dotyczyła ona:
 - Organizacji praktyk i zatrudnienia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych w wieku 30+.
 - Udzielania wsparcia finansowego na zakładanie własnej działalności gospodarczej dla osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
 - Opracowanie programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla branży górniczo-wiertniczej.
 - Rozwijania kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy uczniów szkoły zawodowej.

W ramach podjętych działań wsparciem objęto:

- liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach: 222 osoby,
 - liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem: 17 osób,
 - liczba osób pracujących po uzyskaniu wsparcia: 120 osób.
2. Aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu. W ramach prowadzonych działań wybudowano siłownię na wolnym powietrzu z elementami do workoutu.
 3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta. Działania obejmowały:
 - Budynek Szkoły Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu Zdroju (termomodernizacja, odnawialne źródła energii),
 - Budynek przychodni zdrowia Orthogon (termomodernizacja, odnawialne źródła energii),
 - Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 (termomodernizacja, odnawialne źródła energii) wraz z rozbudową na cele PP7.

W ramach podjętych osiągnięto następujące wyniki:

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 4 124 m²,
 - Zmodernizowano lub wybudowano 16 jednostek źródeł ciepła,
 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 3 126,52 GJ/rok,
 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 66,26 MWh/rok,
 - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 31,84 MWh/rok,
 - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 60 0914,4 kWh/rok,
 - Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 3 341,02 GJ/rok,
 - Redukcji PM 10: 0,0289 tony/rok,
4. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia. Podjęte działania obejmowały:
 - Poprawę dostępności z zakresu podstawowej opieki ambulatoryjnej oraz
 - przebudowę i doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2,
 - Utworzono miejsca w Zakładach Opieki Długoterminowej z całodobową opieką dla osób niesamodzielne w zastępstwie opiekunów faktycznych.

W ramach podjętych osiągnięto następujące wyniki:

- dostosowano 1 obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- do ulepszonych świadczeń zdrowotnych uzyskało dostęp 66,99 tys. Osób.

5. Dodatkowo też w ramach pojedynczych projektów:
- Zorganizowany zostały warsztaty międzypokoleniowe podczas 8 spotkań, w których wzięło udział 150 osób.
 - Wykonano projekt sektorowych ram kwalifikacji dla Górnictwa w Polsce.

Tabela 3 Projekty w trakcie realizacji, stan na maj 2021 r.

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
1.	O krok do przodu Wsparcie dla osób z terenów rewitalizowanych	Ośrodek Pomocy Społecznej	Projekt ma na celu pobudzenie aktywności lokalnej dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. W ramach projektu kontynuowane są prace Klubu Integracji Społecznej przy ul. Wrzosowej 4-8-12 w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społeczno-zawodowej uczestników projektu. Realizowane są również: - Praca socjalna z uczestnikami projektu prowadząca do motywowania i wspomagania uczestników do osiągnięcia możliwie pełnej aktywności zawodowej, - Zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym treningi, warsztaty, szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, - Organizacja grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, - Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla rodzin z grup wsparcia, - Praca asystenta dla osób niepełnosprawnych i opiekunów w	PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 01.01.2018 – 2021 Dalsze planowane działania: kontynuacja pracy klubu Integracji Społecznej dla uczestników projektu, kontynuacja funkcjonowania mieszkania chronionego przy ul. Szarych Szeregów oraz praca asystenta i opiekunów osób niepełnosprawnych	Osiągnięte wskaźniki stan na marzec 2019: - Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym: 19 - Liczba osób z niepełnosprawnościami: 23 Osiągnięte wskaźniki stan na I półrocze 2021: - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu: 53 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 51 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z	2 049 826,91 Źródło: UE Środki własne OPS	Przesunięty do realizacji do 31.10.2021 r. w związku z COVID-19 i czasowym zwieszeniem zajęć w KIS, mieszkaniu chronionym, terapii uzależnień.

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
			mieszkańcom chronionym dla osób niepełnosprawnych, - Prowadzenie terapii uzależnień w noclegowni dla bezdomnych, - Praca asystenta usamodzielniania w mieszkaniach chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.			pracującymi na własny rachunek): 29 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 207 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 43		
3.	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt polegał na realizacji usług i instrumentów rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2015 poz. 149 z późn. zm.) na rzecz 72 bezrobotnych mieszkańców obszaru wsparcia. Realizowane są i będą: - pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe prowadzone w oparciu o przygotowany dla każdego uczestnika indywidualny Plan Działania, - szkolenia zawodowe dla 18 uczestników projektu, - staże dla 18 uczestników projektu, - prace interwencyjne dla 12 uczestników projektu. - refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 12	PO II) gospodarcza PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 01.01.15 - 31.12.2022	Osiągnięte wskaźniki: Osiągnięte wskaźniki stan na marzec 2019: - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 482 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 256 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 38	9 561 544,70	Projekt jest cały czas w realizacji zgodnie z harmonogramem Źródło: UE BP

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
			uczestników projektu, - środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 12 uczestników projektu.			- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 24 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 153 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 365 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 274 - Odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: 53,94% Osiągnięte wskaźniki stan na I półrocze 2021: - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 218 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 89		

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
						- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 15 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 0 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 141 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 191 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 0 - Odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: 89%		
6.	Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt polega na realizacji usług i instrumentów rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 poz. 149 z późn. zm.) na	PO II) gospodarcza PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 01.01.15	Osiągnięte wskaźniki: Osiągnięte wskaźniki stan na marzec 2019:	13 796 656,35	Projekt jest cały czas w realizacji zgodnie z

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
	pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój		rzecz 213 osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych). Realizowane są i będą: a) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe prowadzone w oparciu o przygotowany dla każdego uczestnika indywidualny Plan Działania, b) staże dla 183 uczestników projektu, c) dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla 30 uczestników projektu.		– 31.12.2022	- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 419 - Liczba osób objętych wsparciem: 1114 - Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 26 - Odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: 49,5% - Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: 47% - Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: 47% - Odsetek uczestników niekwalifikujących się do żadnej z grup, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy od		harmonogram

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
						zakończenia udziału w projekcie: 55,5% - liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci staży: 866 - liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci dotacji: 144 - liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci doposażenia stanowiska pracy: 56 - liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie osoby bezrobotnej: 63 - liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci prac interwencyjnych: 25 - liczba osób znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami lub osoby długotrwale bezrobotne lub/i osoby o niskich kwalifikacjach: 87 - Odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 56%		

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
						Osiągnięte wskaźniki stan na I półrocze 2021: - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 94 - Liczba osób objętych wsparciem: 396 - Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 5 - Odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą prace w okresie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: 0 - Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: 0 - Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą prace w okresie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: 0 - Odsetek uczestników niekwalifikujących się do żadnej z grup, którzy		

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
						podejmą pracę w okresie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie: 48% - liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci staży: 181 - liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci dotacji: 63 - liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci doposażenia stanowiska pracy: 34 - liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie osoby bezrobotnej: 18 - liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci prac interwencyjnych: 0 - liczba osób znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami lub osoby długotrwale bezrobotne lub/i osoby o niskich kwalifikacjach: 259 - Odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w		

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
						którym zakończyli udział w projekcie: 51,5%		
22	Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 na potrzeby mieszkaniowe i społeczne Poprzedni tytuł: Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu (Miejski Zarząd Nieruchomości)	Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój	Projekt polegał na adaptacji budynku (roboty budowlane i instalacyjne) 15 lokali tymczasowych oraz 4 lokali mieszkalnych na potrzeby osób niepełnosprawnych.	PO I) przestrzenna, PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji 2018 - 2021	- Liczba wybudowanych/przebudowanych /wyremontowanych/objętych innym robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1	2 679 518,67 Źródło: MZN	
32	Krok w przód Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju poprzedni tytuł:	SWIG Delta Partner PARTNER Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Zadania w projekcie oparte są na aktywizacji zawodowej poprzez wykorzystanie instrumentów i usług rynku pracy: - służących indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej; - skierowanych do osób, u których zidentyfikowano potrzebę zdobycia /uzupełnienia umiejętności i kompetencji;	PO-III) społeczna PO-I) przestrzenna	Projekt w trakcie realizacji 01.07.2018 – 2021	- Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej 7 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 56 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,	1 448 729.00 Źródło: UE BP	

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
	Promocja samozatrudnienia na obszarze rewitalizowanym w ramach działania 7.3.2		- służących zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących teren objęty rewitalizacją, dla których ustalono I lub II profil pomocy, będących powyżej 30 r. życia oraz należących do co najmniej jednej z grup: - os. powyżej 50 r. życia; - kobiety; - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne; - osoby o niskich kwalifikacjach. Realizowane są: - pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego prowadzonych w oparciu o przygotowany dla każdego Indywidualny Plan Działania. - szkoleń dla uczestników; - staży/przygotowanie zawodowe; - prac interdyscyplinarnych.			uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje pracujących (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek): 22		
35.	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój PARTNERZY SRiWR Olza Euroregion Śląsk Cieszyński	W ramach projektu zostanie podjęty szereg działań mający na celu stworzeniu trwałego i atrakcyjnego produktu turystycznego, dzięki któremu dojdzie do rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim. Do głównych działań projektu należy:	PO-II) gospodarcza PO-III) społeczna PO-I) przestrzenna	Projekt w trakcie realizacji: 01.01.2017 – 30.09.2023	Osiągnięte wskaźniki na dzień 26.03.2019: - Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: 0 - Liczba elementów infrastruktury	16 499 515,17 Źródło: UE BM	Projekt w zgodzie z harmonogramem jest w trakcie realizacji

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
		Dolní oblast Vitkovice Moravian-Silesian Tourism	1. Stworzenie trwałych narzędzi transferu know-how w zakresie rewitalizacji i adaptacji postindustrialnych obiektów na cele społeczno-kulturowe z DOV na stronę polską, 2. Powstanie Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego, w ramach którego powstanie ekspozycja pokazująca historię rozwoju przemysłu wydobywczego, kultury górniczej, urbanistycznego rozwoju Górnego Śląska, który jest komplementarnym i spójnym nawiązaniem do ekspozycji w Dolnym Obszarze Vitkovice, 3. Stworzenie nowej ekspozycji w budynku nr 6 w Dolnym Obszarze Vitkovice w Ostrawie dotyczącej historii i dziedzictwa przemysłu metalurgicznego nawiązującej do wspólnego kontekstu społeczno-kulturowego regionu, 4. Stworzenie transgranicznej trasy turystycznej Węgla i Stali łączącej przez granicę wybrane obiekty postindustrialne śląskiej Trasy Zabytków Techniki (PL) i morawsko-śląskiej Technotraszy (CZ). 5. W oparciu o transgraniczny szlak stworzenie systemu obsługi turystów z drugiej strony. DOV i Jastrzębie będą stanowiły centrum obsługi i			udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: 0 - wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin: 100% Osiągnięte wskaźniki stan na I półrocze 2021: Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: 1 - Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: 0,750 - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 10 000,00		

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
			informacji turystów (hub) dla całego transgranicznego szlaku.					
43.	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt swoim zakresem obejmuje m.in.: 1.Roboty Termomodernizacyjne: 2.Roboty instalacyjne – instalacja ogniw fotowoltaicznych 3.Roboty instalacyjne – sanitarne 4. Montaż klimatyzacji sal lekcyjnych 0,+1 oraz +2 zlokalizowanych od południowej strony budynku dydaktycznego.	PO-I) przestrzenna	Projekt w trakcie realizacji: 06.06.2017 – 31.08.2022	Osiągnięte wskaźniki na dzień 03.04.2019: - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej: 1 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 0,040 Mwe - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 30,53 Mwhe/rok - Redukcja PM10: 24,79 Osiągnięte wskaźniki stan na I półrocze 2021: - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]: 4807,48 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [sz: 2.0]	8 434 741,63	Źródło: UE BP BM Zgodnie z harmonogramem projekt jest w trakcie realizacji

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
						- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]: 3151,19 - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [kWh/rok]: 1 410 673,8 - Stopień redukcji PM 10 (obligatoryjny) [tony/rok]: 24,9071 - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok]: 3 261,79 - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]: 30.681		

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
45	Rewitalizacja zabytkowego budynku Willi Antonina przy ulicy Zdrojowej w Jastrzębiu-Zdroju	ARCHiTEKT studio projektowe	Projekt obejmuje wzmocnienie funkcji społecznej polegającej na stworzeniu w zrewitalizowanym obiekcie centrum edukacyjno - naukowego promującego nowoczesne, ekologiczne technologie w budownictwie oraz funkcji/walorów architektonicznych budynku. Zakłada się rewitalizację budynku przez odtworzenie walorów, detali architektonicznych z okresu świetności obiektu, zastosowanie pierwotnych materiałów wykończeniowych i wprowadzenie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań stosowanych w budownictwie, np. odnawialne źródła energii.	PO I) przestrzenna PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 2020 - 2023	Wskaźniki nie zostały zrealizowane na moment sporządzenia projektu	2 265 045,00 zł	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
48.	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym Poprzedni tytuł: Zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne obiektu „Łazienki III” w Jastrzębiu-Zdroju	Miejski Ośrodek Kultury	Projekt zakłada dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację istniejącego obiektu Łazienki III mieszczącego się w obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdrój do pełnienia funkcji kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Budynek obecnie jest nieużytkowany. W wyniku realizacji projektu w obrębie budynku utworzone zostaną: - w piwnicy pomieszczenia: techniczne, gospodarcze i	PO I) przestrzenna PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji 21.07.2017 r. – 12.2021 r.	Projekt w trakcie realizacji. Brak osiągniętego wskaźnika	15 287 729,68 Źródło: UE BP Własne JST	Zgodnie z harmonogramem projekt jest w trakcie realizacji

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
			warsztatowe oraz archiwa i ciemnia. - na parterze: pomieszczenia sali wystawienniczej mieszczącej do 50 osób, zaplecza technicznego, pomieszczeń biurowych i wc. - na piętrze znajdować się będą pomieszczenia biurowe, pracownie, poczekalnic z punktem informacji, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia wc. Projektowany obiekt zostanie dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. W zmodernizowanym zabytkowym obiekcie świadczona będzie nowa oferta kulturowa. W ramach projektu przewidziano również prace związane z zagospodarowaniem terenu.					
59	Górnicza Aktywizacja Zawodowa - GAZ Poprzedni tytuł: Nowe szanse prowadzenia działalności gospodarczej	JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju	W ramach projektu zostaną podjęte m.in. działania w zakresie: dopasowania m.in. indywidualnego wsparcia doradczo-szkoleniowego wynikającego z planowanego przedsięwzięcia gospodarczego w ramach działalności gospodarczej; wsparcie finansowe i organizacyjne w ramach bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej	PO-II) gospodarcza PO-III) społeczna	Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.	Projekt w trakcie realizacji. Brak osiągniętego wskaźnika	269 5134,89 Źródło: UE BP	Zgodnie z harmonogramem projekt jest w trakcie realizacji

Nr projektu LP R	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
60	60.b. Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (SENSE VR) Poprzedni tytuł: Nowe szanse rozwoju w JSWSiG	JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt obejmuje opracowanie Algorytmu Wykrywania Zachowań (AWZ) użytkownika sieciowej aplikacji VR, opracowanie metody tworzenie scenariuszy szkoleniowych dla szkoleń realizowanych z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości oraz opracowanie metody przeprowadzania szkoleń z wykorzystaniem rozgałęzionych scenariuszy w adaptacyjnym środowisku VR.	PO-II) gospodarcza PO-III) społeczna	Projekt jest w trakcie realizacji	Projekt w trakcie realizacji. Brak osiągniętego wskaźnika	3 239 990,72 zł Źródło: UE własne	Zgodnie z harmonogramem projekt jest w trakcie realizacji
61	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów	Miasto Jastrzębie-Zdrój	Projekt polega na stworzeniu miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju. W tym celu, zostaną poddane kompleksowemu remontowi plac główny i plac reprezentacyjny Parku wraz z Muszlą Koncertową oraz przyległymi alejkami, małą architekturą i częścią promenady głównej.	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 2019-2022	Projekt w trakcie realizacji. Brak osiągniętego wskaźnika	10 403 908,04 zł Źródło: UE BP Własne JST	Zgodnie z harmonogramem projekt jest w trakcie realizacji
63	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.	Miasto Jastrzębie-Zdrój	W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Jastrzębia-Zdrój. Dzięki ograniczeniu zapotrzebowania	PO-I) przestrzenna	Projekt w trakcie realizacji: 2020-2023	Projekt w trakcie realizacji. Brak osiągniętego wskaźnika	7 386 503,62 zł Źródło: UE	Zgodnie z harmonogramem projekt jest w trakcie realizacji

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet	Przyczyna niezrealizowania projektu
			budynku na ciepło, obniżone zostaną także wskaźniki emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.				BP Własne JST	
64	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta.	Miasto Jastrzębie-Zdrój	W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Jastrzębia-Zdrój. Dzięki ograniczeniu zapotrzebowania budynku na ciepło, obniżone zostaną także wskaźniki emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Przede wszystkim jednak, dzięki realizacji projektu powstanie w pełni funkcjonalny budynek, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniający wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne, który zagospodarowany zostanie na cele związane z aktywizacją społeczno-gospodarczą miasta.	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 2020-2023	Projekt w trakcie realizacji. Brak osiągniętego wskaźnika	5 404 789,31 zł Źródło: UE BO Własne JST	Zgodnie z harmonogramem projekt jest w trakcie realizacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Podsumowanie:

Na moment sporządzenia raportu w **trakcie realizacji** było **14 projektów, co stanowiło 22%** wszystkich projektów z listy głównej. Zaawansowanie finansowe według złożonych kart wynosi obecnie około **53,3 mln zł**.

1. Projekty z tej grupy dotyczyły następujących obszarów rewitalizacji:
 - Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz rozwoju rynku pracy. W szczególności:
 - o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz osób młodych zamieszkujących obszar rewitalizacji.
 - o tworzenie nowych szans na zatrudnienie osób, które utraciły lub w najbliższym czasie utracą zatrudnienie JSW oraz poprawy warunków pracy w tym przedsiębiorstwie.
 - Aktywizacji mieszkańców z obszaru rewitalizacji:
 - o poprzez działania skierowane dla osób niepełnosprawnych wspierające je w integracji społecznej,
 - o poprzez rozwój oferty turystycznej, która będzie zachęcała do aktywnego korzystania z walorów obszaru rewitalizowanego.
2. Działania infrastrukturalne dotyczące takich obszarów rewitalizacji jak:
 - Rewitalizacji obiektów zabytkowych w Parku Zdrojowym,
 - Poprawy efektywności energetycznej obiektów publicznych,
 - Adaptacji budynku na potrzeby społeczne dla osób objętych pomocą społeczną.

W związku z tym, że projektu te są obecnie w fazie realizacji nie wykazano dla nich zrealizowanych wskaźników.

Tabela 4 Projekty planowane do realizacji

Nr projektu u LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Sfera	Termin realizacji projektu
19.	Stworzenie miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju	PO II) gospodarcza PO III) społeczna	Realizację projektu przesunięto na lata 2021-2022. Projekt uległ przemodelowaniu ze względu na zmianę pierwotnego charakteru powiązanego z nim projektu infrastrukturalnego.
62	Rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1Maja	Miasto Jastrzębie-Zdrój	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Projekt planowany do realizacji: 2022-2023. Nie osiągnięto jeszcze założonych wskaźników
33	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu- Zdroju	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju	PO II) gospodarcza PO III) społeczna	Projekt planowany do realizacji w okresie późniejszym: 2022-2023. Nie osiągnięto jeszcze założonych wskaźników

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Podsumowanie:

Do realizacji planowane są **trzy projektu**, które stanowią **5%** wszystkich projektów przewidzianych do realizacji w ramach głównej listy Planu Rewitalizacji.

Tabela 5 Projekty, których realizacja jest zawieszona.

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu
12.	Jastrzębie-Zdrój -- Dom Solidarności - studium wykonalności wraz z elementami koncepcji architektonicznej (Miasto Jastrzębie-Zdrój)	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Idea stworzenia przestrzeni, na której skupiać się będzie kultura, szeroko pojęta rekreacja, edukacja, a także etapy historii miasta dające ogromny potencjał, pozwala na upowszechnienie i zbudowanie niepowtarzalnej marki tego miejsca, a co za tym idzie skupienia wokół spuścizny, jaką prezentować ma Dom Solidarności szerszego grona mieszkańców, turystów, instytucji i organizacji.	PO I) przestrzenna PO III) społeczna	Projekt na etapie poszukiwania źródeł finansowania.
16	Rewitalizacja budynku na potrzeby utworzenia miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych	Miasto Jastrzębie-Zdrój	Projekt będzie polegał na dostosowaniu i rozbudowie istniejącego obiektu znajdującego się na obszarze rewitalizacji na potrzeby stworzenia miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców terenu rewitalizacji, w który zlokalizują się: - Centrum Aktywności Młodzieżowej, - Centrum Wolontariatu - Centrum Seniora i Klub Seniora - TARGOWISKO UMIEJĘTNOŚCI - Młodzieżowy Punkt Informacyjny / Centrum Młodzieżowe, - Klub prasowe, - Centrum Organizacji Pozarządowych, - Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej dla mieszkańców miasta	PO I) przestrzenna PO III) społeczna	Projekt nie został zrealizowany w pierwotnej wersji z uwagi zmiany w konkursie dotyczącym rewitalizacji. Projekt na etapie poszukiwania źródeł finansowania.

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu
44	Rewitalizacja terenów zbiorników przy ulicy Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Rezultatem projektu będzie atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń publiczna zapewniająca możliwość realizowania rekreacji kwalifikowanej (pływanie kajakami, łodziami, opalanie się, wędkowanie) oraz wypoczynku poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Projekt na etapie poszukiwania źródeł finansowania
46	Nowe funkcje produkcyjne i zawodowe w CLP-B	Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.	Rewitalizacja terenu i budynku zdekapitalizowanego, przemysłowego KWK „Zofiówka” w celu prowadzenia nowych funkcji proedukacyjnych i zawodowych w CLP-B	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Wnioskodawca zrezygnował realizacji projektu
49	Ratując jedno życie ratuję świat. Miejsce działań ratunkowych - Izba Przyjęć WSzS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Celem projektu jest osiągnięcie znacznego wzrostu świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa oraz nabycie bezcennych umiejętności ratowania życia drugiemu człowiekowi.	PO III) społeczna	Projekt nie uzyskał dofinansowania. Znajduje się na liście rezerwowej. Czynione są działania w celu uzyskania innego dofinansowania
50	Usługi społeczne i zdrowotne dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej wraz ze wsparciem dla ich rodzin	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju	W wyniku realizacja projektu powstanie: •Ośrodek opieki całodobowej - 10 łóżek •Zespół wsparcia środowiskowego – objęcie opieką ok. 150 osób/rocznie •Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego.	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Projekt nie uzyskał dofinansowania. Wnioskodawca zrezygnował z realizacji projektu.
51	Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym – daj sobie szansę	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Dzięki realizacji projektu powstanie: dobrze zaplanowana i przeprowadzona kampania na rzecz walki z chorobami cywilizacyjnym, materiały edukacyjne, poradnia leczenia ran przewlekłych.	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Czynione są działania w celu uzyskania innego dofinansowania

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu
54.	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju poprzedni tytuł: Dotrzymaj im kroku, czyli Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla Matki i Dziecka dla Rodziny	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	W wyniku realizacji projektu zostanie rozszerzona baza gabinetów zabiegowych. Celem projektu jest stworzenie warunków lokalowo-technicznych do uruchomienia nowych, komfortowych dla matek i dzieci oraz pozostałych pacjentów rozwiązań diagnostycznych. Zakres projektu został zdefiniowany w oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczne.	PO III) społeczna	Projekt nie uzyskał dofinansowania. Znajduje się na liście rezerwowej. Czynione są działania w celu uzyskania innego dofinansowania

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu
56	Podniesienie efektywności energetycznej obiektu Szpitala przy ul. Krasickiego 21	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt zakłada wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian i stropów, wymiana instalacji c.o., wykonanie instalacji fotowoltaicznej, oświetlenia, zabudowa pompy ciepła oraz układu kogeneracji.	PO I) przestrzenna	Projekt nie uzyskał dofinansowania. Zrezygnowano z realizacji tego projektu.
57	Rewitalizacja wraz z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt obejmuje przebudowę budynku Szpitala przy ul. Krasickiego 21 wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. W zakres przebudowy wchodzi roboty ogólnobudowlane w budynku: roboty budowlane, instalacyjne centralnego ogrzewania, wentylacji, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne, nadzór autorski, inwestorski, dokumentacja projektowa. Planowana powierzchnia użytkowa budynków do rewitalizacji: ok. 2500 m² Zakres zagospodarowania otoczenia obejmuje rewitalizację przyległych do budynku terenów zielonych z przeznaczeniem na miejsce rekreacji, ok. 2 ha	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Projekt nie uzyskał dofinansowania. Wnioskodawca zrezygnował z realizacji projektu.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR.

Podsumowanie:

Na moment sporządzenia raportu (maj 2021 r.) projekty zrealizowane - 22 (2016-2019), 15 projektów (lata 2019-2021), co daje razem 37 projektów zrealizowanych. Stanowi to łącznie 58% wszystkich projektów, które znajdują się na liście głównej.

Na poniższym wykresie zaprezentowany został stan realizacji projektów objętych Programem Rewitalizacji.

Wykres 1: Stan realizacji projektów podstawowych

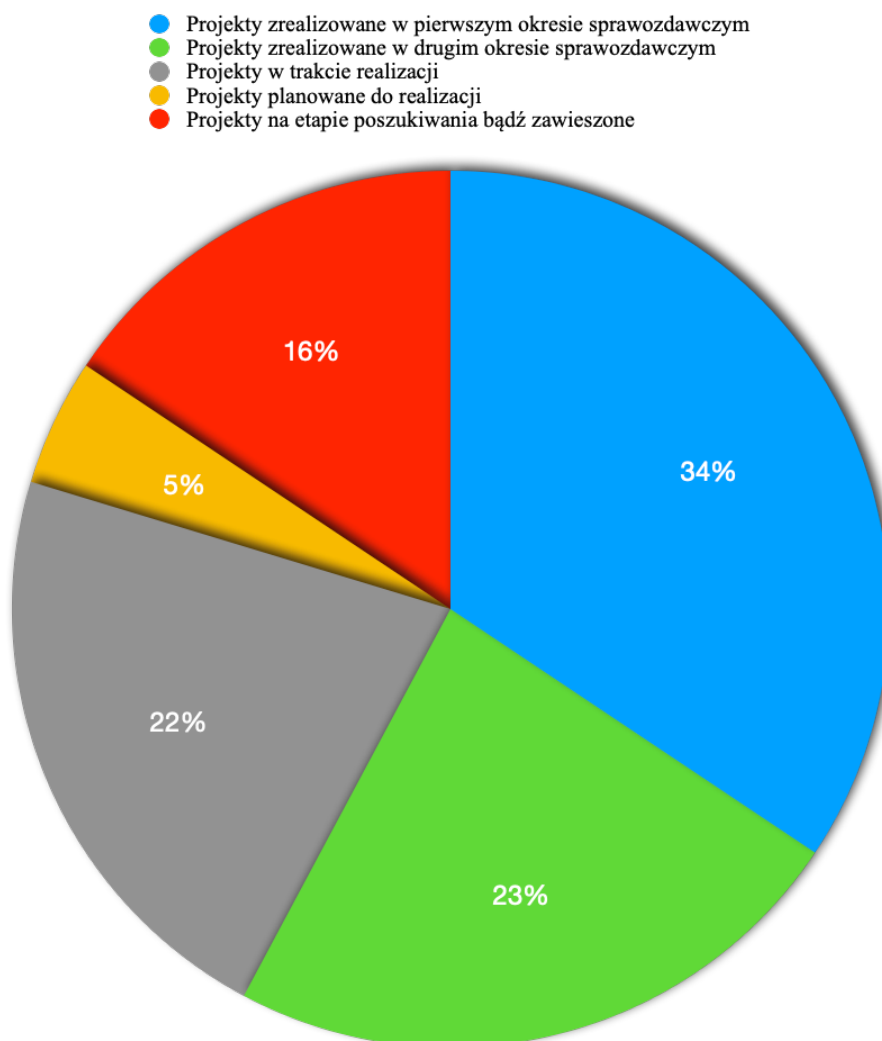

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Zgodnie z powyższą wizualizacją:

- 37 projektów zostało zrealizowanych i zakończonych w całym okresie wdrażania LPR,
- 14 jest w trakcie realizacji,
- 3 są planowane do zrealizowania w przyszłości,
- 6 projektów na etapie poszukiwania źródeł finansowania
- 4 projekty nie zostaną zrealizowane, projekty niezależne do miasta.

4. ANALIZA FINANSOWYCH ZAŁOŻEŃ Z REALIZACJI PROJEKTÓW

W tabelach poniżej zestawiono wartościowo projekty włączone do Programu Rewitalizacji oraz wskazano źródła, z których zaplanowano ich realizację.

Projekty, których realizacja jeszcze się nie rozpoczęła (oraz te, które nie będą realizowane) nie zostały ujęte w niniejszej tabeli. Natomiast (w niektórych przypadkach) wartość poszczególnych projektów będących obecnie w trakcie realizacji została wskazana na podstawie kwot wskazanych w LPR. W zakresie pozostałych (zrealizowanych już) projektów szczegółowe informacje umieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 6: Finansowa realizacji poszczególnych projektów programu rewitalizacji

Lp	Nazwa projektu	Okres realizacji	Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
1	O krok do przodu Wsparcie dla osób z terenów rewitalizowanych	Projekt w trakcie realizacji: 01.01.2018 – 2021	2 049 826,91 z ł	1 796 206,39 z ł		253 620,52 zł		2 049 826,91 z ł
2	Wakacyjna Akademia poprzedni tytuł: Akademia seniora – organizowanie wspólnych warsztatów na rzecz zdobywanej umiejętności i uczenia przez całe życie	Projekt zrealizowany 03.07.2017 - 30.08.2018	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
3	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Projekt w trakcie realizacji: 01.01.15 - 31.12.2022	9 561 544,70 z ł	8 127 313,00 z ł	1 434 231,70 zł			9 561 544,70 z ł
4	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ na obszarze rewitalizowanym	Projekt Zrealizowany 01.03.2019 – 28.02.2021	254 616,25 zł	216 423,81 zł	25 461,63 zł		12 730,81 zł	254 616,25 zł
5	Zmiana nazwy projektu 5.a - Praktyka i Praca - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ 5.b. - Bliżej pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ Poprzedni tytuł: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w ramach działania 7.1.2 (Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju)	5.a - projekt zrealizowany 5.b. projekt zrealizowany	1 551 233,75 z ł	1 318 548,69 z ł	155 123,38 zł		77 561,68 zł	1 551 233,75 z ł

Lp	Nazwa projektu	Okres realizacji	Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
6	Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój	Projekt w trakcie realizacji: 01.01.15 – 31.12.2022	13 796 656,35 zł	11 727 157,90 zł	2 069 498,45 zł			13 796 656,35 zł
7	Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych (JCOP) poprzedni tytuł: Centrum wolontariatu i organizacji pozarządowych	Projekt zrealizowany 01.01.2017 - 01.12.2018	126 451,76 zł	0,00 zł	121 451,76 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	126 451,76 zł
8	Festiwal organizacji pozarządowych – Forum Ekonomii Społecznej	Projekt zrealizowany 01.01.2017 - 01.12.2018	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
9	Festiwal Sztuk Wszelkich Zderzenia Działań Wrażliwych	Projekt zrealizowany 09.10.2017 - 22.10.2017	57 850,61 zł	42 000,00 zł	0,00 zł	15 850,41 zł	0,00 zł	81 250,61 zł
		22.10.2018 - 26.10.2018	23 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 400,00 zł	0,00 zł	
10	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	Projekt zrealizowany 04.06.2017	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł
11	Jarmark Sztuki Wiosna Ludów	Projekt zrealizowany 6-8.05.2016	11 987,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 987,60 zł	11 987,60 zł
12	Jastrzębskie Lato Muzyczne	Projekt zrealizowany 09.07.2017 - 20.08.2017	50 952,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 952,35 zł	0,00 zł	50 952,35 zł

Lp	Nazwa projektu	Okres realizacji	Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
13	Transgraniczne zaczytanie poprzedni tytuł: Językowa akademie kultury pogranicza – wsparcie inicjatyw kulturalno-edukacyjnych	Projekt zrealizowany 28.08.2017 - 31.08.2018	75 931,55 zł	64 541,82 zł	7 593,15 zł	3 796,58 zł	0,00 zł	75 931,55 zł
14	Letnie Kino Parkowe	Projekt zrealizowany 03.07.2017 - 28.08.2017	3 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 075,00 zł	0,00 zł	3 075,00 zł
15	Muzyczne Środy	Projekt zrealizowany 05.07.2017 - 30.08.2017	29 983,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 983,98 zł	0,00 zł	29 983,98 zł
16	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	Projekt zrealizowany 01.04.2016 - 31.07.2018	132 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	132 950,00 zł	0,00 zł	132 950,00 zł
17	Piknik w kurorcie	Projekt zrealizowany 21.05.2017 - 09.06.2017	50 793,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 793,93 zł	0,00 zł	50 793,93 zł
18	Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 na potrzeby mieszkaniowe i społeczne Poprzedni tytuł: Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu (Miejski Zarząd Nieruchomości)	Projekt zrealizowany 2018-2021	2 679 518,67 z ł			2 679 518,67 z ł		2 679 518,67 z ł
19	Krok w przód	Projekt w trakcie realizacji 01.07.2018–2021	1 448 729,00 z ł	1 231 419,65 z ł	130 607,35 zł	86 702,00 zł		1 448 729,00 z ł

Lp	Nazwa projektu	Okres realizacji	Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
	Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju							
20	Wsparcie w starcie poprzedni tytuł: Promocja samozatrudnienia na obszarze rewitalizowanym w ramach działania 7.3.2	Projekt zrealizowany: 01.06.2018 - 31.07.2019	275 895,70 zł	234 511,35 zł		41 384,35 zł		275 895,70 zł
21	Ćwiczenie nie zna granic poprzedni tytuł: Siłownia na wolnym powietrzu	Projekt zrealizowany 02.07.2018 - 0.06.2019	118 691,62 zł	82 785,53 zł	4 869,74 zł	31 036,35 zł		118 691,62 zł
22	Wakacyjne warsztaty międzypokoleniowe Poprzedni tytuł: Słowo i obraz w przestrzeni międzypokoleniowej -- zajęcia o obszarze kultury i sztuki angażujące różne pokolenia (Miejska Biblioteka Publiczna, Jastrzębie-Zdrój)	Projekt zrealizowany 01.07.2019 – 29.08.2019	4 060,00 zł				4 060,00 zł	4 060,00 zł
23	Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Gwarków	Projekt zrealizowany: 2018	6 997,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 997,56 zł	0,00 zł	6 997,56 zł
24	Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Zofiówka	Projekt zrealizowany: 2018	6 967,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 967,00 zł	0,00 zł	6 967,00 zł
25	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla 1000-lecia	Projekt zrealizowany: 2018	6 998,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 998,74 zł	0,00 zł	6 998,74 zł
26	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne	Projekt zrealizowany: 2018						

Lp	Nazwa projektu	Okres realizacji	Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
27	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Przyjaźń	Projekt zrealizowany: 2018	6 982,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 982,83 zł	0,00 zł	6 982,83 zł
28	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Zdrój	Projekt zrealizowany: 2018	2 299,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 299,11 zł	0,00 zł	2 299,11 zł
29	38.a. Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic ZSZ w Jastrzębiu Zdroju 38.b. Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w ZS 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu Zdroju poprzedni tytuł: Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego	Ad.38.a. Projekt zrealizowany: 2019-2021 Ad.38.b. Projekt zrealizowany: 2019-2021	314 151,25 zł	246 321,00 zł		5 000,00 zł		251 321,00 zł
30	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt zrealizowany: 01.09.2018 - 31.08.2021	1 918 953,60 zł	1 613 581,08 zł	188 801,92 zł	95 947,68 zł		1 898 330,68 zł
31	Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju	Projekt zrealizowany 21.07.2017 – 30.10.2018	158 268,04 zł	134 527,83 zł	0,00 zł	23 740,21 zł	0,00 zł	158 268,04 zł
32	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	Projekt w trakcie realizacji: 01.01.2017 – 30.09.2023	16 499 515,17 zł	8 570 166,80 zł		765 466,78 zł		9 335 633,58 zł

Lp	Nazwa projektu	Okres realizacji	Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
33	Żelazny szlak rowerowy	Projekt zrealizowany 01.01.2017 - 30.11.2021	1 234,781,74	590 598,20 zł	0,00 zł	644 183,54 zł	0,00 zł	1 234 781,74 zł
34	V polsko-czeskie spotkania branżowe	Projekt zrealizowany 2016	85 178,27 zł	75 546,14 zł	3 210,71 zł	6 421,42 zł	0,00 zł	85 178,27 zł
35	Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt zrealizowany 30.08.2018 - 29.09.2019	935 700,00 zł	795 345,00 zł	0,00 zł	140 355,00 zł	0,00 zł	935 700,00 zł
36	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju poprzedni tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 i PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt zrealizowany 23.05.2017 – 15.12.2020	13 646 755,60 zł	1 047 631,87 zł	102 240,97 zł	12 482 949,76 zł		13 632 822,60 zł
37	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu poprzedni tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt zrealizowany 23.05.2017– 21.12.2020	10 975 775,57 zł	3 005 730,34 zł	491 505,95 zł	7 478 539,28 zł		10 975 775,57 zł

Lp	Nazwa projektu	Okres realizacji	Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
38	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt w trakcie realizacji: 06.06.2017 – 31.08.2022	8 434 741,63 z ł	1 564 239,71 z ł	155 711,82 zł	1 088 715,17 z ł		2 808 666,70 z ł
39	Drugi Dom Poprzednia nazwa: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie miejsc w Zakładach Opieki Długoterminowej, w którym uzyskają krótkookresową całodobową opiekę osoby niesamodzielne w zastępstwie opiekunów faktycznych	Projekt w trakcie realizacji: 2019 - 2021	795 555,46 zł	295 597,68 zł	34 776,20 zł		5 655,09 zł	336 028,97 zł
40	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym Poprzedni tytuł: Zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne obiektu „Łazienki III” w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt w trakcie realizacji 21.07.2017 r. – 12.2021 r.	15 287 729,68 zł	3 839 627,41 z ł	451 720,88 zł	1 512 742,90 z ł		5 804 091,19 z ł
41	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju poprzedni tytuł: Czym zaskoczyć świadczeniobiorcę czyli niestandardowo w Poradniach Specjalistycznych Przyszpitalnych, Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Pracowniach diagnostycznych i zabiegowych WSzZ Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt zrealizowany 01.01.2014 – 2020	11 462 158,33 zł	9 389 391,81 z ł	122 565,35 zł		1 950 201,17 zł	11 462 158,33 zł

Lp	Nazwa projektu	Okres realizacji	Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
42	Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu poprzedni tytuł: Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Oddział Neurochirurgii, Zakład Diagnostyki Obrazowej – usługi ponadstandardowe jako wzmocnienie świadczeń realizowanych w ramach umowy z NFZ.	Projekt zrealizowany 29.01.2018– 2020	9 376 594,03 z ł	2 254 188,37 z ł			7 113 405,66 zł	9 367 594,03 z ł
43	Termomodernizacja wraz z zabudową instalacji solarnej budynku przychodni zdrowia „ORTHOGON” w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt zrealizowany: 2019– 2021	1 367 377,36 z ł	1 367 377,36 z ł			303 483,81 zł	1 670 861,17 z ł
44	58.a Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży górnictwo -wiertniczej 58.b E-ambasador Poprzedni tytuł: Nowe szanse integracji i rozwoju społeczno-zawodowego	Projekt zrealizowany: 2020– 2021	783 750,00 zł	783 750,00 zł				783 750,00 zł
45	60.a. Sektorowa Rama Kwalifikacji w Górnictwie poprzedni tytuł: Nowe szanse rozwoju w JSWSiG	Ad.60.a. Projekt zrealizowany: 2020r	600 000,00 zł	150 000,00 zł			450 000,00 zł	600 000,00 zł
46	Górnictwa Aktywizacja Zawodowa - GAZ Poprzedni tytuł:	Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2021 r.	2 695 134,89 z ł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł

Lp	Nazwa projektu	Okres realizacji	Koszt na dzień złożenia karty	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
	Nowe szanse prowadzenia działalności gospodarczej	do 31 grudnia 2022 r.						
47	60.b. Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (SENSE VR) Poprzedni tytuł: Nowe szanse rozwoju w JSWSiG	Projekt jest w trakcie realizacji	3 239 990,72 z ł				31 319,46 zł	31 319,46 zł
48	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów	Projekt w trakcie realizacji: 2019-2022	10 403 908,04 zł	3 750 324,60 z ł	441 214,68 zł	726 819,33 zł		4 918 358,61 z ł
49	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.	Projekt w trakcie realizacji: 2020-2023	7 386 503,62 z ł			11 193,00 zł		11 193,00 zł
50	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta.	Projekt w trakcie realizacji: 2020-2023	5 404 789,31 z ł	318 527,99 zł	37 473,88 zł	377 788,23 zł		733 790,10 zł
51	Rewitalizacja zabytkowego budynku Willi Antonina przy ulicy Zdrojowej w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt w trakcie realizacji: 2020 - 2023	2 265 045,00 z ł				123 000,00 zł	123 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR.

W kolejnej tabeli zawarto podsumowanie postępów finansowych.

Tabela 7: Finansowa realizacja programu rewitalizacji do maja 2021 r.

	Razem	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne
Łączna wartość środków finansowych zaplanowanych w LPR na realizację wszystkich projektów	209 131 480,00 zł	102 691 580,00 zł	2 710 000,00 zł	84 639 930,00 zł	1 845 250,00 zł
Łączna wartość środków finansowych poniesionych na realizację projektów maja 2021 r.	156 402 970,54 zł	64 633 381,33 zł	5 978 059,52 zł	28 825 171,68 zł	10 087 405,28 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR.

Ze względu na fakt, że niniejszy raport przygotowywany jest po raz drugi (poprzedni został sporządzony w 2019 r.), uwzględniono postęp realizacji, który jest aktualny na moment sporządzenia sprawozdania.

Zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji *Tabela 38 Tabela finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji* orientacyjny koszt wszystkich zgłoszonych projektów planowany był na około **209 131 480,00 zł** z czego na wkład własny (podmiotów realizujących projekt) przeznaczono około **1 845 250,00 zł**.

Pozostałe źródła finansowania pochodzić miały m.in.:

- z funduszy unijnych w kwocie **102 691 580,00 zł**,
- środków budżetu państwa w kwocie **2 710 000,00 zł**.

Na etapie tworzenia LPR wielu wnioskodawców zgłosiło potencjalne projekty do realizacji z udziałem funduszy unijnych znając tylko wstępne wytyczne w tym zakresie. Niejednokrotnie po ogłoszeniu dedykowanych konkursów w wielu przypadkach okazało się, że regulamin konkursu nie dopuszcza możliwości aplikowania o środki unijne, dlatego też wnioskodawcy niektórych zgłoszonych projektów odstąpili od ich realizacji z uwagi na brak możliwości uzyskania potencjalnego dofinansowania. Projekty realnie zaplanowane do realizacji zostały w dużej części zrealizowane bądź znajdują się w fazie realizacji.

W niektórych przypadkach część projektów nie uzyskała dofinansowania w ramach dostępnych źródeł (3 projekty), dlatego też niektórzy wnioskodawcy z braku środków własnych zrezygnowali z realizacji zadania lub też będą realizować zadanie w późniejszym terminie w ramach dostępnych środków własnych.

Analiza stopnia realizacji LPR wykazała, iż w badanym okresie zrealizowano w pełni **15 projektów** z listy projektów podstawowych (*tabela nr 36 LPR*) na łączną kwotę **53 183 139,67 zł**. Do tego należy dodać **22 projekty z poprzedniego okresu sprawozdawczego** o łącznej wartości **3 038 550,07 zł**.

Natomiast **14 projektów jest w trakcie realizacji**, na które do chwili obecnej zaplanowano ponad **53,3 mln zł**. Należy podkreślić, iż z w związku z brakiem środków finansowych w zakładanym pierwotnie terminie nie zrealizowano dotychczas 6 projektów, których celem była m.in. eliminacja problemów wskazanych w sferze społecznej i gospodarczej na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Dla tych projektów w dalszym ciągu trwa poszukiwanie źródeł finansowania. Do 4 projektów wnioskodawcy podjęli decyzję o rezygnacji z realizacji i są to projekty niezależne od miasta.

Projekty, dla których poszukiwanie są źródła finansowania:

- Jastrzębie-Zdrój -- Dom Solidarności -studium wykonalności wraz z elementami koncepcji architektonicznej (Miasto Jastrzębie-Zdrój)

- Rewitalizacja budynku na potrzeby utworzenia miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych,
- Rewitalizacja terenów zbiorników przy ulicy Wodzisławskiej w Jastrzębiu- Zdroju,
- Ratując jedno życie ratuję świat. Miejsce działań ratunkowych - Izba Przyjęć WSzS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju,
- Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym – daj sobie szansę,
- Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Projekty, dla których wnioskodawcy podjęli decyzję o rezygnacji:

- Nowe funkcje produkcyjne i zawodowe w CLP-B
- Usługi społeczne i zdrowotne dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej wraz ze wsparciem dla ich rodzin
- Podniesienie efektywności energetycznej obiektu Szpitala przy ul. Krasickiego 21
- Rewitalizacja wraz z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych

5. ANALIZA OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW MONITORINGOWYCH

PO-I) Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez kompleksowe działania o charakterze infrastrukturalno-architektonicznym [sfera przestrzenna].

Kierunek działania	Osiągnięte wskaźniki realizacji celów Programu	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
K1 - Odnowa urbanistyczna obszarów miejskich i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej, K2 -Rozbudowa i optymalizacja układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej miasta, K3 - Rewitalizacja substancji mieszkaniowej, K4 - Tworzenie rozwiązań infrastrukturalnych wspierających rozwój gospodarczy, K5 - Rewitalizacja terenów i obiektów przemysłowych, K6 - Przebudowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, K7 - Poprawa jakości i konkurencyjności infrastruktury ochrony zdrowia, K8 - Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta, K9 - Rozwiązania systemowo-infrastrukturalne dla poprawy jakości środowiska naturalnego.	Żelazny szlak rowerowy - długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych i tras rowerowych: 0,585 km Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju - Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego: 2 Ćwiczenie nie zna granic (siłownia na wolnym powietrzu) - Liczba nowopowstałych obiektów na cele sportowe oraz rekreacyjne: 1 Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju - Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego: 4 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju -Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej: 1, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 0,040 Mwe, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 30,53 Mwhe/rok, Redukcja PM10: 24,79. Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 na potrzeby mieszkaniowe i społeczne: - Liczba wybudowanych/przebudowanych /wyremontowanych/objętych innym robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 1 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju: - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt: 2	- Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - Liczba elementów infrastruktury udostępniającej /zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego - Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - Liczba nowopowstałych obiektów na cele sportowe oraz rekreacyjne - Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych i tras rowerowych - Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego - Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych, - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją, - Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

	Ćwiczenie nie zna granic: - Liczba nowopowstałych obiektów na cele sportowe oraz rekreacyjne: 1 Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic ZSZ w Jastrzębiu Zdroju. Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w ZS 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju - Liczba szkół i kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 2 - Liczba osób objętych wsparciem - instytucje objęte wsparciem: 160 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju: -Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]: 1550,83 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]: 1 Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu: - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 2573 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]: 1 Termomodernizacja wraz z zabudową instalacji solarnej budynku przychodni zdrowia „ORTHOgon” w Jastrzębiu-Zdroju: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]: 1 - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 1824	
--	--	--

	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza: - Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: 1	
PO-II) Aktywizacja ekonomiczna obszaru wsparcia dzięki podniesieniu konkurencyjności i trwałej reorganizacji struktury gospodarczej [sfera gospodarcza].		
Kierunek działania	Osiągnięte wskaźniki realizacji celów Programu	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
K10 - Aktywizacja gospodarcza mieszkańców i ułatwianie przekwalifikowania zawodowego, K11 - Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności oraz tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), K12 - Kompleksowa promocja miasta skierowana na przyciągnięcie inwestorów, K13 - Podnoszenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta, K14 - Kształtowanie systemu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 01.01.15 – 30.04.16 - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 103 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 56 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 9 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 24 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 83 01.01.16 – 31.12.16 Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 90 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 54 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 7 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 12 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 61 01.01.17 – 31.12.18 - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 246 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 124 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 17 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 43 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 188 Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój	Liczba zrealizowanych staży - Liczba zrealizowanych dotacji - Liczba zrealizowanych prac interwencyjnych - Liczba zrealizowanych doposażeń stanowiska pracy - Liczba zaplanowanych do realizacji staży - Liczba zaplanowanych do realizacji dotacji - Liczba zaplanowanych do realizacji doposażeń

	- Liczba osób objętych wsparciem - 30 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie w 2015 roku: 128 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie w 2016 roku: 88 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie w latach 2017-2018: 168 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie w latach 2019-2020: 74 - Liczba zrealizowanych staży (2015 -2018): 787 - Liczba zrealizowanych dotacji (2015-2018): 124 - Liczba zrealizowanych prac interwencyjnych (2015-2018): 25 - Liczba zrealizowanych doposażeń stanowiska pracy (2018): 14 Wsparcie w starcie (promocja samozatrudnienia na obszarze rewitalizowanym w ramach działania 7.3.2) – Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcia działalności gospodarczej w programie: 4 - Liczba osób, które wzięły udział w indywidualnych konsultacjach: 9 - Liczba wydanych zaświadczeń ukończenia kursów: 4 Wsparcie na starcie: - Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcia działalności gospodarczej w programie: 4 - Liczba osób, które wzięły udział w indywidualnych konsultacjach: 4 - Liczba wydanych zaświadczeń ukończenia kursów: 4 Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży górniczo -wiertniczej, E-ambasador: - Liczba zawodów, w których osoby kształcące się w zawodach lub osoby dorosłe posiadające kwalifikacje zawodowe będą mogły uzyskać dodatkowe umiejętności zawodowe opracowane w ramach Programu: 7 -Liczba programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów opracowanych we współpracy z pracodawcami: 19 Sektorowa Rama Kwalifikacji w Górnictwie: - Dostarczenie ostatecznego produktu (raportu końcowego oraz prezentacji multimedialnej): 1	
--	--	--

	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 218 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 89 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 191 Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w Jastrzębiu-Zdroju - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 94 - Liczba osób objętych wsparciem: 396 - liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci staży: 181 - liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci dotacji: 63 - liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci doposażenia stanowiska pracy: 34 Praktyka i Praca - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ oraz Blżej pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+: - odsetek uczestników w wieku 50+ którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 64 - odsetek uczestniczek, które podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 78 - Liczba osób pracujących, po opuszczeniu programu: 38 Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji: - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje pracujących	
--	--	--

	(łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek): 22	
PO-III) Wyrównywanie szans życiowych i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru wsparcia poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego [sfera społeczna].		
Kierunek działania	Osiągnięte wskaźniki realizacji celów Programu	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
K15 - Aktywna polityka społeczna w celu neutralizacji zjawisk wykluczenia społecznego, marginalizacji i bierności, K16 - Walka z bezrobociem i biernością zawodową poprzez działania skierowane na podnoszenie kwalifikacji, aktywizację zawodową i rozwój osobowościowy mieszkańców, K17 - Poprawa bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii i dezintegracji społecznej, K18 - Przeciwdziałanie migracji zewnętrznej mieszkańców poprzez wzmacnianie identyfikacji mieszkańców z miastem oraz kształtowanie tożsamości lokalnej, K19 - Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców oraz propagowanie aktywnego stylu życia, K20- Wsparcie i podniesienie aktywności organizacji pozarządowych, K21 - Wykorzystanie i rozwój istniejącego potencjału edukacyjnego,	Wakacyjna Akademia - Liczba osób biorących udział w warsztatach (w wieku 50 lat i więcej): 977. O krok do przodu - Wsparcie dla osób z terenów rewitalizowanych - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu: 53 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 51 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 29 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 207 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 43. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 15 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 141 Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w Jastrzębiu-Zdroju	- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób długotrwale bezrobotnych zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób z niepełnosprawnościami zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania - Liczba dzieci biorących udział w prezentacji młodych talentów - Liczba mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym - Liczba zorganizowanych pokazów filmowych - Liczba wydarzeń kulturalnych

K22 - Kształtowanie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy, K23- Aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych.	- Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 5 - liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie osoby bezrobotnej: 18 - liczba osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami lub osoby długotrwale bezrobotne lub/i osoby o niskich kwalifikacjach: 259 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ na obszarze rewitalizowanym - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych: 27 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych: 16 - Liczba osób niepełnosprawnych zaplanowanych do objęcia wsparciem: 1 - Liczba osób 50 + zaplanowanych do objęcia programem: 6 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach: 27 Praktyka i Praca - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ oraz Blżej pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+: -Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 134 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 76 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 10 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 37 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 120 - Liczba osób pracujących, po opuszczeniu programu: 82 - odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po	
---	---	--

	zakończeniu programu: 76 - odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 80 - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 61 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 34 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 6 -Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 15 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 61 Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych (JCOP) - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 3220, Liczba zorganizowanych akcji dla seniorów: 528 Festiwal organizacji pozarządowych - Liczba organizacji/ osób biorących udział w społecznej akcji/ festiwalu: 110 osób, Liczba spotkań/warsztatów: 4 Festiwal Sztuk Wszelkich Zderzenia Działań Wrażliwych - Liczba organizacji biorących udział w festiwalu: 10, Liczba uczestników: 1381 Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - Liczba dzieci biorących udział w prezentacji młodych talentów: 500, Liczba zorganizowanych zabaw i animacji: 9 Jarmark Sztuki Wiosna Ludów - Liczba osób biorących udział w warsztatach: 500, Liczba artystów poniżej 25 r. życia biorących udział w wydarzeniu: 3 Jastrzębskie Lato Muzyczne - Liczba mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w koncertach: 4750, Liczba koncertów odbywających się w ramach projektu: 12 Transgraniczne zaczytanie - Liczba partnerów zaangażowanych w realizację projektu: 1,	
--	---	--

	Liczba osób uczestniczących w warsztatach: 252, Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie edukacji: 7 Letnie Kino Parkowe - Liczba zorganizowanych pokazów filmowych: 9 Muzyczne Środy - Liczba koncertów odbywających się w ramach projektu: 9, Liczba osób uczestniczących w koncertach: 3450, Liczba artystów (zespołów) biorących udział w wydarzeniu: 9 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 50, Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 21, Liczba nowopowstałych miejsc pracy: 7 Piknik w kurorcie - wskaźnik produktu - Liczba wydarzeń kulturalnych skierowana do mieszkańców: 2 Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Gwarków, Przyjaźń, Zdrój, Zofiówka, 1000-lecia, Górne i Dolne - Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 26 Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju - Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania: 2 Postindustrialne dziedzictwo pogranicza - wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin: 100% V polsko-czeskie spotkania branżowe - Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania: 2 Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projekt: 1, Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych: 1 Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu	
--	---	--

	Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu: 1. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia satysfakcji z macierzyństwa, w tym z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem: 200. Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji: - Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej 7 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 56 Postindustrialne dziedzictwo pogranicza: - Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: 0,750 - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 10 000,00 Drugi Dom: - Liczba wpartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 10 - Liczba osób zaangażowanych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 80 Wakacyjne warsztaty międzypokoleniowe:	
--	--	--

	- Liczba zrealizowanych działań: 8 - Liczba uczestników: 150 Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju: - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 23 - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 4 Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju: - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu: 1 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych: 1 - Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi: 65 000 Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu: - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu: 1. - Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi: 1990	
--	--	--

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdroju. Dane zostały opracowane na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR.

6. ANALIZA ZMIAN WSKAŹNIKOWYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI

W celu zmonitorowania zmian wpływu programu rewitalizacji na obszarze objętym rewitalizacją wytypowano wskaźniki, które wykorzystano do wyznaczenia obszaru na etapie sporządzania programu rewitalizacji. Analiza poddano:

1. W sferze społecznej:
 - poziom interwencji policji w stosunku do liczby mieszkańców obszaru,
 - poziom bezrobocia w stosunku do liczby mieszkańców obszaru,
 - udział liczby osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców obszaru,
2. W sferze gospodarczej:
 - poziom przedsiębiorczości mierzony liczbą podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby mieszkańców obszaru
3. W sferze przestrzennej:
 - średnią liczbę osób zamieszkujących w mieszkaniach na obszarze rewitalizacji.

6.1 POZIOM INTERWENCJI POLICJI

Na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji posłużono się wskaźnikiem, który uwzględniał poziom czynów zabronionych w stosunku do liczby mieszkańców. Jest on węższy niż ten uwzględniony na etapie oceny realizacji programu rewitalizacji.


Tabela 8 Poziom przestępczości w 2016 r.

Osiedle	Liczba czynów zabronionych w stosunku do liczby mieszkańców osiedla
Os. Przyjaźń	1,10%
Os. Zofiówka	1,23%
Sol. Szeroka	2,43%
Os.1000-lecia Szeroka	2,34%
Os. Zdrój	1,14%
Os. Gwarków	1,26%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju

Zmiany poziomu interwencji w odniesieniu do liczby mieszkańców przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 2: Wskaźnik interwencji Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju w stosunku do liczby mieszkańców na obszarze rewitalizacji w latach 2018-2020

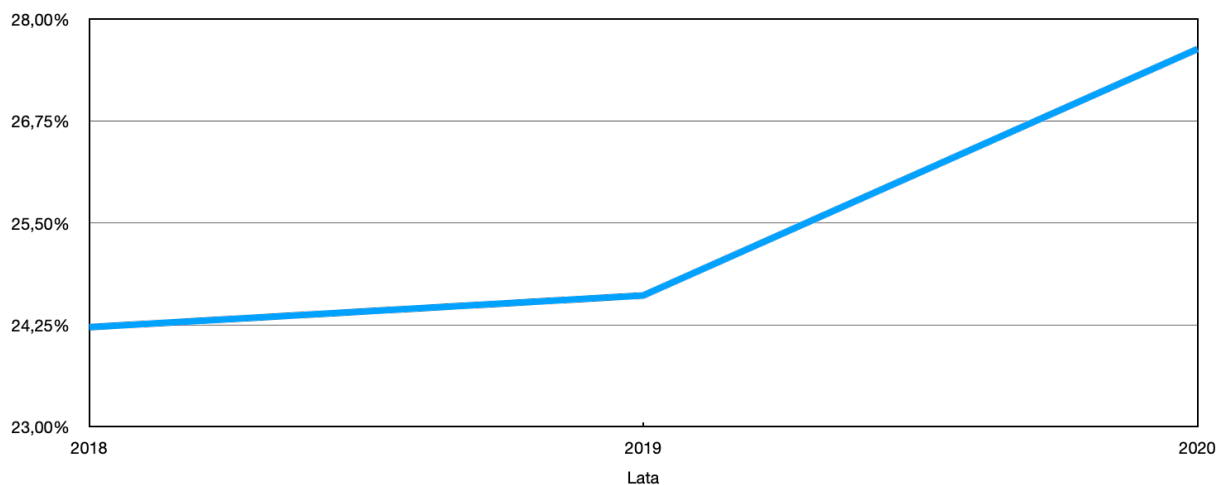


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju

Widoczny jest wzrost zjawiska o około 4 punkty procentowe w roku 2020 w stosunku do roku 2018. Zmianę tą w części należy wiązać z okresem pandemii oraz izolacji mieszkańców w domach.

6.2. POZIOM BEZROBOCIA

Kolejnym wskaźnikiem, który zmonitorowano była liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób zamieszkujących obszar rewitalizacji. Wyniki analizy przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3: Udział bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców obszaru rewitalizacji w odniesieniu do wskaźnika bezrobocia dla Polski w latach 2016, 2018-2020

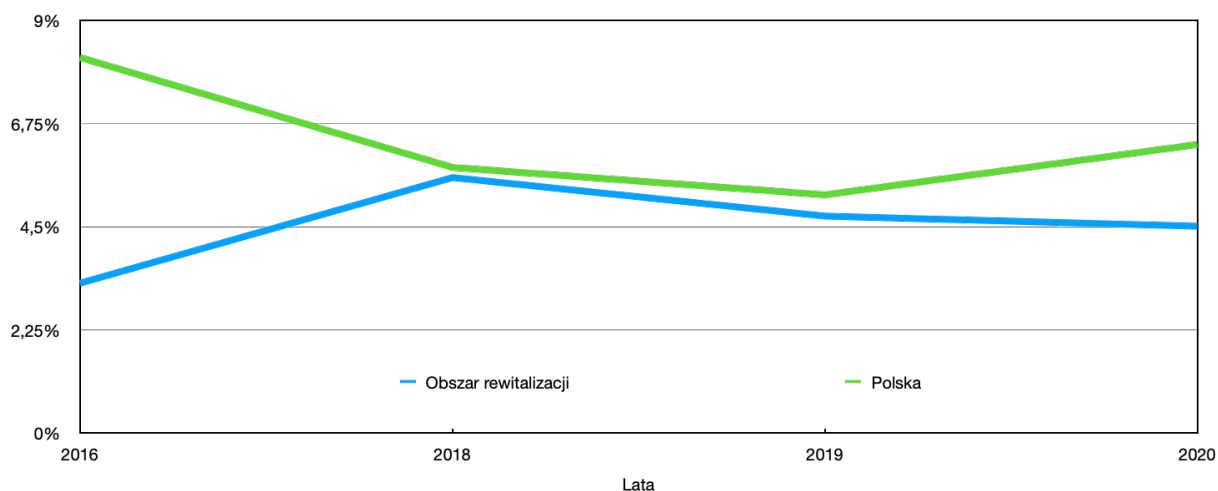


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych urzędu pracy w Jastrzębiu-Zdroju oraz GUS w Warszawie.

Zestawienie trendów zmiany poziom bezrobocia na obszarze rewitalizacji w odniesieniu do zmiany dla całej Polski pokazuje, że zmiany wywołane programem rewitalizacji są pozytywne. Na obszarze kraju w 2020 r. zanotowano niewielki wzrost poziomu bezrobocia. Na obszarze rewitalizacji od 2018 rejestruje się jego systematyczny spadek.

6.3. POZIOM WSPARCIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Na kolejnym wykresie przedstawiony został udział osób korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej na obszarze rewitalizowanym, województwa śląskiego oraz Polski.

Wykres 4: Udział osób objętych pomocą społeczną w stosunku do liczby mieszkańców obszaru rewitalizowanego, województwa śląskiego i Polski w latach 2016, 2018-2020

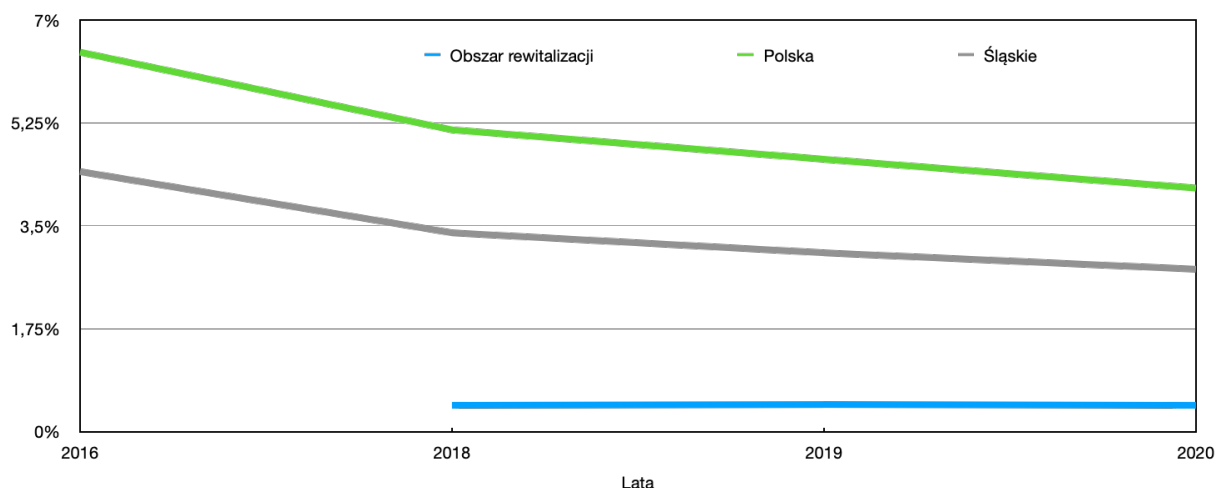


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz danych Bank Danych Lokalnych GUS w Warszawie.

W przypadku pomocy na obszarze rewitalizacji to wskaźnik przez okres wdrażania programu utrzymuje się na tym samym poziomie. Na obszarze Polski i Śląska w tym samym okresie uległ zmniejszeniu.

6.4. POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wskaźnik przedsiębiorczości to udział podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym, które mają siedzibę na obszarze rewitalizacji w stosunku do liczby mieszkańców. Wyniki analizy przedstawione zostały na poniższym wykresie.

Wykres 5: Udział podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby mieszkańców działających na obszarze rewitalizowanym, w województwie śląskim oraz w Polsce w latach 2013, 2018-2020

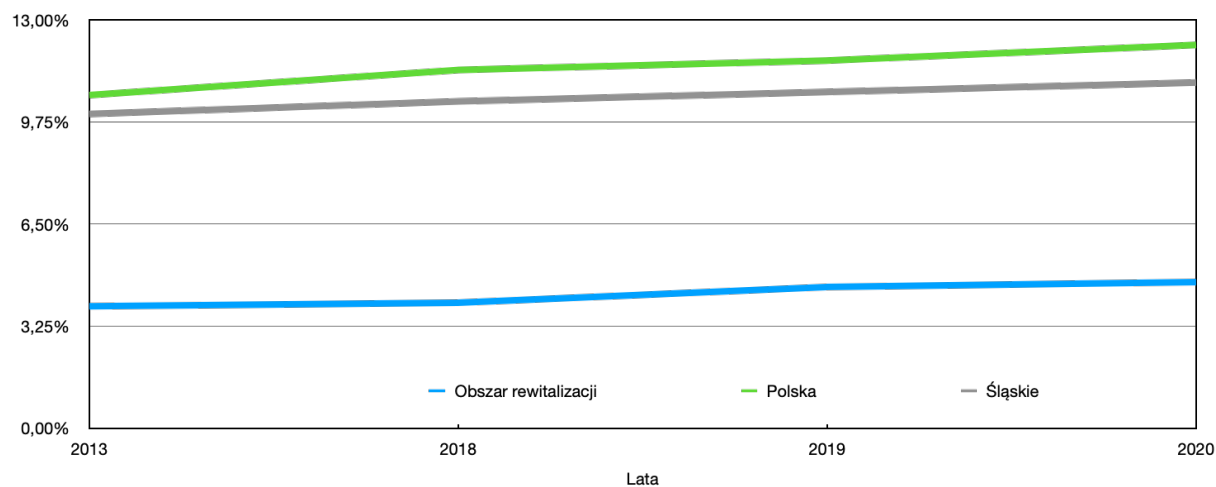


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju oraz danych Bank Danych Lokalnych GUS w Warszawie.

W badanym okresie poziom przedsiębiorczości na obszarze rewitalizowanym uległ nieznacznej poprawie. Podobne zmiany zarejestrowane zostały na całym Śląsku oraz w Polsce.

6.5. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W MIESZKANIACH

Na potrzeby oceny wpływu program rewitalizacji na obszar poddany rewitalizacji zbadano, jak zmieniała się średnia liczba osób zamieszkujących jedno mieszkanie w 2016 r oraz w latach 2018-2020. Wyniki przedstawiono na kolejnym wykresie.

Wykres 6: Liczba mieszkańców przypadających na jedno mieszkanie na obszarze rewitalizowanym, w województwie śląskim oraz w Polsce w latach 2016, 2018-2020

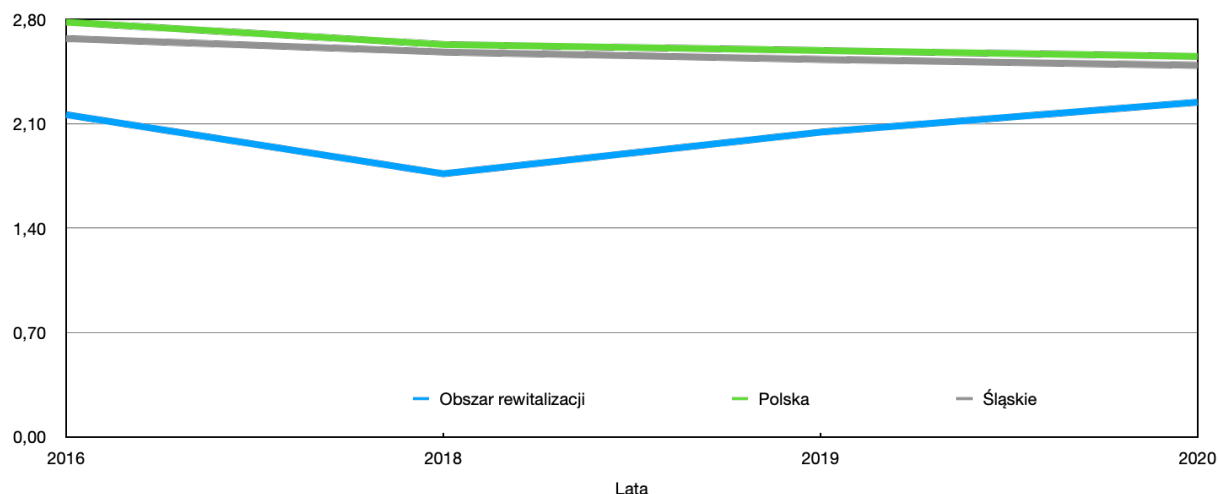

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju oraz danych Bank Danych Lokalnych GUS w Warszawie.

Na obszarze Polski i województwa śląskiego średnia liczba osób w jednym mieszkaniu była wyższa niż na obszarze rewitalizowanym i w badanym okresie nieznacznie się zmniejszyła. Odwrotny trend wystąpił na obszarze rewitalizowanym. Średnia liczba osób wzrosła do poziomu z 2016 r. po wyraźnym spadku w 2018 r.

7. PODSUMOWANIE

Kluczowe założenia w zakresie efektów wdrażania niniejszego Programu, sformułowane w oparciu o materiały zebrane w części diagnozującej, przekładają się na docelową wizję obszaru rewitalizowanego, którą można sformułować w następujący sposób:

Jastrzębie-Zdrój w roku 2023 to miasto:

- spójne społecznie i gospodarczo,
- aktywnie i skutecznie przeciwdziałające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
- oferujące mieszkańcom stały dostęp do trwałych i konkurencyjnych miejsc pracy,
- dbające o zachowanie tożsamości lokalnej i kształtowanie dobrych relacji między mieszkańcami,
- umożliwiające efektywną współpracę różnych środowisk,
- gwarantujące swoim mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa,
- zapewniające wysoką estetykę i funkcjonalność przestrzeni miejskiej.

Powyżej wskazane punkty składają się na docelową wizję obszaru rewitalizacji określoną w Lokalnym Programie Rewitalizacji, której odzwierciedleniem jest określony Cel Strategiczny, który brzmi:

Neutralizacja problemów skoncentrowanych w granicach obszaru rewitalizacji w celu zapewnienia spójnego rozwoju społeczno-gospodarczego Jastrzębia-Zdroju.

Celem realizacji założonych w Programie Rewitalizacji projektów jest zagwarantowanie:

- rozwoju społecznego,
- rozwoju przestrzennego,
- rozwoju gospodarczego,

na terenie zdefiniowanym jako obszar rewitalizacji.

Warunkiem brzegowym wdrożenia nakreślonej wizji jest realizacja kompleksowych działań uwzględnionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji i – w ich efekcie – neutralizacja problemów koncentrujących się na wytyczonym obszarze rewitalizacji, co umożliwi zachowanie spójności społecznej miasta i stworzy warunki dla długofalowego i zrównoważonego rozwoju całego miasta.

Wszystkie monitorowane projekty, ich realizacja, czyli cały proces ewaluacji pozwala zaobserwować jak realnie zmienia się miasto przestrzennie, społecznie i gospodarczo. Podczas kontroli przedstawiono bardzo szeroki zakres zrealizowanych i realizowanych projektów oraz zadań Miasta, które wpłynęły na rozwiązanie czy zminimalizowanie zdiagnozowanych problemów, czy też zgłaszanych na konsultacjach w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Wiele lokalnych realnych problemów (które można rozwiązać z ramienia władz miasta) zgłaszanych przez grupy społeczne, jak i zdefiniowanych na obszarach rewitalizacji zostało rozwiązanych lub zminimalizowanych dzięki realizacji projektów wpisanych do LPR. Również wiele zadań zostało i jest realizowanych, a które nie zostały wpisane do LPR. Głównie dlatego, że były realizowane poza obszarem rewitalizacji, ale ich oddziaływanie dotyczyło bezpośrednio problemów występujących w mieście i na obszarze rewitalizowanym np. niska emisja, pomoc osobom niepełnosprawnym. Innymi przyczynami, dla których nie włączano tych projektów w treść programu rewitalizacji były:

- sprawy własnościowe: miasto nie było właścicielem obszaru/budynku (np. rewitalizacja budynku Sądu w dzielnicy Zdrój),
- bieżący charakter przedsięwzięć, które nie były wcześniej planowane; wynikały z bieżących zadań wpisanych do budżetu miasta, ale dotyczyły zgłaszanych potrzeb mieszkańców miasta.

- Została też zrealizowana cała grupa projektów miękkich społecznych również wspartych funduszami zewnętrznymi – np. Europejski Fundusz Społeczny, podwyższających kwalifikacje uczniów i nauczycieli zwiększając ich zatrudnianie na rynku pracy. Nie wpisane były do treści LPR z uwagi na brak takiego wymogu ze strony Instytucji dofinansowującej projekty.

Zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju cele zostały w znacznym stopniu zrealizowane, a efekty projektów rewitalizacyjnych widoczne są w poszczególnych lokalizacjach i obszarach ich oddziaływania. Dotyczy to również przedsięwzięć nie ujętych w LPR. Projekty rewitalizacyjne – wynikające z jastrzębskiego LPR oraz inne realizowane na bieżąco w zakresie rewitalizacji (nie wpisane w LPR są odpowiedzią na problemy mieszkańców zgłaszanych podczas konsultacji społecznych oraz problemy zdiagnozowane na tych obszarach rewitalizacyjnych biorąc pod uwagę wskaźniki) miały znaczący wpływ na ograniczenie negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji.

Podsumowując stopień realizacji poszczególnych projektów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Jastrzębi-Zdrój do roku 2023 należy stwierdzić, iż stopień realizacji rewitalizacji miasta na chwilę obecną osiągnął stosunkowo wysoki stopień realizacji.

8. UWAGI

Brak.

9. SPIS TABEL

TABELA 1 PROJEKTY ZREALIZOWANE W OKRESIE DO MARCA 2019 R.	7
TABELA 2 PROJEKTY ZREALIZOWANE W OKRESIE OD KWIETNIA 2019 R. DO MAJA 2021 R.....	23
TABELA 3 PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI, STAN NA MAJ 2021 R.....	36
TABELA 4 PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI	53
TABELA 5 PROJEKTY NIEZREALIZOWANE.....	54
TABELA 6: FINANSOWA REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW PROGRAMU REWITALIZACJI.....	60
TABELA 7: FINANSOWA REALIZACJA PROGRAMU REWITALIZACJI DO MAJA 2021 R.....	69
TABELA 8 POZIOM PRZESTĘPCZOŚCI W 2016 R.....	82

10. SPIS WYKRESÓW

WYKRES 1: STAN REALIZACJI PROJEKTÓW PODSTAWOWYCH	58
WYKRES 2: WSKAŹNIK INTERWENCJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W JASTRZĘBIU ZDROJU W STOSUNKU DO LICZBY MIESZKAŃCÓW NA OBSZARZE REWITALIZACJI W LATACH 2018-2020	83
WYKRES 3: UDZIAŁ BEZROBOTNYCH W STOSUNKU DO LICZBY MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI W ODNIESIENIU DO WSKAŹNIKA BEZROBOCIA DLA POLSKI W LATACH 2016, 2018-2020.....	83
WYKRES 4: UDZIAŁ OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W STOSUNKU DO LICZY MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZOWANEGO, WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I POLSKI W LATACH 2016, 2018-2020	84
WYKRES 5: UDZIAŁ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W STOSUNKU DO LICZBY MIESZKAŃCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM, W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ W POLSCE W LATACH 2013, 2018-2020	84
WYKRES 6: LICZBA MIESZKAŃCÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNO MIESZKANIE NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM, W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ W POLSCE W LATACH 2016, 2018-2020.....	85
