

UCHWAŁA NR XVI.218.2022
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia „Raportu monitoringowego i końcowego z realizacji zadań ujętych
w Lokalnym Programie Rewitalizacji do 31 grudnia 2023 roku”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 52 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 485)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwała

§ 1. Przyjąć „Raport monitoringowy i końcowy z realizacji zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Jastrzębia - Zdroju do 31 grudnia 2023 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

**Raport monitoringowy i końcowy z realizacji zadań
ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Jastrzębia-
Zdroju do 31 grudnia 2023 roku**



Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój 2022 r.

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	1
1.1.	Źródło danych	1
1.2.	Definicje przyjęte w niniejszym opracowaniu	1
2.	Metodologia przeprowadzenia monitoringu	3
3.	Analiza osiągniętych wskaźników projektowych	5
3.1.	Projekty zrealizowane w okresie od roku 2016 do marca 2019 roku	5
3.2.	Projekty zrealizowane w okresie od kwietnia 2019 r. do maja 2021 r.	19
3.3.	Projekty zrealizowane w okresie od czerwca 2022 r. do październik 2022 r.	32
3.4.	Projekty w trakcie realizacji	40
3.5.	Podsumowanie końcowe	62
4.	Analiza finansowych założeń z realizacji projektów	63
5.	Analiza osiągniętych wskaźników monitoringowych	74
6.	Analiza zmian wskaźnikowych na obszarze rewitalizacji	89
6.1.	Poziom interwencji policji	89
6.2.	Poziom bezrobocia	90
6.3.	Poziom wsparcia ośrodka pomocy społecznej	90
6.4.	Poziom przedsiębiorczości	91
6.5.	Liczba osób zamieszkujących w mieszkaniach	92
7.	Ocen stopnia realizacji celów Programu Rewitalizacji - wnioski	94
8.	Uwagi	97
9.	Spis tabel	97
10.	Spis wykresów	97

1. WSTĘP

Rewitalizacja - proces wyprowadzania obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane na tym terenie oraz prowadzone przez interesariuszy tego procesu.

Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 31 grudnia 2023 przyjęty został Uchwałą nr IV.18.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 lutego 2017 r. Dokument został opracowany na podstawie współpracy pomiędzy Urzędem Miasta, a m.in. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2. Dokument stanowi aktualizację *Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015*. w kolejnym okresie LPR Jastrzębia-Zdroju ulegał aktualizacji o kolejne projekty inwestycyjne i miękkie. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 26.03.2020 r. (Uchwała nr III.42.2020 z dnia 26 marca 2020). Natomiast z uwagi na konieczność realizacji do 2023 r. m.in. projektu wpisanego do LPR - „Rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul 1 Maja, Uchwałą z dnia 25.02.2021 r. nr II.31.2021 nastąpiło wydłużenie okresu obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji do 31.12.2023 r.

Zmiany wskazano w Tabeli 36 *Lista i opis projektów głównych, realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji* oraz w tabeli 38 *Tabela finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji*. Zmiany uwzględniono również w części wskaźnikowej dokumentu.

Opracowany Raport z monitoringu służy wyznaczeniu wskaźników, a także badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dążenia do założonych celów, oraz poziomu ich osiągnięcia.

1.1. ŹRÓDŁO DANYCH

Informacje i dane, na podstawie których opracowany został przedstawiony raport, pozyskano w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębia-Zdroju oraz instytucjach i jednostkach z terenu miasta, które realizowały bądź realizują poszczególne projekty wchodzące w skład programu rewitalizacji. Dodatkowo pozyskane zostały dane uzupełniające z:

- Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju,
- Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju,
- Spółdzielni mieszkaniowej JAS-MOS,
- Miejskiego Zarządu Nieruchomościami,
- Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa.

1.2. DEFINICJE PRZYJĘTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

Zleceniodawca: Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Projekt/Zadanie/Raport: Raport monitoringowy z realizacji zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 31 grudnia 2023.

RPO WSL: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

PR: Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 31 grudnia 2023.

Raport: Zestawienie w formie jednolitego dokumentu informacji i wskaźników dotyczących stanu realizacji PR.

Monitoring: Proces systematycznego zbierania, analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanego projektu w aspekcie finansowym i rzeczowym.

Okres sprawozdawczy: Okres sprawozdawczy jest to okres, za który sporządza się sprawozdanie np. miesiąc, półrocze, rok.

Cel główny/strategiczny: Cel odnoszący się do kluczowego problemu definiowany w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest on rezultatem wykorzystania powstałych produktów.

Wskaźniki monitoringowe, stanowiące podstawę oceny stopnia realizacji Programu. Wskaźniki projektowe/rezultatu: Fizyczny efekt osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośredni wpływ zrealizowanych działań/stworzonych produktów, osiągany natychmiast po realizacji projektu-określa zmiany, jakie nastąpiły u beneficjentów.

Oddziaływanie: Długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla beneficjentów pośrednich, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów.

2. METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA MONITORINGU

Istotą monitoringu jest gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji przydatnych w zarządzaniu rewitalizacją i wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji jest realizacja działań i projektów uwzględnionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służy system współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi program oraz analiza osiąganych wskaźników. Dane niezbędne do przygotowania raportu pozyskane zostały przez Wydział Merytoryczny Miasta, m.in. od wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz poszczególnych podmiotów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Na potrzeby monitoringu w Programie Rewitalizacji określony został zestaw wskaźników monitoringowych, do których przyporządkowane zostały poszczególne cele operacyjne. Do tego opracowany został również wzór *Karty raportu monitoringowego z realizacji zadania ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji*.

Rekomendowane wskaźniki monitoringowe, stanowiące podstawę oceny stopnia realizacji Programu, zamieszczone zostały poniżej. Zestaw wskaźników powstał w ścisłej korelacji z listą działań przyjętych do realizacji w ramach Programu. Punktem wyjścia dla monitorowania wskaźników w ramach Programu Rewitalizacji jest moment przyjęcia dokumentu, stanowiący jednocześnie punkt „0” dla działań związanych z monitoringiem i ewaluacją. Wskaźniki są monitorowane przyrostowo, przy czym poziomem bazowym jest poziom „0”, nie zaś stan bazowy wskaźnika ustalony na dzień przyjęcia Programu. Taka metodologia pomiaru wskaźników umożliwia monitoring uwzględniający jedynie działania zrealizowane w ramach procesu rewitalizacji, nie zaś działania prowadzone w okresie wcześniejszym, w ramach innych przedsięwzięć. Monitoring ilościowy przeprowadzony został na poziomie wskaźników podstawowych rozumianych jako wskaźniki projektowe/rezultaty.

Co więcej, dokonano oceny stopnia realizacji celów Programu Rewitalizacji na podstawie porównania stanu wskaźników bazowych, wykorzystanych do wytyczenia obszaru rewitalizacji ustalonego w momencie opracowania Programu, z obecnym poziomem wskaźników dotyczących sfery społecznej, przestrzennej oraz gospodarczej (wyniki zestawione zostały w rozdziale 6 *Analiza zmian wskaźnikowych na obszarze rewitalizacji* na stronie 89).

Tabela 1 Wskaźniki poziomu realizacji Celów Programu

PO-I) Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez kompleksowe działania o charakterze infrastrukturalno-architektonicznym [sfera przestrzenna].	
Kierunek działania	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
K1 - Odnowa urbanistyczna obszarów miejskich i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej, K2 - Rozbudowa i optymalizacja układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej miasta, K3 - Rewitalizacja substancji mieszkaniowej, K4 - Tworzenie rozwiązań infrastrukturalnych, wspierających rozwój gospodarczy, K5 - Rewitalizacja terenów i obiektów przemysłowych, K6 - Przebudowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, K7 - Poprawa jakości i konkurencyjności infrastruktury ochrony zdrowia,	- Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, - Liczba elementów infrastruktury udostępniającej /zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, - Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, - Liczba nowopowstałych obiektów na cele sportowe oraz rekreacyjne, - Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych i tras rowerowych, - Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej, - Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego,

K8 - Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta, K9 - Rozwiązania systemowo-infrastrukturalne dla poprawy jakości środowiska naturalnego.	- Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych, - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją, - Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury.
--	--

PO-II) Aktywizacja ekonomiczna obszaru wsparcia dzięki podniesieniu konkurencyjności i trwałe reorganizacji struktury gospodarczej [sfera gospodarcza].

Kierunek działania	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
K10 - Aktywizacja gospodarcza mieszkańców i ułatwianie przekwalifikowania zawodowego, K11 - Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności oraz tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), K12 - Kompleksowa promocja miasta skierowana na przyciągnięcie inwestorów, K13 - Podnoszenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta, K14 - Kształtowanie systemu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	- Liczba zrealizowanych staży, - Liczba zrealizowanych dotacji, - Liczba zrealizowanych prac interwencyjnych, - Liczba zrealizowanych doposażeń stanowiska pracy, - Liczba zaplanowanych do realizacji staży, - Liczba zaplanowanych do realizacji dotacji, - Liczba zaplanowanych do realizacji doposażeń.

PO-III) Wyrównywanie szans życiowych i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru wsparcia poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego [sfera społeczna].

Kierunek działania	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
K15 - Aktywna polityka społeczna w celu neutralizacji zjawisk wykluczenia społecznego, marginalizacji i bierności, K16 - Walka z bezrobociem i biernością zawodową poprzez działania skierowane na podnoszenie kwalifikacji, aktywizację zawodową i rozwój osobowościowy mieszkańców, K17 - Poprawa bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii i dezintegracji społecznej, K18 - Przeciwdziałanie migracji zewnętrznej mieszkańców poprzez wzmacnianie identyfikacji mieszkańców z miastem oraz kształtowanie tożsamości lokalnej, K19 - Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców oraz propagowanie aktywnego stylu życia, K20 - Wsparcie i podniesienie aktywności organizacji pozarządowych, K21 - Wykorzystanie i rozwój istniejącego potencjału edukacyjnego, K22 - Kształtowanie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy, K23 - Aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych.	- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie, - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie, - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie, - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie, - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych zaplanowanych do objęcia wsparciem, - Liczba osób długotrwale bezrobotnych zaplanowanych do objęcia wsparciem, - Liczba osób z niepełnosprawnościami zaplanowanych do objęcia wsparciem, - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej zaplanowanych do objęcia wsparciem, - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami zaplanowanych do objęcia wsparciem, - Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania, - Liczba dzieci biorących udział w prezentacji młodych talentów, - Liczba mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym, - Liczba zorganizowanych pokazów filmowych, - Liczba wydarzeń kulturalnych.

Źródło: Opracowanie własne.

3. ANALIZA OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTOWYCH

Do *Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 31 grudnia 2023 roku* zgłoszone zostały 64 projekty główne, których beneficjentami są m.in. Miasto Jastrzębie-Zdrój, instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje, inwestorzy prywatni czy organizacje pozarządowe. Na liście podstawowych projektów rewitalizacyjnych (*Tabela 36 Lista i opis projektów głównych, realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji*, str. od 130 *Programu Rewitalizacji*) ujętych zostało 64 projektów natomiast na liście pozostałych projektów rewitalizacyjnych (*Tabela 37 Lista projektów rezerwowych*, str. od 212 *Lokalnego Programu Rewitalizacji*) 4 projekty. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich projektów i stopnia ich realizacji pod kątem wskaźników projektowych przedstawiają poniższe tabele.

3.1. PROJEKTY ZREALIZOWANE W OKRESIE OD ROKU 2016 DO MARCA 2019 ROKU

Tabela 2 Projekty zrealizowane w okresie do marca 2019 r.

Nr projektu w LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2019	Budżet [zł]
2.	Wakacyjna Akademia poprzedni tytuł: Akademia seniora – organizowanie wspólnych warsztatów na rzecz zdobywanej umiejętności i uczenia przez całe życie	Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej PARTNER: Miejska Biblioteka Publiczna	W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania: - Grecki na wakacje – warsztaty językowe. - Zumba – warsztaty taneczne. - Gimnastyka umysłu – warsztaty usprawniające pracę mózgu. - Wakacyjna przygoda z lustrzanką – warsztaty fotograficzne. - Pszczoły i ich produkty – apiterapia, apitoksynoterapia, - 3XFIT - pilates, stretching, zdrowy kręgosłup, - Tabata i nie tylko – szczupła sylwetka w 4 minuty. - Technologia bez barier – warsztaty komputerowe, - How are You? – angielski na wakacje – warsztaty językowe, - Tworzenie biżuterii – warsztaty rękodzieła, - Podstawy malowania – warsztaty artystyczne, - Wakacje bez stresu – warsztaty samodoskonalenia, - Płaski brzuch – warsztaty sportowe, - Latino dance – warsztaty taneczne, - Joga – warsztaty relaksacyjne, - Zdrowa dieta – warsztaty estetyki żywnościowej.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 03.07.2017 – 30.08.2018	- Liczba osób biorących udział w warsztatach (w wieku 50 lat i więcej): 977 . - Liczba zrealizowanych działań: 16	9 200,00 Źródło: Środki własne Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju
7.	Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych (JCOP) poprzedni tytuł: Centrum wolontariatu i organizacji pozarządowych	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał na celu: - aktywizację społeczności lokalnej – dzieci, młodzieży i seniorów, - prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży, - organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, - dążenie do konsolidacji środowiska organizacji pozarządowych, a przede wszystkim stworzenia systemu informacji dla podmiotów ekonomii społecznej.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.01.2017– 01.12.2018	- Liczba organizacji korzystających systematycznie z JCOP: 3 - Liczba osób korzystających z usług Centrum: 150 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 30 -Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 30	128 040,00 Źródło: BP

						-Liczba zorganizowanych akcji dla seniorów: 60 -Liczba spotkań/ warsztatów: 50	
8.	Festiwal organizacji pozarządowych poprzedni tytuł: Forum Ekonomii Społecznej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Podczas Forum stworzono wspólną przestrzeń do wymiany doświadczeń, wzorców do naśladowania i budowania partnerstwa, wskazano przykłady dobrych praktyk w obrębie sektora ekonomii społecznej, zatrudniania w przedsiębiorstwach społecznych, nawiązania partnerstwa międzysektorowego, podjęto szeroką dyskusję o roli ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju. Zorganizowano warsztaty o tematyce: 1. Współpraca transgraniczna. 2. Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju. 3. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach Publicznych. 4. Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.01.2017 – 01.12.2018	-Liczba zorganizowanych spotkań: 1 - Liczba organizacji /osób biorących udział w społecznej akcji/festiwalu: 16 - Liczba warsztatów: 10 - Liczba innych podmiotów uczestniczących w wydarzeniu: 20	1 700,00 Źródło: BM
9.	Festiwal Sztuk Wszelkich Zderzenia Działań Wrażliwych	Miejski Ośrodek Kultury	W ramach wydarzenia zrealizowane zostały (2017 r.): - spektakle teatralne „Futerko z obłoków”, „ZABAWA”, „Dla mnie bomba”, „GOULD Wariacje”, „Tyglikowe marzenia”, „KOLEJKA ZUSOWSKA Sen Autora”, „WOMAN POWER, czyli Św. Hildegarda z Binden”, „PUSTE NOCE”, „Frida”, „ZUPA RYBNA w ODESSIE”, -koncerty zespołów „Max Brawura”, „GRZYBY”, -wystawa fotograficzna klubów „SJKF Niezależni” i M6 z Rybnika oraz scenografii Teatru Mariana Bednarka i Teatru Monitoring, -spotkania autorskie z poetami: Maciej Melecki, Arkadiusz Kremza, Marcin Bies, Bogdan Prejs. -happeningi (m.in. czytanie fragmentów „Wesela” S. Wyspiańskiego) oraz warsztaty edukacyjno-artystyczne. W ramach wydarzenia (22-26.10.2018 r.) odbyły się: spektakle teatralne, koncerty oraz warsztaty artystyczne.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 09.10.2017– 26.10.2018	- Liczba organizacji biorących udział w festiwalu: 10 - Liczba uczestników: 1381 - Liczba wydarzeń: 29	81 250,71 Źródło: Środki własne MOK środki własne MkiDN

10.	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	Miejski Ośrodek Kultury	Realizacja imprezy miała na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta. Integrowała ona uczestników, a także zapewniała przestrzeń na spędzenie wolnego czasu dla dzieci i rodziców. W ramach wydarzenia odbyły się: - pokaz iluzji i magii – Maciej Pol, - GWARDIA GRYFA: Spektakl „Cztery żywioły”, pokaz chorągwiarzy i tancerzy, szczudlarze, bańki mydlane, - pokaz tańca Breakdance – b-boye z Katowic, - pokaz tańca towarzyskiego – Duet ELITA z Krakowa, - balonikowe zoo, malowanie twarzy, - dyskoteka pod chmurką – DJ, - pokaz psich sztuczek, - prezentacja jastrzębskich talentów.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 04.06.2017	- Liczba dzieci biorących udział w prezentacji młodych talentów: 500 - Liczba zorganizowanych zabaw i animacji: 9 - Liczba artystów: 34 - Liczba osób: 3950	56 581,47 Źródło: Środki własne MOK
11.	Jarmark Sztuki Wiosna Ludów	Miejski Ośrodek Kultury	W ramach wydarzenia odbyły się wydarzenia artystyczne, muzyczno-teatralne, przybliżające innowacyjne nurty w dziedzinie muzyki i teatru.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 6-8.05.2016	- liczba osób biorących udział w warsztatach: 500 - liczba artystów poniżej 25 r. życia biorących udział w wydarzeniu: 3	11 987,60 Źródło: Środki własne MOK
13.	Jastrzębskie Lato Muzyczne	Miejski Ośrodek Kultury	W ramach wydarzenia odbyły się spotkania artystów, muzyków z terenu Polski i zagranicy oraz spotkania z artystami i muzykami znanymi z ekranu. Zorganizowano 12 koncertów w ramach cyklu „Jastrzębskie Lato Muzyczne”. Co niedzielę w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju wystąpiły dwa zespoły reprezentujące różne gatunki muzyczne. w wybranym okresie były to zespoły: „Brygida i Robert Łukowski”, „Jolanta i Jacek Kierok”, „Ewa Kopczyńska”, „Krzysztof Koniarek”, „DAREK NOWICKI”, „ZESPÓŁ EMI BAND ORAZ ANDRZEJ MIŚ”, Orkiestra Dęta KWK „JAS-MOS”, Zespół „GRAFIT”, Orkiestra Dęta KWK „Zofiówka”, „Alexander Martinez”, Big Band KWK „Borynia”, „DUO FENIX-DWA FYNIKI”. Ze względu na rozpoczęty remont i przebudowę Parku Zdrojowego w 2018 r. Koncerty się nie odbyły.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 09.07.2017 – 20.08.2017	- Liczba mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w koncertach: 4750 - Liczba koncertów odbywających się w ramach projektu: 11 - Liczba wykonawców: 11	60 222,98 Źródło: Środki własne MOK
14.	Transgraniczne zaczytanie	Miejska Biblioteka Publiczna	W ramach wydarzenia odbyły się: Warsztaty językowe, warsztaty kulturalno-artystyczne, wydanie polsko-czeskiego poradnika	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany:	- Liczba partnerów zaangażowanych w realizację projektu: 2	68 533,05 Źródło:

	poprzedni tytuł: Językowa akademia kultury pogranicza – wsparcie inicjatyw kulturalno- edukacyjnych	PARTNER Biblioteka Publiczna w Karwinie	językowego zawierającego tekst i zdjęcia obiektów kulturalnych pogranicza, jarmark książkowy, spotkania autorskie. Projekt zakładał stworzenie lepszych warunków do obcowania ze współczesną literaturą polsko-czeską oraz do świadomego i krytycznego jej odbioru. Poprzez warsztaty zintensyfikowane zostały spotkania polskiej i czeskiej młodzieży. Zorganizowano spotkanie integracyjne uczestników projektu oraz koncert podczas jarmarku książkowego w Karwinie. Spotkanie połączone było ze zwiedzaniem Biblioteki oraz Pałacu we Frysztackie.		28.08.2017 – 31.03.2018	- Liczba osób uczestniczących w warsztatach: 252 - Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie edukacji: 7 - Liczba uczestników wspólnych programów edukacyjnych oraz przygotowania zawodowego w celu transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży, zwiększenia możliwości edukacyjnych kształcenia wyższego i przygotowania zawodowego: 238	UE BM BP
15.	Letnie Kino Parkowe	Miejski Ośrodek Kultury	Projekt miał na celu zaspokojenie dostępu do kultury. Skierowany był do szerokiego grona odbiorców, sprzyjając integracji społecznej. Poprzez zwiększenie okazji do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych uświadamia potrzebę udziału w kulturze, w ramach projektu budowano również więzi społeczne oraz stworzono platformę integracji społecznej. Zrealizowano cykl seansów filmowych wyświetlanych w poniedziałki lipca i sierpnia w Parku Zdrojowym. w repertuarze znalazły się zarówno produkcje polskie, jak i zagraniczne. Oferta była bezpłatna dla widzów.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 03.07.2017 – 2018	- Liczba zorganizowanych pokazów filmowych: 13 - Liczba osób korzystających z oferty: 1550	5 670,30 Źródło: Środki własne MOK
17.	Muzyczne Środy	Miejski Ośrodek Kultury	W ramach projektu zorganizowano 9 koncertów w ramach cyklu „Muzyczne środy”. Co środę w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju wystąpił jeden zespół reprezentujący inny gatunek muzyczny. w wybranym okresie były to zespoły: „Coria”, „Kurczat”, „Blend”, „Ziggie Piggie”, „Grooversi”, „Paweł Kamiński Quartet”, „Tabu”, „Koniec świata”. Każdy z koncertów był świetnym urozmaicheniem wakacyjnego tygodnia.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 05.07.2017 – 30.08.2017	- Liczba koncertów odbywających się w ramach projektu: 9 - Liczba osób uczestniczących w koncertach: 3450 - Liczba artystów (zespołów) biorących udział w wydarzeniu: 9	29 983,98 Źródło: Środki własne MOK
18.	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój PARTNER	Projekt zrealizowano w ramach partnerstwa przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS – liderem projektu, Miastem Żory i Powiatem wodzisławskim. z oferty OWES korzystały m.in. osoby zagrożone	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.04.2016 – 31.07.2018	- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 50	132 950,00 Źródło: UM

	Subregionu Zachodniego	Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika	ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego oraz podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, WTZ, ZAZ, CIS, KIS itp.) i ich pracownicy. W ramach projektu prowadzono następujące działania: - animowanie, inkubowanie, - wspieranie w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw społecznych, - udzielanie informacji dotyczących: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia statutowej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej, możliwych do pozyskania środków na działalność, zmieniających się przepisów prawa itp. w ramach doradztwa utworzono 3 organizacje pozarządowe, prowadzące działalność odpłatną, 2 organizacje pozarządowe w wyniku działań OWES rozpoczęły prowadzenie działalności odpłatnej. - promocja ekonomii społecznej.			- Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 21 - Liczba nowopowstałych miejsc pracy: 7	BM
20.	Piknik w kurorcie	Miejski Ośrodek Kultury	21.05.2017 r. - IV Piknik w kurorcie – impreza plenerowa, utrzymana w klimacie lat 20 i 30 XX w., odbyła się na terenie Parku Zdrojowego. w ramach wydarzenia wystąpiły 3 zespoły, Teatr Monitoring oraz odbył się dancing w Domu Zdrojowym. Uczestnicy mogli także wziąć udział w przejażdżce samochodami z epoki oraz skorzystać z usług pacybuta, oraz fryzjera. 09.06.2017 r. - Promocja książki „Letnisko Oficerskie” odbył się w Galerii Historii Miasta w ramach IV Pikniku w kurorcie. w ramach zadania wydrukowano książkę oraz zorganizowano jej promocję.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 21.05.2017 – 09.06.2017	- Liczba wydarzeń kulturalnych skierowana do mieszkańców: 6 - Liczba osób biorących udział w wydarzeniach: 1000	45 293, 93 Źródło: Środki własne MOK
26.	Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Gwarków	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał za zadanie zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalno-sportowych. W ramach projektu odbyły się takie wydarzenia jak: - Sport to zdrowie,	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 16.06.2018 – 28.02.2018.	- Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 6	6 997,56 Źródło: BM

			- Leonowa Miła, - Sportowo dla seniorów, - Gwarkowe gole, - Przedszkolaki na sportowo, - Pierwszoklasista i sport.				
27.	Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Zofiówka	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał na celu zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach. w ramach wydarzenia odbyły się: - Konkurencje sportowe dla mieszkańców-festyn, - Festyn na sportowo, - Mikołajowe zabawy i konkursy, - Mikołaj dla wszystkich.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 15.06.2018 – 06.12.2018	- Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 4	6 967,00 Źródło: BM
28.	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla 1000-lecia	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał na celu zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalnych. Zorganizowano konkurs w ramach zakończenia lata oraz Dzień Świętego Mikołaja.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 08.09.2018 – 06.12.2018	- Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 2	6 998,74 Źródło: BM
29.	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał na celu zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalnych tj. udział w konkursie Wiosenne kwiaty w oczach dzieci, „Dziedzictwo i tradycja Górnego Śląska” - konkurs gwary Śląskiej i skeczów, impreza miejska plenerowa, udział w Dożynkach oraz Dożynkowych igraszkach. Zorganizowano Dożynkowe rywalizacje sportowe i kulturalne, zabawę karnawałową, dzień „Witaj Wiosno” Dzień Dziecka, Festyn Osiedlowy.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 26.01.2018 – 26.08.2018	- Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 5	11 218,70 Źródło: BM
30.	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Przyjaźń	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał na celu zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości wspólnej integracji m.in. spędzenie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalnych tj.: - Ozdoba świąteczna Bożego Narodzenia, - Boisko GLIKA, - Piłka plażowa, - SKAT – Przyjaźń kontra reszta Miasta Zorganizowano również Turniej Szachowy oraz XVI Turniej Mini Piłki Nożnej Przedszkolaków.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 15.06.2018– 14.12.2018	- Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 6	8 782,83 Źródło: BM

31.	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Zdrój	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt miał na celu spędzanie wolnego czasu poprzez udział w organizowanych imprezach kulturalnych tj. udział w wydarzeniach pt. Święta, tuż, tuż... w anielskim nastroju Zwierzak duży i mały – mój przyjaciel, 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.07.2018 – 10-12.12.2018	- Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 3	2 299,11 Źródło: BM
34.	Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój PARTNER Miasto Karvina	Celem projektu było zintensyfikowanie współpracy służb z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny poprzez organizację: -kursów językowych dla przedstawicieli służb z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny, -konferencji tematycznej dla przedstawicieli miast, służb mundurowych i medycznych nt. profilaktyki antynarkotykowej i zapobiegania rozprzestrzeniania się chemicznych środków odurzających typu dopalacze -konferencji tematycznej dla przedstawicieli miast, służb mundurowych i medycznych nt. prewencji kryminalnej, działań profilaktycznych kierowanych do różnych grup społecznych -warsztatów dla przedstawicieli miast, służb mundurowych i medycznych nt. wymiany doświadczeń. Wynikiem realizacji projektu jest zintensyfikowanie współpracy straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju podczas rozwiązywania problemów pojawiających się po obu stronach granicy. Dzięki realizacji projektu doszło do wymiany doświadczeń, dostosowania systemu i reguł współpracy oraz poprawy oferowanych przez instytucje włączone do projektu. W ramach projektu zrealizowano działania: - „System do znakowania i rejestracji rowerów”, - „Promocja”, - „Szkolenia Językowe”, - „Konferencja Karwina”, - „Konferencja Jastrzębie”, - „Warsztat”, - „Film”.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.07.2017–30.10.2018	- Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania: 2	158 268,04 Źródło: UE BM
36.	Żelazny szlak rowerowy	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	W ramach działań projektu: - stworzono sieć ścieżek i tras rowerowych prowadzącej po zabytkach przemysłowych	PO-I) przestrzenna	Projekt zrealizowany:	- Długość nowo wybudowanych ścieżek	1 304 782,96 Źródło:

			i kolejnictwa z XIX wieku, -szlak będzie miał charakter dydaktyczny, został uzupełniony o tablice informacyjne dotyczące historii poszczególnych elementów dziedzictwa historycznego i kulturowego, - zostały stworzone punkty geocachingu i gry dydaktyczne -poznawczej, -działania informacyjno-promocyjne dotyczące unikatowego szlaku. w Mieście Jastrzębie-Zdrój: Zakres pierwszego etapu robót obejmował budowę nowej trasy rowerowej na odcinku 370,3 m od granicy z Gminą Godów. Opracowanie obejmuje także budowę zjazdu, drogi dojazdowej wraz z organizacją ruchu oraz wykonanie miejsca rekreacyjnego i pozostałej infrastruktury. Zakres drugiego etapu robót obejmuje budowę nowej trasy rowerowej na odcinku 215,0 m od granicy z Gminą Zebrzydowice. Opracowanie obejmuje także budowę zjazdu z organizacją ruchu oraz wykonanie pozostałej infrastruktury.	PO -III) społeczna	01.01.2017– 30.11.2018	rowerowych i tras rowerowych: 0,585 km	BM UE
37.	V polsko- czeskie spotkania branżowe	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój PARTNERZY Miasto Hawierzów Miasto Karwina	Celem trzech samorządów jest tworzenie przestrzeni do prowadzenia współpracy transgranicznej swoich podmiotów oraz wspieranie ich w tych działaniach, co ma doprowadzić do aktywizacji działań transgranicznych w różnych obszarach tematycznych, których korzyść odczuwać będą mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Kolejna edycja projektu jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie – jakie od dłuższego czasu zgłaszają m.in. szkoły, stowarzyszenia, kluby sportowe – w kontekście finansowego wsparcia swojej działalności w ujęciu transgranicznym. W ramach projektu powołano sześć tematycznych grup branżowych: sport, kultura (poszerzono o turystykę); edukacja; bezpieczeństwo publiczne; biznes; polityka młodzieżowa; samorząd lokalny, gdzie wyłoniono polskich i czeskich liderów tych grup. Nad pracą grup oraz charakterem poszczególnych spotkań czuwał każdorazowo lider grupy. Oprócz zaplanowanych w projekcie spotkań odbywały się także dodatkowe spotkania, wynikające z potrzeb danej grupy. Realizacja projektu pozwoliła	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 2016	- Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania: 3 - zrealizowane projekty we współpracy transgranicznej: 7	129 799,95 Źródło: UE BP BM

			zweryfikować potencjał współpracy transgranicznej we wskazanych w projekcie obszarach tematycznych. Trudną w prowadzeniu projektowym okazała się grupa Biznes, z uwagi na specyfikę tej grupy (indywidualne potrzeby biznesowe każdego uczestnika) oraz bardzo lokalne potrzeby przedstawicieli tego obszaru kierowane do poszczególnych samorządów. Ciekawym doświadczeniem były działania promocyjne, realizowane poza obszarem wsparcia. w Ambasadach RP w Pradze oraz RCZ w Warszawie zaprezentowano m.in. prowadzoną z powodzeniem intensywną aktywność transgraniczną pomiędzy miastami. O randze tych wydarzeń świadczy fakt, iż zechcieli w nich uczestniczyć przedstawiciele instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego oraz eksperci. Oba eventy były pozytywnie odebrane i komentowane przez zgromadzonych gości. Można sądzić, iż działanie to może mieć swoje pozytywne efekty w okresie trwałości projektu.				
39.	Profesjonalne pracownię w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	W ramach projektu: I. Wyposażono pracownię do praktycznej nauki zawodu technik elektryk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w: 1. Stoły elektrotechniczne 2. Zestaw do badania silników asynchronicznych 3. Zestaw do badania maszyn 4. Zestaw do badania instalacji elektrycznej II. Wyposażono pracownię do praktycznej nauki zawodu chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju w: a) Stanowisko demonstracyjne Pompa ciepła b) Stanowisko wolnostojące - Badanie rekuperatora c) Modułowe stanowisko dydaktyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne stanowisko wolnostojące d) Stanowisko montażowe sprężarkowych układów chłodniczych – stanowisko na biurko e) Stanowisko montażowe zestawu klimatyzacyjnego w budynku – stanowisko wolnostojące	PO-III) społeczna PO-I) przestrzenna	Projekt zrealizowany: 30.08.2018 – 29.03.2019	- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 260 - Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego: 2 - Liczba placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 2	935 700,00 Źródło: UE BP BM


			f) Dydaktyczna instalacja chłodnicza - stanowisko wolnostojące g) Zestaw do lutowania twardego h) Stacja napełniania czynnika R134A i R410A i) Stacja odzysku czynnika R134A i R410A j) Stół montażowy z rozdzielnicą k) System klimatyzacji Climatronic III. Wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w: 1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe 2. Stanowiska instalatorskie				
--	--	--	--	--	--	--	--

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Podsumowanie:

W okresie **od roku 2016 do marca 2019 roku** (pierwszy okres sprawozdawczy) zrealizowano w pełni **22 projekty, co stanowi 34,4%** wszystkich projektów listy głównej. Budżet projektów zrealizowanych w tym okresie wyniósł **3 138 727,69 zł**.

Wykres 1 Stan realizacji projektów do marca 2019 roku

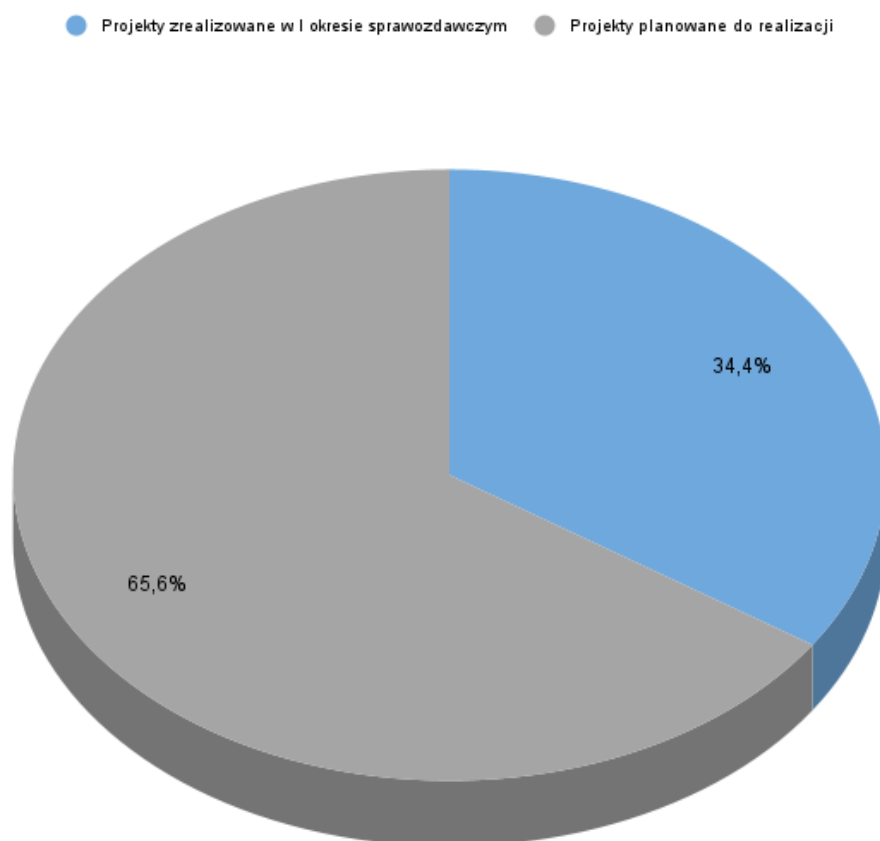

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Przedmiotowe projekty ukierunkowane były na:

1. Działania aktywizujące osoby mniej uprzywilejowane w społeczeństwie, takie jak osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami lub osoby zagrożone ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym:
 - Edukacyjne i sportowe zajęcia dla seniorów w formie warsztatów na rzecz zdobywanej umiejętności i uczenia przez całe życie, związanych m.in. z poprawą umiejętności językowych mieszkańców, pielęgnacją ich talentów i zainteresowań oraz poprawą ich kondycji fizycznej. Uczestnikami warsztatów w dużej mierze były osoby w wieku 50 lat i więcej. w sumie liczba osób starszych biorących udział w warsztatach wyniosła 977,
 - Zajęcia, których celem było produktywne zagospodarowanie czasu wolnego wśród mieszkańców - szczególnie osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Organizowano liczne warsztaty (50), a w ramach działań wsparciem objęto 30 osób z niepełnosprawnościami, 60 seniorów oraz 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 - W ramach projektu polegającego na wsparciu podmiotów ekonomii społecznej w ich rozwoju wsparto 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich wsparciem w programie.

Z powyższych działań projektowych skorzystało:

- 1037 seniorów,

- 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 - 30 osób z niepełnosprawnościami.
2. Działania związane ze współpracą transgraniczną:
- W ramach Festiwalu organizacji pozarządowych zorganizowano warsztaty poświęcone współpracy transgranicznej.
 - Głównym celem projektu „Transgraniczne zaczytanie” była organizacja warsztatów językowych związanych ze współczesną literaturą polsko-czeską, wydanie polsko-czeskiego poradnika językowego zawierającego tekst i zdjęcia obiektów kulturalnych pogranicza oraz integracja młodzieży polskiej i czeskiej na jarmarku książkowym w Karwinie. Spotkanie połączone było ze zwiedzaniem Biblioteki oraz Pałacu we Frysztacie. w warsztatach wzięło udział 252 osób, natomiast ze wspólnych programów edukacyjnych oraz przygotowania zawodowego w celu transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży, zwiększenia możliwości edukacyjnych kształcenia wyższego i przygotowania zawodowego, skorzystało 238 uczestników,
 - Działania jednego z projektów skupiały się na intensyfikacji współpracy transgranicznej straży miejskiej w Karwinie i w Jastrzębiu-Zdroju. Dla przedstawicieli służb zrealizowano m.in. lekcje czeskiego, konferencję nt. profilaktyki antynarkotykowej oraz środków odurzających, oraz konferencję dla służb i przedstawicieli miast nt. prewencji kryminalnej. Dzięki realizacji projektu doszło do wymiany doświadczeń, dostosowania systemu i reguł współpracy oraz poprawy oferowanych przez instytucje włączone do projektu. w projekcie wzięło udział dwóch partnerów,
 - Zorganizowano polsko-czeskie spotkania branżowe związane ze współpracą transgraniczną w różnych obszarach tematycznych, których korzyści mieli odczuwać mieszkańcy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów. w ramach projektu powołano sześć tematycznych grup branżowych: sport, kultura (poszerzono o turystykę), edukacja, bezpieczeństwo publiczne, biznes, polityka młodzieżowa, samorząd lokalny. Wyłoniono polskich i czeskich liderów tych grup. w ramach tego zadania zrealizowano 7 projektów we współpracy transgranicznej.

Korzyści z realizacji projektów w formie wskaźników:

- Ilość partnerów zaangażowanych w działania transgraniczne: 3,
- Ilość projektów zrealizowanych we współpracy transgranicznej: 7,
- Ilość uczestników wspólnych programów edukacyjnych oraz przygotowania zawodowego w celu transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży, zwiększenia możliwości edukacyjnych kształcenia wyższego i przygotowania zawodowego: 238,
- Ilość uczestników warsztatów: 252.

3. Działania związane z szerzeniem wiedzy na temat ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i planów rozwoju:

- Organizacja Festiwalu organizacji pozarządowych. w ramach tego zadania odbyły się warsztaty m.in. o tematyce: ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju, stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach Publicznych oraz wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych. w ramach zadania zorganizowano także forum będące okazją do wymiany doświadczeń wśród organizacji pozarządowych. w ramach projektu zrealizowano 10 warsztatów, liczba organizacji pozarządowych biorących udział w Forum wyniosła 16, a liczba innych podmiotów biorących udział w wydarzeniu wyniosła 20,
- Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ich rozwoju i tworzeniu poprzez udzielanie informacji dot. uzyskiwania środków, prowadzenia działalności. w ramach tego zadania utworzono 3 organizacje zajmujące się doradztwem. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 21. Liczba nowopowstałych miejsc pracy: 7.

Korzyści z realizacji projektów związanych z ekonomią w formie wskaźników:

- Organizacja warsztatów ekonomicznych w ilości: 10,
- liczba organizacji pozarządowych biorących udział w Forum: 16,
- liczba innych podmiotów biorących udział w Forum: 20,
- Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 21,

- Liczba nowopowstałych miejsc pracy: 7.
4. Wydarzenia kulturalne i sportowe o charakterze integracyjnym, zorganizowane dla mieszkańców poszczególnych osiedli w celu ich aktywizacji oraz budowania sąsiedzkich relacji:
- Wydarzenia zorganizowane dla mieszkańców osiedla Gwarków. Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 6,
 - Wydarzenia zorganizowane dla mieszkańców osiedla Zofiówka. Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 4,
 - Wydarzenia zorganizowane dla mieszkańców osiedla 1000-lecia. Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 2,
 - Wydarzenia zorganizowane dla mieszkańców osiedla Jastrzębie Dolne i Górne. Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 5,
 - Wydarzenia zorganizowane dla mieszkańców Osiedla Przyjaźń. Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 6,
 - Wydarzenie zorganizowane dla mieszkańców dla Osiedla Zdrój. Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 3.

Korzyści z realizacji projektów integracyjnych skierowanych dla mieszkańców poszczególnych osiedli w formie wskaźników:

- Suma wydarzeń: 26.
5. Działania kulturalne związane z zagadnieniami takimi jak: film, muzyka, teatr, rozrywka, będące okazją do integracji międzypokoleniowej:
- „Festiwal sztuk wszelakich” to projekt, w ramach którego zorganizowano m.in. spektakle, koncerty, wystawę fotograficzną, spotkania autorskie oraz warsztaty edukacyjno-artystyczne. w projekcie wzięło udział 10 organizacji. w sumie w ramach zadania zorganizowano 29 wydarzeń, w których wzięło udział 1381 uczestników.
 - „Jarmark sztuki- Wiosna Ludów”, to projekt, w ramach którego odbyły wydarzenie artystyczne, muzyczno-teatralne, przybliżające nurty w dziedzinie muzyki i sztuki. W spotkaniach udział wzięło 500 osób w tym 3 artystów poniżej 25 roku życia.
 - Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, w ramach którego miał miejsce m.in. pokaz iluzjonisty, spektakl, pokaz tańca, pokaz psich sztuczek oraz pokaz młodych talentów prezentowanych przez 500 dzieci. w ramach zadania zorganizowano 9 animacji i zaangażowano 34 artystów. w festynie wzięło udział 3950 osób.
 - „Jastrzębskie lato muzyczne” to cykl 12 koncertów, spotkań z artystami i muzykami z polski i zagranicy, w których zaprezentowało się 11 wykonawców. w koncertach wzięły udział osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w liczbie 4750.
 - W ramach projektu „Muzyczne środy” zorganizowano 9 koncertów muzycznych, a na każdym z nich występował artyści reprezentujący inny gatunek muzyczny. Na scenie wystąpiło 9 artystów, a koncerty zobaczyło 3450 uczestników.
 - Cykl seansów filmowych na świeżym powietrzu w ramach projektu „Letnie kino parkowe”. Zorganizowano 13 pokazów polskich i zagranicznych filmów. z oferty skorzystało 1150 widzów.
 - Impreza plenerowa w klimacie lat 20 i 30 (dancing, przejażdżka automobilem, fryzjer, pucybut). w ramach zadania miało również miejsce wydarzenie promujące książkę „Letnisko Oficerskie”. Projekt polegał więc na organizacji dwóch wydarzeń, w których łącznie występowało 6 artystów. w wydarzeniach wzięło udział 1000 osób.

Korzyści z realizacji projektów kulturalnych w formie wskaźników:

- Liczba organizacji biorących udział w festiwalu: 10,
- Liczba artystów (zespołów lub wykonawców) biorących udział w wydarzeniach: 60,
- Liczba wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców: 31,
- Liczba zorganizowanych koncertów: 21,
- Liczba zorganizowanych pokazów filmowych: 13,
- Liczba zorganizowanych zabaw i animacji: 9,

- Liczba dzieci biorących udział w prezentacji młodych talentów: 500,
 - Liczba osób korzystających z oferty: 15 681.
6. Działania ukierunkowane na poprawę infrastruktury miejskiej:
- Budowa szlaku rowerowego o długości 0,585 km – sieć ścieżek i tras o charakterze dydaktycznym, prowadzące po zabytkach przemysłowych oznaczonych tablicami informacyjnymi.
7. Dopuszaenie Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju i utworzenie profesjonalnych pracowni do praktycznej nauki zawodów: technik elektryk oraz technik informatyk, oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju i utworzenie profesjonalnych pracowni do praktycznej nauki zawodu: chłodnictwo i klimatyzacja.

Korzyści z realizacji projektów w formie wskaźników:

- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 260
- Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego: 2
- Liczba placówek kształcenia zawodowego wykorzystujące doposażenie zakupione z EFS: 2.

3.2 PROJEKTY ZREALIZOWANE W OKRESIE OD KWIETNIA 2019 R. DO MAJA 2021 R.

Tabela 3 Projekty zrealizowane w okresie od kwietnia 2019 r. do maja 2021 r.

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Budżet [zł]
4.	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ na obszarze rewitalizowanym	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt polegał na realizacji działań w zakresie aktywizacji zawodowej, poprzez wykorzystanie instrumentów i usług rynku pracy: - służących indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, oraz — skierowanych do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji — służących zdobyciu doświadczenia zawodowego. Kierowany był do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, dla których ustalono i lub II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z grup: - osoba powyżej 50 roku życia, -kobiety, -osoby niepełnosprawne, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby o niskich kwalifikacjach.	PO II) gospodarcza PO III) społeczna	projekt zrealizowany: 01.03.2019 – 31.05.2021	- Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych: 27 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych: 16 - Liczba osób niepełnosprawnych zaplanowanych do objęcia wsparciem: 1 - Liczba osób 50 + zaplanowanych do objęcia programem: 6 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach: 27	254 616,25 Źródło: UE BP, Fundusz Pracy
5	Zmiana nazwy projektu 5.a — Praktyka i Praca — aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ 5.b. - Bliżej pracy — aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ Poprzedni tytuł: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w ramach działania 7.1.2 (Powiatowy Urząd Pracy	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt zakładał wsparcie uzupełniające dla działania 10.3.2 jako miękkie do projektu rewitalizowanego. Projekt zakładał zatrudnienie oraz utrzymanie stanowisk pracy przez okres, co najmniej równym odbywanym stażom / przygotowaniom zawodowym lub wynikający z zapisów umów o organizację prac interwencyjnych lub przez cały okres prac związanych z rewitalizacją wyznaczonego budynku / terenu. Wpłyne na sytuację osób na rynku pracy	PO III) społeczna PO II) gospodarcza	5.a - projekt zrealizowany 5.b. - projekt zrealizowany	Ad.5.a) Od początku realizacji do marca 2019 -Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 134 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 76 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 10 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 37 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 120	Ad.5.a 956 872,50 Źródło: UE BP, Fundusz Pracy Ad.5.b. 594 361,25 Źródło: UE BP, Fundusz Pracy SUMA: 1 553 233,75

	w Jastrzębiu-Zdroju)					- Liczba osób pracujących, po opuszczeniu programu: 82 - odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 76 - odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 80 - odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 67 - odsetek uczestników w wieku 50+ którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 64 - odsetek uczestniczek, które podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 78 Od kwietnia 2019 do maja 2021 - Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 10 - Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 88 - Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 90 - odsetek uczestników w wieku 50+ którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 100	
--	----------------------	--	--	--	--	---	--

						- odsetek uczestniczek, które podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 78 SUMA -Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 134 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 76 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 10 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 37 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 120 - Liczba osób pracujących, po opuszczeniu programu: 92 - odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 164 - odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 170 - odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: Od początku realizacji do marca 2019: 67 Od kwietnia 2019 do maja 2021: 0	
--	--	--	--	--	--	--	--

						- odsetek uczestników w wieku 50+ którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: Od początku realizacji do marca 2019: 64 Od kwietnia 2019 do maja 2021: 100 - odsetek uczestniczek, które podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: Od początku realizacji do marca 2019: 78 Od kwietnia 2019 do maja 2021: 78 Ad.5. b) Od początku realizacji programu do marca 2019 - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 61 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 34 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 6 -Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 15 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 61 - Liczba osób pracujących, po opuszczeniu programu: 38 - odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, które podejmą pracę w okresie	
--	--	--	--	--	--	---	--

						do 3 miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 79	
21.	Wsparcie w starcie poprzedni tytuł: Promocja samozatrudnienia na obszarze rewitalizowanym w ramach działania 7.3.2	SWIG Delta Partner PARTNER Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Grupę docelową stanowiły osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej ze znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup. W ramach projektu odbywały się rozmowy z doradcą oraz usługi szkoleniowo-doradcze, a także udzielane były dotacje na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie pomostowe.	PO II) gospodarcza	Projekt zrealizowany: 01.06.2018 – 31.07.2019	- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcia działalności gospodarczej w programie: 4 - Liczba osób, które wzięły udział w indywidualnych konsultacjach: 4 - Liczba wydanych zaświadczeń ukończenia kursów: 4	275 895,70 Źródło: UE BM
23. / 24	Ćwiczenie nie zna granic poprzedni tytuł: Siłownia na wolnym powietrzu Skate-park (Zarząd Osiedla „Zofiówka” przy współudziale Wydziału Infrastruktury i Inwestycji)	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Bogusława Marchewka, Przewodniczący Osiedla Zofiówka	Projekt polegał na: 1) przygotowaniu terenu, 2) przygotowaniu projektu inwestycji, 3) realizacji projektu — montaż urządzeń. Projekt powiązany jest z projektem „Skate park”.	PO I) przestrzenna PO III) społeczna	Projekt zrealizowany 02.07.2018 – 30.06.2019	- Liczba nowopowstałych obiektów na cele sportowe oraz rekreacyjne: 1	118 691,62 Źródło: UE BP BM
25	Wakacyjne warsztaty międzypokoleniowe Poprzedni tytuł: Słowo i obraz w przestrzeni międzypokoleniowej -- zajęcia o obszarze kultury i sztuki angażujące różne pokolenia (Miejska Biblioteka	Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju	Planowane działania skupiały się wokół zagadnień związanych z filmem, teatrem i fotografią i obejmowały: warsztaty, spotkania, wykłady i wizyty studyjne. Wszystkie wydarzenia kładły nacisk na integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.07.2019 – 29.08.2019	- Liczba zrealizowanych działań: 8 - Liczba uczestników: 150	4 060,00 Źródło: Środki własne Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej

	Publiczna, Jastrzębie-Zdrój)						
38	38.a. Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju 38.b. Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w ZS 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju poprzedni tytuł: Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego	Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju	Pierwotnie projekt pn. „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” nie uzyskał dofinansowania, jednakże został zrealizowany na podstawie dwóch projektów: 38. a. umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju 38.b. Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w ZS 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju	PO-I) przestrzen a PO III) społeczna	Ad.38.a. Projekt zrealizowany: 2019 - 2021 Ad.38.b. Projekt zrealizowany: 2019 - 2021	- Liczba szkół i kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 2 - Liczba osób objętych wsparciem -\ instytucje objęte wsparciem: 160	Ad.38.a 314 151,25 Źródło: UE BM Ad.38.b 774 766,80 Źródło: UE BP BM SUMA: 1 088 918,05
41.	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt obejmował rozbudowę, termomodernizację i przebudowę Szkoły Podstawowej nr 1 na Zespół Szkłono- przedszkolny w zakresie: •drogi pożarowej; •25 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych; •placu zabaw dla dzieci; •ogrodzenia;	PO-I) przestrzen a	Projekt zrealizowany: 23.05.2017 – 15.12.2020	- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 1550.83 m2 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt. - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 1 szt.	13 646 755,60 Źródło: UE BP BM

	wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju poprzedni tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 i PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju		•elementów małej architektury; •wycinki oraz przesadzeniu części drzew, a także wykonanie nowych nasadzeń; •wiaty śmietnikowej; •przyłącza mediów; •chodników oraz schodów terenowych •rozbiórki istniejącego dawnego domu nauczyciela; •termomodernizacji budynku – ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachu; •przebudowy sanitariatów na poziomie parteru i piętra; •rynny i rur spustowych; •instalacji gazowych, odgromowych, fotowoltaicznych, elektryczne, oświetlenia zewnętrznego, dozorowych obiektu i otoczenia (kamery), teletechniczna; •kanalizacji sanitarnej, deszczowej; •wentylacji grawitacyjnej, wspomaganej wentylatorami mechanicznymi. a nade wszystko zastąpieniu kotłowni węglowej nowoczesnym i energooszczędnym sposobem ogrzewania za pomocą kotła opalanego gazem, wspomagany energią pochodzącą z ogniw fotowoltaicznych.			- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 736.86 GJ/rok - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny): 180147.2 kWh/rok - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 736.86 GJ/rok - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 15.692 MWh/rok - Stopień redukcji PM10: 0.000584 tony/rok	
42.	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt swoim zakresem obejmował m.in.: I. Inwentaryzację obiektu II. Roboty termoizolacyjne III. Dostosowanie obiektu do przepisów IV. Przebudowa wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych V. Remont wejść VI. Przebudowa łazienek (dostosowanie do aktualnych przepisów) VII. Przebudowa kuchni (dostosowanie do aktualnych przepisów) VIII. Roboty instalacyjne	PO-I) przestrzena	Projekt zrealizowany: 23.05.2017 – 21.12.2020	- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 2573 m² - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt. - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 927.86 GJ/rok - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 45.6754 MWh/rok - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny): 420767.2 kWh/rok - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1092.160 GJ/rok	10 975 775,57 Źródło: UE BP BM

	poprzedni tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju					- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 16.15200 MWhe/rok Stopień redukcji PM10: 0.0006 tony/rok	
47	Drugi Dom Poprzednia nazwa: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie miejsc w Zakładach Opieki Długoterminowej, w którym uzyskają krótkookresową całodobową opiekę osoby niesamodzielne w zastępstwie opiekunów faktycznych	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt polega na utworzeniu miejsc w Zakładach Opieki Długoterminowej, w których uzyskają krótkookresową, całodobową opiekę osoby niesamodzielne w zastępstwie opiekunów faktycznych. Osoby uczestniczące w projekcie poza opieką lekarską, pielęgniarczą zostaną objęte kompleksową rehabilitacją oraz opieką psychologiczną. Ponadto do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów będą adresowane działania edukacyjne, które będą obejmowały następujące zagadnienia: nauka zachowań prozdrowotnych, prawidłowe odżywianie, umiejętność radzenia sobie w warunkach domowych.	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 2019 - 2021	- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 10 - Liczba osób zaangażowanych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 80	795 555,46 UE BP
52.	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju poprzedni tytuł:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt polegał na świadczeniu usług zdrowotnych ponadstandardowych, na działalności edukacyjnej i profilaktycznej z różnych dziedzin oraz na szeroko pojętym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych mających zastosowanie w teleopiece. Wśród zaplanowanych działań należy wymienić: a) Objęcie pacjentów teleopieką (Kardio Tel/ Bezpieczny senior/KTG, czyli zdalna opieka nad ciężarną) b) Ponadstandardowe wizyty patronażowe realizowane przez położne POZ c) Aktywizacja poprzez stworzenie możliwości skorzystania z zaplecza Szpitala - Sala ćwiczeń z dowozem pacjentów na w/w ćwiczenia, d) Działalność edukacyjną i profilaktyczną z różnych dziedzin, między innymi profilaktyka	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.01.2014 – 2020	- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu: 1 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych: 1 - Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi: 65 000 - Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej: 1 876 580,24	11 462 158,33 Źródło: RPO WSL Środki własne Szpitala PFRON Dotacja WSL

	Czym zaskoczyć świadczeniobiorcę, czyli niestandardowo w Poradniach Specjalistycznych Przyszpitalnych, Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Pracowniach diagnostycznych i zabiegowych WSzZ Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju		chorób przewlekłych, wykorzystanie działalności poradni dietetycznej, nowoczesne materiały edukacyjne a w nich treści dotyczące np. zapobieganie odleżynom, właściwego odżywiania. e) uruchomienie nowatorskich metod leczenia ran przewlekłych w Poradni Chirurgii Ogólnej, na bazie współpracy z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, f) objęcie mieszkańców koordynowaną opieką kardiologiczną, rehabilitacyjną i ortopedyczną, g) uruchomienie jedynej w Mieście Poradni Neonatologicznej.				
53.	Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekłe chorych i starszych, oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu poprzedni tytuł: Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Oddział Neurochirurgii,	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt obejmował: Zakup aparatury medycznej oraz wyposażenia Roboty budowlane	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 29.01.2018 – 2020	- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu: 1 . - Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi: 1990 - Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej: 654 725,47	9 376 594,03 Źródło: UE Środki własne Szpitala

	Zakład Diagnostyki Obrazowej – usługi ponadstandardowe jako wzmocnienie świadczeń realizowanych w ramach umowy z NFZ						
55.	Termomodernizacja wraz z zabudową instalacji solarnej budynku przychodni zdrowia „ORTHO GON” w Jastrzębiu-Zdroju	„ORTHO GON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Projekt zakładał kompleksową termomodernizację budynku przychodni zdrowia, w ramach której zostały wykonane następujące prace: ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, modernizacja c.w.u. i montaż kolektorów słonecznych, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo przewiduje się modernizację oświetlenia wewnętrznego budynku poprzez wymianę opraw ze świetlówkami liniowymi oraz żarówek na źródła światła w technologii LED. Łącznie do wymiany przewidziano 278 opraw	PO-I) przestrzenna	Projekt zrealizowany: 2019 – 2021	- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 199,01 CO₂, - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 15 szt. - Stopień redukcji ilości pyłu PM10: 0,02771 tony/rok, - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 20.582 MWh/rok, - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1461.8 GJ/rok - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1512 GJ/rok	1 367 377,36 Źródło: UE Środki własne „ORTHO GON”
58	58.a Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży górniczo - wiertniczej 58.b E-ambasador Poprzedni tytuł: Nowe szanse integracji i rozwoju	JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju	Ad.58. a. Projekt obejmował opracowanie dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 7 zawodów szkolnictwa branżowego (branża górniczo- wiertnicza), dla których określone zostały efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z programami ich nauczania we współpracy z trzema pracodawcami.	PO-II) gospodarcza PO-III) społeczna	Projekt zrealizowany: 2020 – 2021	- Liczba zawodów, w których osoby kształcące się w zawodach lub osoby dorosłe posiadające kwalifikacje zawodowe będą mogły uzyskać dodatkowe umiejętności zawodowe opracowane w ramach Programu: 7 -Liczba programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów opracowanych we współpracy z pracodawcami: 19	Ad.58.a. 783 750,00 Źródło: UE


	społeczno-zawodowego						
60	60.a. Sektorowa Rama Kwalifikacji w Górnictwie poprzedni tytuł: Nowe szanse rozwoju w JSWSiG	JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju	Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla Górnictwa w Polsce	PO-II) gospodarcza PO-III) społeczna	Ad.60.a Projekt zrealizowany: 2020r	Ad.60.a. Dostarczenie ostatecznego produktu (raportu końcowego oraz prezentacji multimedialnej): 1	Ad.60.a. 600 000,00 Źródło: UE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Podsumowanie:

W okresie od kwietnia 2019 r. do maja 2021 (drugi okres sprawozdawczy) zrealizowano w pełni 14 projektów, co stanowi 21,9% wszystkich projektów listy głównej na łączną wartość 52 597 865,52 zł.

Wykres 2 Stan realizacji projektów od kwietnia 2019 r. do maja 2021

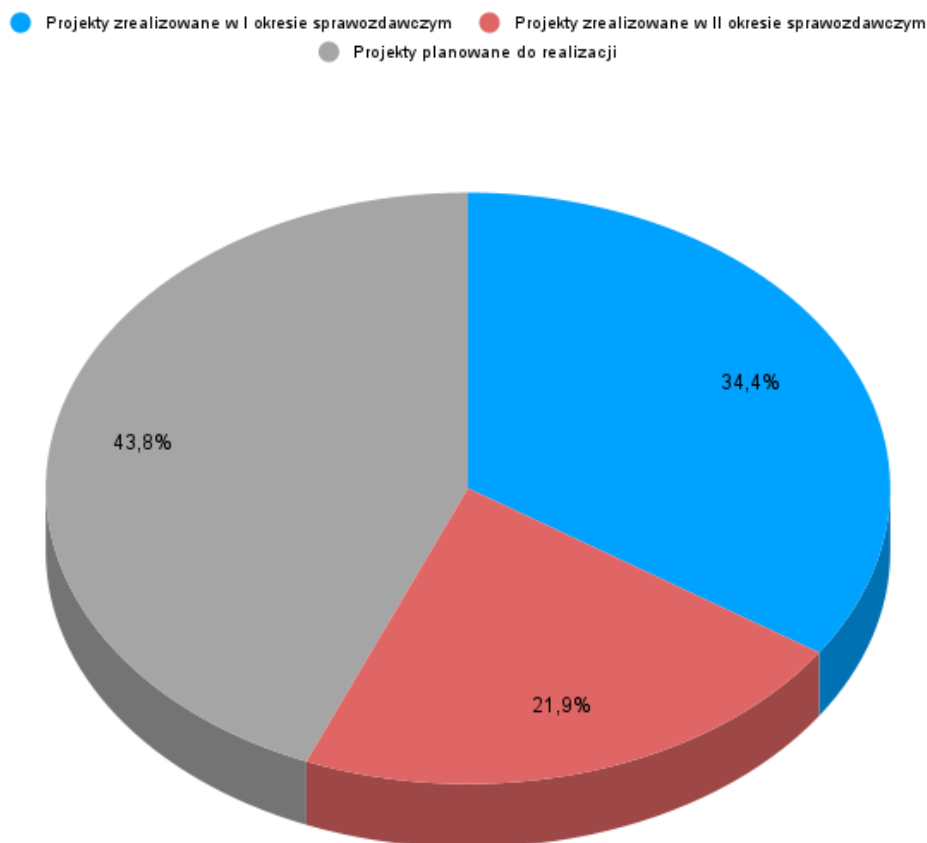

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Przedmiotowe projekty ukierunkowane były na:

1. Aktywizację zawodową osób zamieszkujących obszar rewitalizacji. w szczególności dotyczyła ona:
 - Organizacji praktyk i zatrudnienia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych w wieku 30+,
 - Udzielania wsparcia finansowego na zakładanie własnej działalności gospodarczej dla osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
 - Opracowania programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych dla branży górniczo-wiertniczej,
 - Rozwijania kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy uczniów szkoły zawodowej.

W ramach podjętych działań wsparciem objęto:

- Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach: 222,
 - Osoby niepełnosprawne: 17,
 - Osoby pracujące po uzyskaniu wsparcia: 130.
2. Aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu. w ramach prowadzonych działań wybudowano siłownię na wolnym powietrzu z elementami do street workout.
 3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta. Działania obejmowały:

- Budynek Szkoły Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju (termomodernizacja, odnawialne źródła energii),
- Budynek przychodni zdrowia Orthogon (termomodernizacja, odnawialne źródła energii),
- Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 (termomodernizacja, odnawialne źródła energii) wraz z rozbudową na cele PP7.

W ramach podjętych osiągnięto następujące wyniki:

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 4 124 m²,
- Zmodernizowano lub wybudowano 16 jednostek źródeł ciepła,
- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 3 126,52 GJ/rok,
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 66,26 MWh/rok,
- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 31,84 MWh/rok,
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 60 0914,4 kWh/rok,
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej: 3 341,02 GJ/rok,
- Redukcji PM10: 0,0289 tony/rok,

4. Poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia. Podjęte działania obejmowały:

- Poprawę dostępności z zakresu podstawowej opieki ambulatoryjnej oraz
- Przebudowę i doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz zakładu Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2,
- Utworzenie miejsca w Zakładach Opieki Długoterminowej z całodobową opieką dla osób niesamodzielne w zastępstwie opiekunów faktycznych.

W ramach podjętych osiągnięto następujące wyniki:

- Dostosowano 1 obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- Do ulepszonych świadczeń zdrowotnych uzyskało dostęp 66,99 tys. osób.

5. Dodatkowo też w ramach pojedynczych projektów:

- Zorganizowany zostały warsztaty międzypokoleniowe podczas 8 spotkań, w których wzięło udział 150 osób.
- Wykonano projekt sektorowych ram kwalifikacji dla Górnictwa w Polsce.

3.3 PROJEKTY ZREALIZOWANE W OKRESIE OD CZERWCA 2022 R. DO PAŹDZIERNIK 2022 R.

Tabela 4 Projekty zrealizowane od czerwca 2021 do października 2022

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Budżet [zł]
1.	O krok do przodu Wsparcie dla osób z terenów rewitalizowanych	Ośrodek Pomocy Społecznej	Projekt ma na celu pobudzenie aktywności lokalnej dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. W ramach projektu kontynuowane są prace Klubu Integracji Społecznej przy ul. Wrzosowej 4-8-12 w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społeczno-zawodowej uczestników projektu. Realizowane są również: - Praca socjalna z uczestnikami projektu prowadząca do motywowania i wspomagania uczestników do osiągnięcia możliwie pełnej aktywności zawodowej, - Zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym treningi, warsztaty, szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, - Organizacja grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, - Zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla rodzin z grup wsparcia, - Praca asystenta dla osób niepełnosprawnych i opiekunów w mieszkaniu chronionym dla osób niepełnosprawnych, - Prowadzenie terapii uzależnień w noclegowni dla bezdomnych, - Praca asystenta usamodzielniania w mieszkaniach chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.	PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 01.01.2018 - 3.10.2021	Osiągnięte wskaźniki: 1.01.2018 - marzec 2019 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu: 11 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 20 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 6 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 83 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 23 Kwiecień 2019 - maj 2021 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu: 42 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 31 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 23 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 124 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 20 Czerwiec 2021 - czerwiec 2022	2 049 826,91 Źródło: UE Środki własne OPS

22						- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu: 15 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 9 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 1 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 0 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 0 SUMA: - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu: 68 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 60 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 30 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 207 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 43	
	Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 na potrzeby mieszkaniowe i społeczne Poprzedni tytuł: Przebudowa	Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój	Projekt polegał adaptacji budynku (roboty budowlane i instalacyjne) 15 lokali tymczasowych oraz 4 lokali mieszkalnych na potrzeby osób niepełnosprawnych.	PO I) przestrzenna, PO III) społeczna	Projekt zrealizowany: 24.04.2019 - 25.11.2021	- Liczba wybudowanych/przebudowanych /wyremontowanych/objętych innym robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej: 1 - Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 64	2747572,26 Źródło: MZN

	i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu (Miejski Zarząd Nieruchomości)						
32	Krok w przód Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju poprzedni tytuł: Promocja samozatrudnienia na obszarze rewitalizowanym w ramach działania 7.3.2	SWIG Delta Partner PARTNER Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Zadania w projekcie oparte są na aktywizacji zawodowej poprzez wykorzystanie instrumentów i usług rynku pracy: - służących indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej; - skierowanych do osób, u których zidentyfikowano potrzebę zdobycia /uzupełnienia umiejętności i kompetencji; - służących zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących teren objęty rewitalizacją, dla których ustalono I lub II profil pomocy, będących powyżej 30 r. życia oraz należących do co najmniej jednej z grup: - os. powyżej 50 r. życia; - kobiety; - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne; - osoby o niskich kwalifikacjach. Realizowane są: - pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego prowadzonych na podstawie przygotowanego dla każdego Indywidualnego Planu Działania. - szkoleń dla uczestników; - staży/przygotowanie zawodowe; - prac interdyscyplinarnych.	PO-III) społeczna PO-I) przestrzenna	Projekt zrealizowany: 01.07.2018 – 30.09.2021	Osiągnięte wskaźniki: 01.07.2018 - marzec 2019 - Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: 7 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 56 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje pracujących (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek): 22 Kwiecień 2019 - marzec 2021 - Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: 7 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 12 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje pracujących (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek): 7 Czerwiec 2021 - czerwiec 2022 -Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: 7 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 46	1 448 729,00 Źródło: UE BP

						- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje pracujących (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek): 16 SUMA: -Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: 7 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 114 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje pracujących (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek): 45	
40.	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju	SWIG Delta Partner	W ramach projektu zostanie podjętych szereg działań mający na celu poprawę jakości edukacji w 3 szkołach zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju: Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Handlowych, Zespół Szkół nr 2, we współpracy z pracodawcami. Realizacja projektu zakłada: -organizację praktyk i staży zawodowych (związane z pogłębieniem wiedzy w warunkach pracy i wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego, -wsparcie udzielane nauczycielom w postaci szkoleń i studiów podyplomowych, -doradztwo edukacyjno-zawodowe. -organizację kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do egzaminów certyfikowanych.	PO-III) społeczna PO-I) przestrzenna	Projekt zrealizowany: 01.09.2018 - 31.11.2021	Osiągnięte wskaźniki: 01.09.2018 - marzec 2019 - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 23 - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 4 Kwiecień 2019 do marzec 2021 - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 180 - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 4 Czerwiec 2021 - czerwiec 2022 - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 36	1 530 811,54

						- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 1 SUMA: - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 239 - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 9	
60.	60.b. Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (SENSE VR) Poprzedni tytuł: Nowe szanse rozwoju w JSWSiG	JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt obejmuje opracowanie Algorytmu Wykrywania Zachowań (AWZ) użytkownika sieciowej aplikacji VR, opracowanie metody tworzenie scenariuszy szkoleniowych dla szkoleń realizowanych z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości oraz opracowanie metody przeprowadzania szkoleń z wykorzystaniem rozgałęzionych scenariuszy w adaptacyjnym środowisku VR.	PO-II) gospodarcza PO-III) społeczna	Projekt jest w trakcie realizacji: 2.12.2020 - 31.12.2022	Osiągnięte wskaźniki stan na i półrocze 2022: - Liczba przeszkolonych osób [osoby]: 194	3 239 990,72 Źródło: UE własne
61	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej	Miasto Jastrzębie-Zdrój	Projekt polega na stworzeniu miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju. w tym celu zostaną poddane kompleksowemu remontowi, plac główny i plac reprezentacyjny, park wraz z Muszlą Koncertową oraz przyległymi alejkami, wraz z małą architekturą i częścią promenady głównej.	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Projekt zrealizowany: 03.2019-10.2022	- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 - Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów wiejskich: 25823 - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1,17 ha - Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 1310	10 706 189,82 Źródło: UE BP Własne JST


64	mieszkańców rewitalizowanych terenów						
	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta.	Miasto Jastrzębie-Zdrój	W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększona efektywność energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Jastrzębia-Zdrój. Dzięki ograniczeniu zapotrzebowania budynku na ciepło, obniżone zostaną także wskaźniki emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Przede wszystkim jednak, dzięki realizacji Projektu powstanie w pełni funkcjonalny budynek, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniający wszystkie wymagania sanitarno-higieniczne, który zagospodarowany zostanie na cele związane z aktywizacją społeczno-gospodarczą miasta.	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Projekt zrealizowany: 04.2020 - 03.2022	- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 1768,62 m² - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO₂]: 143,00396 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 43,21061 MWh/rok - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1165,72 GJ/rok - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1321,28 GJ/rok - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny): 453441,67 kWh/rok - Stopień redukcji PM10: 0,62005 tony/rok	7 011 814,08 Źródło: UE BO Własne JST

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Podsumowanie:

W okresie od czerwca 2021 r. do października 2022 (trzeci okres sprawozdawczy) zrealizowano w pełni 7 projektów, co stanowi 10,9% wszystkich projektów listy głównej na łączną wartość 27 965 198,33 zł.

Wykres 3 Stan realizacji projektów od czerwca 2021 r. do października 2022

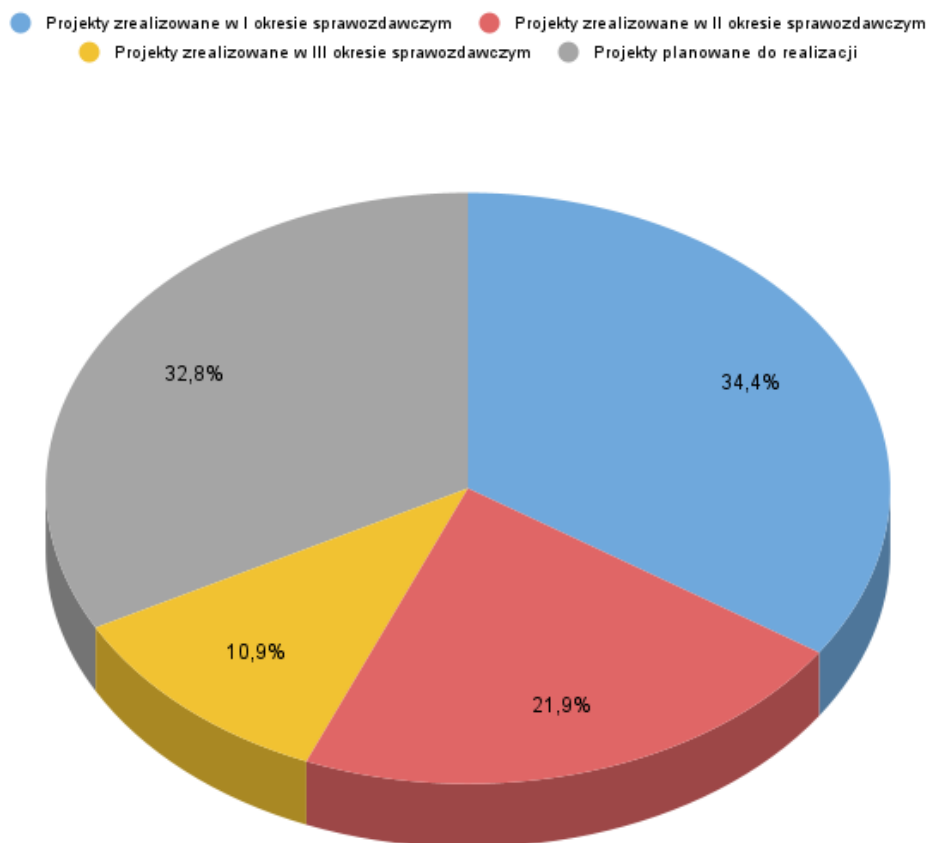

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Projekty z tej grupy dotyczyły następujących obszarów rewitalizacji:

1. Aktywizacji i wyrównywania szans mieszkańców z obszaru rewitalizacji, m.in. poprzez:
 - Kontynuację działalności Klubu Integracji Społecznej, realizującego zadania reintegracji społeczno-zawodowej uczestników projektu (motywowanie do aktywności zawodowej, wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych, wsparcie osób niepełnosprawnych itp.),
 - Aktywizację zawodową mieszkańców, dla których ustalono I lub II profil pomocy (będących powyżej 30 lub 50 r. życia oraz będących kobietami, osobami z niepełnosprawnościami, osobami długotrwale bezrobotnymi lub osobami o niskich kwalifikacjach),

W ramach podjętych działań wsparciem objęto:

- Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 321
- Osoby z niepełnosprawnościami: 43

2. Aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych
 - Wsparcie nauczania zawodowego dla uczniów szkół zawodowych poprzez staże i praktyki zawodowe. W ramach działania wsparciem objęto uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 239
3. Działań infrastrukturalnych dotyczących takich obszarów rewitalizacji, jak:

- Adaptacji lokali tymczasowych oraz lokali mieszkalnych na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Gagarina 116. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 64,
- Rewitalizacji części zabytкового Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 1310
- Przebudowy i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta.

W ramach podjętych działań osiągnięto następujące wyniki:

- Obiekty objęte robotami budowlanymi, poddane rewitalizacji: 2
- Obiekty zmodernizowane energetycznie: 1
- Zaoszczędzono energię elektryczną: 43,21061 MWh/rok
- Zaoszczędzono energię cieplną: 1165,72 GJ/rok
- Zmniejszono zużycie energii końcowej o: 1321,28 GJ/rok
- Zmniejszono zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych o: 453441,67 kWh/rok
- Zredukowano emisję PM 10 o 0,62005 tony/rok

3.4 PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

Tabela 5 Projekty w trakcie realizacji

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Termin realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu do marzec 2021	Planowany budżet [zł]
3.	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt polegał na realizacji usług i instrumentów rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2015 poz. 149 z późn. zm.) na rzecz 72 bezrobotnych mieszkańców obszaru wsparcia. Realizowane są i będą: - pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe prowadzone w oparciu o przygotowany dla każdego uczestnika indywidualny Plan Działania, - szkolenia zawodowe dla 18 uczestników projektu, - staże dla 18 uczestników projektu, - prace interwencyjne dla 12 uczestników projektu. - refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 12 uczestników projektu, - środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 12 uczestników projektu.	PO II) gospodarcza PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 01.01.15 - 31.12.2022	Osiągnięte wskaźniki: 01.01.15 – 30.04.16 - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 103 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 56 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 9 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 24 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 83 - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: 21 01.01.16 – 31.12.16 Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 90 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 54 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 7 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 12 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 61 - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: 15 01.01.17 – 31.12.18 - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 247	9 561 544,70 Źródło: UE BP Do 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 8 310 414,10 zł

					- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 124 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 17 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 43 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 188 - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: 57 01.01.2019 - marzec 2019 - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 43 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 22 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 5 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 25 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 15 - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: 9 Kwiecień 2019 - maj 2021 - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 221 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 89 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 16 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 26 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 143 - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: 58	
--	--	--	--	--	---	--

						Czerwiec 2021 - czerwiec 2022 - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 109 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 33 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 2 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 12 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 68 - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: 17 SUMA: - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 813 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 378 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 56 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 142 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 558 - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: 177	
6.	Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt polega na realizacji usług i instrumentów rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 poz. 149 z późn. zm.) na rzecz 213 osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych	PO II) gospodarcza PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 01.01.15 – 31.12.2022	Osiągnięte wskaźniki: 01.01.2015 - 31-12.2015 - Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 0 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 128 - Liczba osób objętych wsparciem: 231 - Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 4	13 796 656,35 Źródło: UE BP Do 30 czerwca 2022 r.

			i niepełnosprawnych). Realizowane są i będą: a) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe prowadzone w oparciu o przygotowany dla każdego uczestnika indywidualny Plan Działania, b) staże dla 183 uczestników projektu, c) dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla 30 uczestników projektu.		- Odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 25 - Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 54,46 - Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 56,44 - Odsetek uczestników niekwalifikujących się do żadnej z grup, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 80,77 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci staży: 199 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci dotacji: 32 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci doposażenia stanowiska pracy: 0 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie osoby bezrobotnej: 0 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci prac interwencyjnych: 0 - Liczba osób znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami lub osoby długotrwale bezrobotne lub/i osoby o niskich kwalifikacjach: 195 - Liczba osób należących do kategorii NEET: 232 - Odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 67,24	wydatkowano kwotę 2 301 516,00 zł
--	--	--	---	--	---	--

					01.01.2016 - 31.12.2016 - Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 0 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 88 - Liczba osób objętych wsparciem: 248 - Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 7 - Odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 100 - Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 65,32 - Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 61,43 - Odsetek uczestników niekwalifikujących się do żadnej z grup, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 85,71 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci staży: 206 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci dotacji: 37 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci dofinansowania stanowiska pracy: 0 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie osoby bezrobotnej: 5 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci prac interwencyjnych: 0 - Liczba osób znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby	
--	--	--	--	--	---	--

					z niepełnosprawnościami lub osoby długotrwale bezrobotne lub/i osoby o niskich kwalifikacjach: 192 - Liczba osób należących do kategorii NEET: 248 - Odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 76,56 01.01.2017 - 31.12.2018 - Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 0 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 168 - Liczba osób objętych wsparciem: 529 - Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 12 - Odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 72,73 - Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 67,48 - Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 69,23 - Odsetek uczestników niekwalifikujących się do żadnej z grup, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 55,45 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci staży: 381 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci dotacji: 55	
--	--	--	--	--	---	--

					- Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci doposażenia stanowiska pracy: 54 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie osoby bezrobotnej: 54 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci prac interwencyjnych: 25 - Liczba osób znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami lub osoby długotrwale bezrobotne lub/i osoby o niskich kwalifikacjach: 396 - Liczba osób należących do kategorii NEET: 528 - Odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 79,92 01.01.2019 - 31.12.2020 - Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 0 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 84 - Liczba osób objętych wsparciem: 306 - Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 7 - Odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 0 - Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 0 - Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 0	
--	--	--	--	--	--	--

					- Odsetek uczestników niekwalifikujących się do żadnej z grup, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 72,09 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci staży: 194 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci dotacji: 66 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci doposażenia stanowiska pracy: 30 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie osoby bezrobotnej: 16 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci prac interwencyjnych: 0 - Liczba osób znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami lub osoby długotrwale bezrobotne lub/i osoby o niskich kwalifikacjach: 265 - Liczba osób należących do kategorii NEET: 305 - Odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 78,33 01.01.2021 - i połowa 2022 - Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 0 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 103 - Liczba osób objętych wsparciem: 45 - Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 102 - Odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 7	
--	--	--	--	--	--	--

					- Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 65 - Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 27 - Odsetek uczestników niekwalifikujących się do żadnej z grup, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 5 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci staży: 194 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci dotacji: 33 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci doposażenia stanowiska pracy: 24 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie osoby bezrobotnej: 18 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci prac interwencyjnych: 0 - Liczba osób znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami lub osoby długotrwale bezrobotne lub/i osoby o niskich kwalifikacjach: 228 - Liczba osób należących do kategorii NEET: 269 - Odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 50 SUMA: - Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 0 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 571 - Liczba osób objętych wsparciem: 1359	
--	--	--	--	--	--	--

						- Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 132 - Odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 01.01.2015 - 31.12.2015: 25 01.01.2016 - 31.12.2016: 100 01.01.2017 - 31.12.2018: 72,73 01.01.2019 - 31.12.2020: 0 01.01.2021 - i połowa 2022: 7 - Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 01.01.2015 - 31.12.2015: 54,46 01.01.2016 - 31.12.2016: 65,32 01.01.2017 - 31.12.2018: 67,48 01.01.2019 - 31.12.2020: 0 01.01.2021 - i połowa 2022: 65 - Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 01.01.2015 - 31.12.2015: 56,44 01.01.2016 - 31.12.2016: 61,43 01.01.2017 - 31.12.2018: 69,23 01.01.2019 - 31.12.2020: 0 01.01.2021 - i połowa 2022: 27 - Odsetek uczestników niekwalifikujących się do żadnej z grup, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 01.01.2015 - 31.12.2015: 80,77 01.01.2016 - 31.12.2016: 85,71 01.01.2017 - 31.12.2018: 55,45 01.01.2019 - 31.12.2020: 72,09 01.01.2021 - i połowa 2022: 5 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci staży: 1174 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci dotacji: 223	
--	--	--	--	--	--	--	--

						- Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci doposażenia stanowiska pracy: 108 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie osoby bezrobotnej: 93 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci prac interwencyjnych: 25 - Liczba osób znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami lub osoby długotrwale bezrobotne lub/i osoby o niskich kwalifikacjach: 1276 - Liczba osób należących do kategorii NEET: 1582 - Odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 01.01.2015 - 31-12.2015: 67,24 01.01.2016 - 31.12.2016: 76,56 01.01.2017 - 31.12.2018: 79,92 01.01.2019 - 31.12.2020: 78,33 01.01.2021 - i połowa 2022: 50	
16	Rewitalizacja budynku na potrzeby utworzenia miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych	Miasto Jastrzębie-Zdrój	Projekt będzie polegał na dostosowaniu i rozbudowie istniejącego obiektu znajdującego się na obszarze rewitalizacji na potrzeby stworzenia miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców terenu rewitalizacji,	PO I) przestrzenna PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji	W pierwotnym zakresie nie będzie realizowany. Projekt przemodelowany opisano go w realizowanym projekcie ujętym w LPR pn. Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym	
19.	Stworzenie miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju	-----	PO II) gospodarcza PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji	Z uwagi na brak realizacji powiązanego projektu infrastrukturalnego projekt został przemodelowany i obecnie jest realizowany w ramach projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych i świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Os. 1000- lecia i placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego”	

33	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju	W wyniku działań projektu powstanie świetlica specjalistyczna, Centrum Usług Społecznych, który na danym terenie pobudzi społeczność lokalną poprzez działania Programu Aktywności Lokalnej.	PO II) gospodarcza PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 2021-30.06.2023	Osiągnięte wskaźniki stan na I półrocze 2022: - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [osoba]: 42	523 756,06 zł
40,	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój PARTNERZY SRiWR Olza Euroregion Śląsk Cieszyński Dolni obłast Vitkovice Moravian-Silesian Tourism	W ramach projektu zostanie podjętych szereg działań mający na celu stworzenie trwałego i atrakcyjnego produktu turystycznego, dzięki któremu dojdzie do rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim. Do głównych działań projektu należy: 1. Stworzenie trwałych narzędzi transferu know-how w zakresie rewitalizacji i adaptacji postindustrialnych obiektów na cele społeczno-kulturowe z DOV na stronę polską, 2. Powstanie Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego, w ramach którego powstanie ekspozycja pokazująca historię rozwoju przemysłu wydobywczego, kultury górniczej, urbanistycznego rozwoju Górnego Śląska, który jest komplementarnym i spójnym nawiązaniem do ekspozycji w Dolnym Obszarze Vitkovice, 3. Stworzenie nowej ekspozycji w budynku nr 6 w Dolnym Obszarze Vitkovice w Ostrawie dotyczącej historii	PO-II) gospodarcza PO-III) społeczna PO-I) przestrzenna	Projekt zrealizowany: 01.01.2017 – 30.09.2023	Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: 1 - Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: 0,750 - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 10 000,00	16 499 515,17 Źródło: UE BM

			i dziedzictwa przemysłu metalurgicznego nawiązującej do wspólnego kontekstu społeczno-kulturowego regionu, 4. Stworzenie transgranicznej trasy turystycznej Węgla i Stali łączącej przez granicę wybrane obiekty postindustrialne śląskiej Trasy Zabytków Techniki (PL) i morawsko-śląskiej Technotrasz (CZ). 5. w oparciu o transgraniczny szlak stworzenie systemu obsługi turystów z drugiej strony. DOV i Jastrzębie będą stanowiły centrum obsługi i informacji turystów (hub) dla całego transgranicznego szlaku.				
43.	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	Projekt swoim zakresem obejmuje m.in.: 1.Roboty Termomodernizacyjne: 2.Roboty instalacyjne – instalacja ogniw fotowoltaicznych 3.Roboty instalacyjne – sanitarne 4. Montaż klimatyzacji sal lekcyjnych 0, +1 oraz +2 zlokalizowanych od południowej strony budynku dydaktycznego.	PO-I) przestrzenna	Projekt w trakcie realizacji: 06.06.2017 – 2023	Osiągnięte wskaźniki na dzień 03.04.2019: - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej: 1 - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 0,040 Mwe - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 30,53 Mwhe/rok - Redukcja PM10: 24,79 Osiągnięte wskaźniki stan na i półrocze 2021: - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 4807,48 m2 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 2 szt. - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 3151,19 GJ/rok - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny): 1 410 673,8 kWh/rok	12 472 710,45 Źródło: UE BP BM

45						- Stopień redukcji PM10 (obligatoryjny): 24,9071 tony/rok - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 3 261,79 GJ/rok - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 30.681 MWhe/rok Osiągnięte wskaźniki stan na i półrocze 2022: - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 4807,48 m2 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 2 szt. - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 3151,19 GJ/rok - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny): 1 410 673,8 kWh/rok - Stopień redukcji PM10 (obligatoryjny) [tony/rok]: 24,9071 - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 3 261,79 GJ/rok - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 30.681 MWhe/rok	
	Rewitalizacja zabytkowego budynku Willi Antonina przy ulicy Zdrojowej w Jastrzębiu-Zdroju	ARCHiTEKT studio projektowe	Projekt obejmuje wzmocnienie funkcji społecznej polegającej na stworzeniu w zrewitalizowanym obiekcie centrum edukacyjno-naukowego promującego nowoczesne, ekologiczne technologie w budownictwie oraz funkcji/walorów architektonicznych budynku. Zakłada się rewitalizację	PO I) przestrzenna PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 2020 - 2023	Wskaźniki nie zostały zrealizowane na moment sporządzenia projektu	2 000 000,00 zł Źródło: UE BP Własne JST

			budynku przez odtworzenie walorów, detali architektonicznych z okresu świetności obiektu, zastosowanie pierwotnych materiałów wykończeniowych i wprowadzenie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań stosowanych w budownictwie, np. odnawialne źródła energii.				
48.	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym Poprzedni tytuł: Zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne obiektu „Łazienki III” w Jastrzębiu-Zdroju	Miejski Ośrodek Kultury	Projekt zakłada dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację istniejącego obiektu Łazienki III mieszczącego się w obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdrój do pełnienia funkcji kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Budynek obecnie jest nieużytkowany. W wyniku realizacji projektu w obrębie budynku utworzone zostaną: - w piwnicy pomieszczenia: techniczne, gospodarcze i warsztatowe oraz archiwa i ciemnia. - na parterze: pomieszczenia sali wystawienniczej mieszczącej do 50 osób, zaplecza technicznego, pomieszczeń biurowych i WC. - na piętrze znajdować się będą pomieszczenia biurowe, pracownię, poczekalnie z punktem informacji, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia WC. Projektowany obiekt zostanie dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.	PO I) przestrzenna PO III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 21.07.2017 r. – 2023	Osiągnięte wskaźniki stan na i półrocze 2022: - Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 - Liczba obiektów dostosowanych do osób niepełnosprawnych: 1 - Wzrost zatrudnienie we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa [EPC]): 4 - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 2970 odwiedzin\rok	15 287 729,68 Źródło: UE BP Własne JST

59			W zmodernizowanym, zabytkowym obiekcie świadczona będzie nowa oferta kulturowa. W ramach projektu przewidziano również prace związane z zagospodarowaniem terenu.				
	Górnicza Aktywizacja Zawodowa - GAZ Poprzedni tytuł: Nowe szanse prowadzenia działalności gospodarczej	JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju	W ramach projektu zostaną podjęte m.in. działania w zakresie: dopasowania m.in. indywidualnego wsparcia doradczo-szkoleniowego wynikającego z planowanego przedsięwzięcia gospodarczego w ramach działalności gospodarczej; wsparcie finansowe i organizacyjne w ramach bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej	PO-II) gospodarcza PO-III) społeczna	Projekt w trakcie realizacji: 1.01.2021 r. - 31.12.2022 r.	Projekt w trakcie realizacji. Brak osiągniętego wskaźnika	269 5134,89 Źródło: UE BP
	Rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja	Miasto Jastrzębie-Zdrój	W wyniku realizacji Projektu, zostanie wykonane miejsce, które będzie służyło aktywizacji mieszkańców Miasta. Nowoutworzona przestrzeń miejska, pozwoli na organizację formalnych i nieformalnych spotkań mieszkańców, a także przedsiębiorców z mieszkańcami. Projekt umożliwi także Miastu, przeprowadzenie działań, zaplanowanych i ukierunkowanych na aktywizację społeczno-gospodarczą.	PO-I) przestrzenna	Projekt w trakcie realizacji: 2020-2023	Projekt w trakcie realizacji. Brak osiągniętego wskaźnika	25 976 920,79 Źródło: UE BP Własne JST
63	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4	Miasto Jastrzębie-Zdrój	W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększona efektywność energetyczna budynku j na terenie miasta Jastrzębia-Zdrój. Dzięki	PO-I) przestrzenna	Projekt w trakcie realizacji: 2020-2023	Projekt w trakcie realizacji. Brak osiągniętego wskaźnika	7 386 503,62 Źródło: UE BP

	w Jastrzębiu-Zdroju. Poprzedni tytuł Przebudowa wraz z termomodernizac ją budynku Galerii Historii Miasta przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu- Zdroju.		ograniczeniu zapotrzebowania budynku na ciepło, obniżone zostaną także wskaźniki emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.				Własne JST
--	---	--	---	--	--	--	------------

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Podsumowanie:

Na moment sporządzenia raportu w trakcie realizacji było 12 projektów, co stanowiło 18,8% wszystkich projektów z listy głównej. Zaawansowanie finansowe według złożonych kart wynosi obecnie około 45 641 067,39 zł.

2 projekty nie są realizowane w pierwotnym zakresie:

- „Rewitalizacja budynku na potrzeby utworzenia miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych”. Projekt ujęto w LPR pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”,
- „Stworzenie miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych”. Projekt obecnie jest realizowany w ramach projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych i świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Os. 1000-lecia i placówki wsparcia dziennego typu specjalistycznego”.

Projekty będące w trakcie realizacji dotyczyły następujących obszarów rewitalizacji:

1. Aktywizacji mieszkańców z obszaru rewitalizacji, m.in. poprzez:
 - Aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe i staże. Liczba osób objętych wsparciem: 1359
 - Utworzenie świetlicy specjalistycznej Centrum Usług Społecznych,
 - Działania polegające na dopasowaniu indywidualnego wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach działalności gospodarczej oraz udzielaniu wsparcia finansowego,
 - Organizację szkoleń w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR. Liczba przeszkolonych osób: 194,

Osiągnięte wskaźniki:

- Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne objęte wsparciem: 1384
- Osoby niepełnosprawne objęte wsparciem: 188
- Osoby w wieku 50 lat i więcej objęte wsparciem: 142
- Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym: 42

2. Działań infrastrukturalnych dotyczących rewitalizacji:

- Zabytkowego budynku Willi Antonina,
- Obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscu należącego do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiącego atrakcję turystyczną: 2970/rok,
- Przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja (w tym przebudowa).

Osiągnięte wskaźniki:

- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1
- Liczba obiektów dostosowanych do osób niepełnosprawnych: 1
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach: 4

3. Zwiększenia efektywności energetycznej budynków i instalacji OZE w:

- Budynku CKP i ZS 5 (zwiększenie efektywności energetycznej),
- Budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju (przebudowa wraz z termomodernizacją).

Osiągnięte wskaźniki:

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 4807,48 m²
- Zmodernizowano energetycznie budynki w liczbie: 2
- Zaoszczędzono energię cieplną: 3151,19 GJ/rok
- Zmniejszono roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych: 1 410 673,8 kWh/rok
- Zredukowano emisję PM10: 24,9071 tony/rok

- Zmniejszono zużycie energii końcowej: 3 261,79 GJ/rok
- Zwiększono produkcję energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 30.681 MWh/rok

4. Działań turystyczno-kulturalnych

- Stworzenie trwałego i atrakcyjnego produktu turystycznego, dzięki któremu dojdzie do rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim.

W ramach podjętych działań planuje się osiągnąć następujące wyniki:

- Elementy infrastruktury, w których zwiększono wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: 1
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 10 000,00.

W związku z tym, że projekty te są obecnie w fazie realizacji, dla części z nich nie wykazano zrealizowanych wskaźników.

Tabela 6 Projekty planowane do realizacji

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Sfera	Termin realizacji projektu
12.	Jastrzębie-Zdrój -- Dom Solidarności - studium wykonalności wraz z elementami koncepcji architektonicznej (Miasto Jastrzębie-Zdrój)	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	PO I) przestrzenna PO III) społeczna	Wnioskodawca poszukuje źródeł finansowania
44	Rewitalizacja terenów zbiorników przy ulicy Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Zlecono opracowanie projektu budowlanego oraz projektu oczyszczania stawów. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
49	Ratując jedno życie, ratuję świat. Miejsce działań ratunkowych- Izba Przyjęć WSzS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	PO III) społeczna	Projekt nie uzyskał dofinansowania. Znajduje się na liście rezerwowej. Czynione są działania w celu uzyskania innego dofinansowania
51	Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym – daj sobie szansę	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Czynione są działania w celu uzyskania innego dofinansowania
54.	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	PO III) społeczna	Projekt nie uzyskał dofinansowania. Znajduje się na liście rezerwowej. Czynione są działania w celu uzyskania innego dofinansowania

	poprzedni tytuł: Dotrzymaj im kroku, czyli Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla Matki i Dziecka dla Rodziny			
--	---	--	--	--

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Podsumowanie:

Do realizacji planowanych jest **5 projektów**, które stanowią **7,8%** wszystkich projektów przewidzianych do realizacji w ramach głównej listy Planu Rewitalizacji. Wśród nich są:

- Dwa, dla których poszukuje się źródeł finansowania,
- Dwa, które nie uzyskały dofinansowania i trwają poszukiwania innych źródeł,
- Jeden, dla którego znaleziono finansowanie i planuje się złożenie wniosku.

Projekty z tej grupy dotyczą następujących obszarów:

1. Opieki medycznej i usług społecznych w zakresie:
 - Powstania Izby Przyjęć WSzS Nr 2,
 - Działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym,
 - Poprawy jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia.
2. Działań infrastrukturalnych i rewitalizacyjnych:
 - Powstania Domu Solidarności,
 - Rewitalizacji terenów zbiorników przy ul. Wodzisławskiej.

W związku z tym, że powyższe projekty nie są jeszcze na etapie realizacji, nie wykazano dla nich zrealizowanych wskaźników.

Tabela 7 Projekty, których realizacja jest zawieszona

Nr projektu LPR	Nazwa projektu	Instytucja realizująca	Zakres rzeczowy	Sfera	Stopień realizacji wskaźników projektowych/rezultatu
46	Nowe funkcje produkcyjne i zawodowe w CLP-B	Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.	Rewitalizacja terenu i budynku zdekapitalizowanego, przemysłowego KWK „Zofiówka” w celu prowadzenia nowych funkcji proprodukcyjnych i zawodowych w CLP-B	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Wnioskodawca zrezygnował z realizacji projektu
50	Usługi społeczne i zdrowotne dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej wraz ze wsparciem dla ich rodzin	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju	W wyniku realizacji projektu powstanie: •Ośrodek opieki całodobowej - 10 łóżek •Zespół wsparcia środowiskowego – objęcie opieką ok. 150 osób/rocznie •Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego.	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Projekt nie uzyskał dofinansowania. Wnioskodawca zrezygnował z realizacji projektu.
56	Podniesienie efektywności energetycznej obiektu Szpitala przy ul. Krasickiego 21	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt zakłada wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian i stropów, wymiana instalacji c.o., wykonanie instalacji fotowoltaicznej, oświetlenia, zabudowa	PO I) przestrzenna	Projekt nie uzyskał dofinansowania. Zrezygnowano z realizacji tego projektu.

			pompy ciepła oraz układu kogeneracji.		
57	Rewitalizacja wraz z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Projekt obejmuje przebudowę budynku Szpitala przy ul. Krasickiego 21 wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. w zakres przebudowy wchodzi roboty ogólnobudowlane w budynku: roboty budowlane, instalacyjne centralnego ogrzewania, wentylacji, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne, nadzór autorski, inwestorski, dokumentacja projektowa. Planowana powierzchnia użytkowa budynków do rewitalizacji: ok. 2500 m ² Zakres zagospodarowania otoczenia obejmuje rewitalizację przyległych do budynku terenów zielonych z przeznaczeniem na miejsce rekreacji, ok. 2 ha	PO-I) przestrzenna PO-III) społeczna	Projekt nie uzyskał dofinansowania. Wnioskodawca zrezygnował z realizacji projektu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR.

Podsumowanie:

Na moment sporządzenia raportu projektów, których **realizację zawieszono, było 4, co stanowiło 6,3%** wszystkich projektów z listy głównej.

Projekty z tej grupy dotyczą następujących obszarów:

1. Modernizacji i poprawy efektywności energetycznej:
 - terenu i budynku przemysłowego KWK „Zofiówka” (rewitalizacja),
 - obiektu Szpitala przy ul. Krasickiego 21 (podniesienie efektywności energetycznej),
 - Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych (rewitalizacja).
2. Usług społecznych i zdrowotnych w zakresie:
 - Wsparcia osób chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej i ich rodzin.

W związku z tym, że zrezygnowano z realizacji ww. projektów, nie wykazano dla nich zrealizowanych wskaźników.

3.5. PODSUMOWANIE KOŃCOWE

Na moment sporządzenia raportu (październik 2022) zrealizowano – 22 projekty w latach 2016-2019, 14 projektów w latach 2019-2021 i 7 projektów w latach 2021-2022, co daje razem 43 projekty zrealizowane. Stanowi to łącznie 67,1% wszystkich projektów. W trakcie realizacji jest 12 projektów (18,8%).

Biorąc pod uwagę projekty zrealizowane oraz te w trakcie realizacji można założyć, iż do końca I kwartału 2023 zostanie zrealizowanych łącznie 86% wszystkich projektów.

Na poniższym wykresie zaprezentowany został stan realizacji projektów objętych Programem Rewitalizacji.

Wykres 4 Stan realizacji projektów



Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

Zgodnie z powyższą wizualizacją:

- 43 projekty zostały zrealizowane i zakończone w całym okresie wdrażania LPR,
- 12 jest w trakcie realizacji,
- 5 jest planowany do zrealizowania w przyszłości,
- 4 projekty nie zostaną zrealizowane, projekty niezależne od miasta.

4. ANALIZA FINANSOWYCH ZAŁOŻEŃ Z REALIZACJI PROJEKTÓW

W tabelach poniżej zestawiono wartościowo projekty włączone do Programu Rewitalizacji oraz wskazano źródła, z których zaplanowano ich realizację.

Projekty oznaczone “*” są w trakcie realizacji, w kosztach przedstawiono jedynie wartości poniesione do momentu opracowania raportu. Koszty całkowite będą możliwe do przedstawienia dopiero po zakończeniu realizacji projektów.

Tabela 8 Finansowa realizacji poszczególnych projektów programu rewitalizacji

Lp.	Nazwa projektu	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
1	O krok do przodu Wsparcie dla osób z terenów rewitalizowanych	1 742 202,06	0,00	438 062,73	0,00	2 180 264,79
2	Wakacyjna Akademia poprzedni tytuł: Akademia seniora – organizowanie wspólnych warsztatów na rzecz zdobywanej umiejętności i uczenia przez całe życie	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
3 (kwota wydatkowana do czerwca 2022r)	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	8 310 414,10	0,00	0,00	0,00	8 310 414,10
4	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ na obszarze rewitalizowanym	216 423,81	25 461,63	0,00	12 730,81	254 616,25
5	Zmiana nazwy projektu 5.a - Praktyka i Praca - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ 5.b. - Bliżej pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ Poprzedni tytuł: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w ramach działania 7.1.2 (Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju)	1 320 248,68	155 413,39	0,00	77 571,68	1 553 233,75
6* (kwota wydatkowana do czerwca 2022r)	Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój	2 301 516,00	0,002	0,00	0,00	2 301 516,00
7	Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych (JCOP) poprzedni tytuł: Centrum wolontariatu i organizacji pozarządowych	0,00	128 000,00	5 000,00	0,00	128 000,00
8	Festiwal organizacji pozarządowych – Forum Ekonomii Społecznej	0,00	0,00	1700,0010 000,00	0,00	1 700,00

Lp.	Nazwa projektu	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
9	Festiwal Sztuk Wszelkich Zderzenia Działań Wrażliwych	0,00	0,00	23 400,00	57 850,71	81 250,61
10	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	0,00	0,00	0,00	56 581,47	56 581,47
11	Jarmark Sztuki Wiosna Ludów	0,00	0,00	0,00	11 987,60	11 987,60
12	Jastrzębie-Zdrój -- Dom Solidarności -studium wykonalności wraz z elementami koncepcji architektonicznej (Miasto Jastrzębie-Zdrój)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jastrzębskie Lato Muzyczne	0,00	0,00	60 222,98	0,00	60 222,98
14	Transgraniczne zaczytanie poprzedni tytuł: Językowa akademie kultury pogranicza – wsparcie inicjatyw kulturalno-edukacyjnych	58 241,82	3 438,36	6 852,87	0,00	68 533,05
15	Letnie Kino Parkowe	0,00	0,00	5 670,3	0,00	5 670,30
16 (realizowany w ramach projektu 43)	Rewitalizacja budynku na potrzeby utworzenia miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Muzyczne Środy	0,00	0,00	29 983,98	0,00	29 983,98
18	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	0,00	0,00	132 950,00	0,00	132 950,00
19 (realizowany w ramach projektu 33)	Stworzenie miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Piknik w kurorcie	0,00	0,00	50 793,93	0,00	50 793,93
21	Wsparcie w starcie poprzedni tytuł:	234 511,35		41 384,35		275 895,70

Lp.	Nazwa projektu	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
	Promocja samozatrudnienia na obszarze rewitalizowanym w ramach działania 7.3.2					
22	Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 na potrzeby mieszkaniowe i społeczne Poprzedni tytuł: Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu (Miejski Zarząd Nieruchomości)	0,00	0,00	1 679 237,26	1 068 335,00	2 747 572,26
23\24	Ćwiczenie nie zna granic poprzedni tytuł: Siłownia na wolnym powietrzu	82 785,53	4 869,74	31 036,35	0,00	118 691,62
25	Wakacyjne warsztaty międzypokoleniowe Poprzedni tytuł: Słowo i obraz w przestrzeni międzypokoleniowej -- zajęcia o obszarze kultury i sztuki angażujące różne pokolenia (Miejska Biblioteka Publiczna, Jastrzębie-Zdrój)	0,00	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00
26	Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Gwarków	0,00	0,00	6 997,56	0,00	6 997,56
27	Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Zofiówka	0,00	0,00	6 967,00	0,00	6 967,00
28	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla 1000-lecia	0,00	0,00	6 998,74	0,00	6 998,74
29	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne	0,00	0,00	11 218,70	0,00	11 218,70
30	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Przyjaźń	0,00	0,00	8 782,83	0,00	8 782,83
31	Wydarzenia kulturalne skierowane do mieszkańców Osiedla Zdrój	0,00	0,00	2 299,11	0,00	2 299,11
32	Krok w przód Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju	1 344 275,96	158 150,11	79 075,06	0,00	1 581 501,13

Lp.	Nazwa projektu	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
	poprzedni tytuł: Promocja samozatrudnienia na obszarze rewitalizowanym w ramach działania 7.3.2					
33* (w trakcie realizacji)	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu- Zdroju	271 796,14	25 579,63	16 105,21	0,00	313 480,98
34	Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju	134 528 ,00	0,00	23 740,04	0,00	158 268,04
35	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	9 373 835,31	0,00	7 561 338,53	0,00	16 935 173,84
36	Żelazny szlak rowerowy	624 820,24	0,00	609 961,50	0,00	1 234 781,74
37	V polsko-czeskie spotkania branżowe	110 329,89	3 226,78	16 243,28	0,00	129 799,95
38 i b	38.a. Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic ZSZ w Jastrzębiu Zdroju 38.b. Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w ZS 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju poprzedni tytuł: Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego	925 580,342	108 891,81	54 445,90	0,00	1 088 918,05
39	Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju	795 345,00	93 570,00	46 785,00	0,00	935 700,00
40	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju	1 613 581,08	188 801,92	95 947,68	0,00	1 898 330,68
41	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju	1 061 564,87	102 240,97 zł	12 482 949,76	0,00	13 646 755,60

Lp.	Nazwa projektu	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
	poprzedni tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 i PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju					
42	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu poprzedni tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS 12 w Jastrzębiu-Zdroju	3 005 730,34	491 505,95	7 478 539,28	0,00	10 975 775,57
43* (w trakcie realizacji)	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	2 690 372,25	287 845,07	3 351 479,2	0,00	6 329 696,52
44	Rewitalizacja terenów zbiorników przy ulicy Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45* (w trakcie realizacji)	Rewitalizacja zabytkowego budynku Willi Antonina przy ulicy Zdrojowej w Jastrzębiu-Zdroju	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
46	Nowe funkcje produkcyjne i zawodowe w CLP-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Drugi Dom Poprzednia nazwa: Poprawa dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie miejsc w Zakładach Opieki Długoterminowej, w którym uzyskają krótkookresową całodobową opiekę osoby niesamodzielne w zastępstwie opiekunów faktycznych	632 393,138	107 473,65	0,00	0,00	795 555,45
48 i 16 (w trakcie realizacji)	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym Poprzedni tytuł: Zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne obiektu „Łazienki III” w Jastrzębiu-Zdroju	4 586 597,56	539 599,72	3 899 601,15	0,00	9 025 798,43
49	Ratując jedno życie, ratuję świat. Miejsce działań ratunkowych - Izba Przyjęć WSzS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
50	Usługi społeczne i zdrowotne dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej wraz ze wsparciem dla ich rodzin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym – daj sobie szansę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju poprzedni tytuł: Czym zaskoczyć świadczeniobiorcę, czyli niestandardowo w Poradniach Specjalistycznych Przyszpitalnych, Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Pracowniach diagnostycznych i zabiegowych WSzZ Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	9 389 391,81	122 565,35	0,00	1 950 201,17	11 462 158,33
53	Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu poprzedni tytuł: Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Oddział Neurochirurgii, Zakład Diagnostyki Obrazowej – usługi ponadstandardowe jako wzmocnienie świadczeń realizowanych w ramach umowy z NFZ.	2 254 188,37	0,00	0,00	7 113 405,66	9 367 594,03
54	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju poprzedni tytuł: Dotrzymaj im kroku, czyli Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla Matki i Dziecka dla Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
55	Termomodernizacja wraz z zabudową instalacji solarnej budynku przychodni zdrowia „ORTHOGON” w Jastrzębiu-Zdroju	1 367 377,36	0,00	0,00	303 483,81	1 670 861,17
56	Podniesienie efektywności energetycznej obiektu Szpitala przy ul. Krasickiego 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Rewitalizacja wraz z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	58.a Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży górniczo -wiertniczej 58.b E-ambasador Poprzedni tytuł: Nowe szanse integracji i rozwoju społeczno-zawodowego	783 750,00	0,00	0,00	0,00	783 750,00
59	Górnicza Aktywizacja Zawodowa - GAZ Poprzedni tytuł: Nowe szanse prowadzenia działalności gospodarczej	2 695 134,73	0,00 zł	0,00	0,00	2 695 134,73
60	60.a. Sektorowa Rama Kwalifikacji w Górnictwie poprzedni tytuł: Nowe szanse rozwoju w JSWSiG	150 000,00	0,00	0,00	450 000,00	600 000,00
60b*	60.b. Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (SENSE VR) Poprzedni tytuł: Nowe szanse rozwoju w JSWSiG	2 321 979,71	0,00	918 011,01	31 319,46	3 239 990,72
61	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów	7 471 811,17	879 036,61	2 355 342,04	0,00	10 706 189,82
63*	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.	0,00	0,00	11 192,00	0,00	11 192,00

Lp.	Nazwa projektu	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne	Koszt całego projektu
64*	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta.	1 277 031,21	150 238,06	3 748 420,99	0,00	5175690,26
	Suma	69 147 757,82	3 575 948,75	45 293 736,32	11 325 416,04	129 342 858,93

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR

W kolejnej tabeli zawarto podsumowanie postępów finansowych.

Tabela 9 Finansowa realizacja programu rewitalizacji do października 2022 r.

	Razem	Fundusze strukturalne	Budżet państwa	Budżet Miasta Jastrzębia-Zdroju	Inne
Łączna wartość środków finansowych zaplanowanych w LPR na realizację wszystkich projektów- szacunek dokonany w 2017 roku	209 131 480,00 zł	102 691 580,00 zł	2 710 000,00 zł	84 639 930,00 zł	1 845 250,00 zł
Łączna wartość środków finansowych poniesionych na realizację projektów do października 2022	129 342 858,93 zł	69 147 757,82 zł	3 575 948,75 zł	45 293 736,32 zł	11 325 416,04 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR.

Zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji *Tabela 38 Tabela finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji*, orientacyjny koszt wszystkich zgłoszonych projektów planowany był na około **209 131 480,00 zł**, z czego na wkład własny (podmiotów realizujących projekt) przeznaczono około **1 845 250,00 zł**. Pozostałe źródła finansowania pochodzić miały m.in.: z funduszy unijnych w kwocie **102 691 580,00 zł** oraz środków budżetu państwa w kwocie **2 710 000,00 zł**.

Różnica między budżetem przyjętym w 2017 roku, a rzeczywiście poniesionymi wydatkami, wynika z faktu, iż w roku 2017 budżet obejmował koszty szacunkowe. W wielu przypadkach projekty nie posiadały kosztorysów, nie było znane również źródło ich finansowania oraz poziom wsparcia. Dopiero po ogłoszeniu konkursów możliwe było określenie kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych, co przyczyniło się w wielu przypadkach do zmiany zakresu projektów. Potwierdza to tabela nr 8 pozycja „łączna wartość środków finansowych poniesionych na realizację projektów do października 2022” – w pozycji Fundusze Strukturalne. Na koszty wpływ miały również prowadzone postępowania przetargowe, które pozwoliły na wygenerowanie oszczędności.

Na etapie tworzenia LPR wielu wnioskodawców zgłosiło potencjalne projekty do realizacji z udziałem funduszy unijnych, znając tylko wstępne wytyczne w tym zakresie. Niejednokrotnie po ogłoszeniu dedykowanych konkursów okazało się, że regulamin konkursu nie dopuszcza możliwości aplikowania o środki unijne, dlatego też wnioskodawcy niektórych zgłoszonych projektów odstąpili od ich realizacji z uwagi na brak możliwości uzyskania potencjalnego dofinansowania. Projekty realnie zaplanowane do realizacji zostały w dużej części zrealizowane bądź znajdują się w fazie realizacji.

W niektórych przypadkach część projektów nie uzyskała dofinansowania w ramach dostępnych źródeł (4 projekty), dlatego też niektórzy wnioskodawcy z braku środków własnych zrezygnowali z realizacji zadania lub też będą realizować zadanie w późniejszym terminie w ramach dostępnych środków własnych.

Analiza stopnia realizacji LPR wykazała, iż:

- W okresie od roku 2016 do marca 2019 roku (pierwszy okres sprawozdawczy) zrealizowano w pełni 22 projekty, co stanowi 34,4% wszystkich projektów listy głównej. Budżet projektów zrealizowanych w tym okresie wyniósł 3 138 727,69zł.
- W okresie od kwietnia 2019 r. do maja 2021 (drugi okres sprawozdawczy) zrealizowano w pełni 14 projektów, co stanowi 21,9% wszystkich projektów listy głównej na łączną wartość 52 597 865,52 zł.
- W okresie od czerwca 2021 r. do października 2022 (trzeci okres sprawozdawczy) zrealizowano w pełni 7 projektów, co stanowi 10,9% wszystkich projektów listy głównej na łączną wartość 27 965 198,33 zł.
- Na moment sporządzenia raportu w trakcie realizacji było 12 projektów, co stanowiło 18,8% wszystkich projektów z listy głównej. Zaawansowanie finansowe według złożonych kart wynosi obecnie około 45 641 067,39zł.

Łącznie na moment opracowania raportu realizowanych oraz w trakcie realizacji było 55 projektów na kwotę 129 342 858,93 zł, przy czym w zakresie projektów w trakcie realizacji, w kosztach przedstawiono jedynie wartości poniesione do momentu opracowania raportu. Koszty całkowite będą możliwe do przedstawienia dopiero po zakończeniu realizacji projektów.

Należy podkreślić, iż w związku z brakiem środków finansowych w zakładanym pierwotnie terminie, 5 projektów jest planowanych do zrealizowania w przyszłości. Dla tych projektów w dalszym ciągu trwa poszukiwanie źródeł finansowania. Do 4 projektów wnioskodawcy na dziś podjęli decyzję o rezygnacji realizacji i są to projekty niezależne od miasta.

Projekty, dla których poszukiwanie są źródła finansowania:

- Jastrzębie-Zdrój – Dom Solidarności – studium wykonalności wraz z elementami koncepcji architektonicznej (Miasto Jastrzębie-Zdrój), planowane jest obecnie utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego z wystawą Porozumienia w ramach działalności Instytutu Dziedzictwa i Dialogu Społecznego
- Rewitalizacja terenów zbiorników przy ulicy Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju,
- Ratując jedno życie, ratuję świat. Miejsce działań ratunkowych – Izba Przyjęć WSzS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
- Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym – daj sobie szansę,
- Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Projekty, dla których wnioskodawcy podjęli decyzję o rezygnacji:

- Nowe funkcje produkcyjne i zawodowe w CLP-B,
- Usługi społeczne i zdrowotne dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej wraz ze wsparciem dla ich rodzin,
- Podniesienie efektywności energetycznej obiektu Szpitala przy ul. Krasickiego 21,
- Rewitalizacja wraz z dostosowaniem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji dla osób przewlekle chorych i starszych.

5. ANALIZA OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW MONITORINGOWYCH

Tabela 10 Analiza osiągniętych wskaźników monitoringowych

PO-I) Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez kompleksowe działania o charakterze infrastrukturalno-architektonicznym [sfera przestrzenna].		
Kierunek działania	Osiągnięte wskaźniki realizacji celów Programu	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
K1 - Odnowa urbanistyczna obszarów miejskich i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej, K2 - Rozbudowa i optymalizacja układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej miasta, K3 - Rewitalizacja substancji mieszkaniowej, K4 - Tworzenie rozwiązań infrastrukturalnych, wspierających rozwój gospodarczy, K5 - Rewitalizacja terenów i obiektów przemysłowych, K6 - Przebudowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej i społecznej, K7 - Poprawa jakości i konkurencyjności infrastruktury ochrony zdrowia, K8 - Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta, K9 - Rozwiązania systemowo-infrastrukturalne dla poprawy jakości środowiska naturalnego.	Żelazny szlak rowerowy: - długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych i tras rowerowych: 0,585 km Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju: - Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoba]: 260 - Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego: 2 - Liczba placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 2 Ćwiczenie nie zna granic (siłownia na wolnym powietrzu): - Liczba nowopowstałych obiektów na cele sportowe oraz rekreacyjne: 1 Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju. Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w ZS 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju - Liczba szkół i kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 2 - Liczba osób objętych wsparciem — instytucje objęte wsparciem: 160 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju: - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 1550,83 m² - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 1 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 736.86 GJ/rok - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny): 180147.2 kWh/rok - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 736.86 GJ/rok	- Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - Liczba elementów infrastruktury udostępniającej /zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego - Liczba wybudowanych / przebudowanych / wyremontowanych/ objętych innymi robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - Liczba nowopowstałych obiektów na cele sportowe oraz rekreacyjne - Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych i tras rowerowych - Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego - Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych, - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją, - Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury

	- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 15.692MWh/rok - Stopień redukcji PM10: 0.000584 tony/rok Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu: - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 2573 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 927.86 GJ/rok - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 45.6754 MWh/rok - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny): 420767.2 kWh/rok - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1092.160 GJ/rok - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 16.15200 MWhe/rok - Stopień redukcji PM10: 0.0006 tony/rok Drugi Dom: - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 10 - Liczba osób zaangażowanych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 80 Termomodernizacja wraz z zabudową instalacji solarnej budynku przychodni zdrowia „ORTHOGON” w Jastrzębiu-Zdroju: - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 199,01 CO2, - Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 15 szt. - Stopień redukcji ilości pyłu PM10 (t/rok): 0,02771 tony/rok, - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 20.582 MWh/rok, - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1461.8 GJ/rok - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1512 GJ/rok Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 na potrzeby mieszkaniowe i społeczne: - Liczba wybudowanych/przebudowanych /wyremontowanych/objętych innym robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej: 1 - Liczba osób korzystających ze wsparcia infrastruktury: 64 Krok w przód Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju -Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: 7	
--	--	--

	- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 114 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje pracujących (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek): 45 Postindustrialne dziedzictwo pogranicza: - Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: 1 - Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: 0,750 - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 10 000,00 Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju: - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 239 - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 9 Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]: 1 - Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów wiejskich [osoby]: 25823 - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]: 1,17 - Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury [osoby]: 1310 Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 1768,62 m2 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO2]: 143,00396 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 43,21061 MWh/rok - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1165,72 GJ/rok - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1321,28 GJ/rok - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny): 453441,67 kWh/rok - Stopień redukcji PM10: 0,62005 tony/rok Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju:	
--	--	--

	- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 4807,48 m2 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 2.0 - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 3151,19 GJ/rok - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny): 1 410 673,8 kWh/rok - Stopień redukcji PM10 (obligatoryjny): 24,9071 tony/rok - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 3 261,79 GJ/rok - Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 30.681 MWhe/rok Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym oraz realizowany w jego ramach projekt Rewitalizacja budynku na potrzeby utworzenia miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych - Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 - Liczba obiektów dostosowanych do osób niepełnosprawnych: 1 - Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 4 - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 2970/rok	
PO-II) Aktywizacja ekonomiczna obszaru wsparcia dzięki podniesieniu konkurencyjności i trwałej reorganizacji struktury gospodarczej [sfera gospodarcza].		
Kierunek działania	Osiągnięte wskaźniki realizacji celów Programu	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
K10 - Aktywizacja gospodarcza mieszkańców i ułatwianie przekwalifikowania zawodowego, K11 - Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności oraz tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), K12 - Kompleksowa promocja miasta skierowana na przyciągnięcie inwestorów, K13 - Podnoszenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta, K14 - Kształtowanie systemu edukacyjnego dostosowanego do	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ na obszarze rewitalizowanym - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych: 27 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych: 16 - Liczba osób niepełnosprawnych zaplanowanych do objęcia wsparciem: 1 - Liczba osób 50 + zaplanowanych do objęcia programem: 6 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach: 27 Praktyka i Praca — aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ oraz Blżej pracy — aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+: Ad.5.a) -Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 134 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 76 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 10 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 37 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 120 - Liczba osób pracujących, po opuszczeniu programu: 92	- Liczba zrealizowanych staży - Liczba zrealizowanych dotacji - Liczba zrealizowanych prac interwencyjnych - Liczba zrealizowanych doposażeń stanowiska pracy - Liczba zaplanowanych do realizacji staży - Liczba zaplanowanych do realizacji dotacji - Liczba zaplanowanych do realizacji doposażeń

potrzeb rynku pracy.	- odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 164 - odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 170 - odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: - Od początku realizacji do marca 2019: 67 - Od kwietnia 2019 do maja 2021: 0 - odsetek uczestników w wieku 50+ którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: - Od początku realizacji do marca 2019: 64 - Od kwietnia 2019 do maja 2021: 100 - odsetek uczestniczek, które podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: - Od początku realizacji do marca 2019: 78 - Od kwietnia 2019 do maja 2021: 78 Ad.5. b) - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 61 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 34 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 6 -Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 15 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 61 - Liczba osób pracujących, po opuszczeniu programu: 38 - odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, które podejmą pracę w okresie do 3 miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 79 Wsparcie w starcie (poprzedni tytuł: promocja samozatrudnienia na obszarze rewitalizowanym w ramach działania 7.3.2) - Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcia działalności gospodarczej w programie: 4 - Liczba osób, które wzięły udział w indywidualnych konsultacjach: 4 - Liczba wydanych zaświadczeń ukończenia kursów: 4 Ćwiczenie nie zna granic: - Liczba nowopowstałych obiektów na cele sportowe oraz rekreacyjne: 1 Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży górniczo-wiertniczej, E-ambasador: - Liczba zawodów, w których osoby kształcące się w zawodach lub osoby dorosłe posiadające kwalifikacje zawodowe będą mogły uzyskać dodatkowe umiejętności zawodowe opracowane w ramach Programu: 7 -Liczba programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów opracowanych we współpracy z pracodawcami: 19	
-----------------------------	---	--

	Sektorowa Rama Kwalifikacji w Górnictwie: - Dostarczenie ostatecznego produktu (raportu końcowego oraz prezentacji multimedialnej): 1 Postindustrialne dziedzictwo pogranicza: - Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: 1 - Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: 0,750 - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 10 000,00 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 813 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 378 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 56 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 142 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 558 - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: 177 Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój - Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 0 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 571 - Liczba osób objętych wsparciem: 1359 - Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 132 - Odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 01.01.2015 - 31.12.2015: 25 01.01.2016 - 31.12.2016: 100 01.01.2017 - 31.12.2018: 72,73 01.01.2019 - 31.12.2020: 0 01.01.2021 - i połowa 2022: 7 - Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 01.01.2015 - 31.12.2015: 54,46 01.01.2016 - 31.12.2016: 65,32 01.01.2017 - 31.12.2018: 67,48 01.01.2019 - 31.12.2020: 0 01.01.2021 - i połowa 2022: 65 - Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie:	
--	--	--

	01.01.2015 - 31.12.2015: 56,44 01.01.2016 - 31.12.2016: 61,43 01.01.2017 - 31.12.2018: 69,23 01.01.2019 - 31.12.2020: 0 01.01.2021 - i połowa 2022: 27 - Odsetek uczestników niekwalifikujących się do żadnej z grup, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 01.01.2015 - 31.12.2015: 80,77 01.01.2016 - 31.12.2016: 85,71 01.01.2017 - 31.12.2018: 55,45 01.01.2019 - 31.12.2020: 72,09 01.01.2021 - i połowa 2022: 5 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci staży: 1174 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci dotacji: 223 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci doposażenia stanowiska pracy: 108 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie osoby bezrobotnej: 93 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci prac interwencyjnych: 25 - Liczba osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami lub osoby długotrwale bezrobotne lub/i osoby o niskich kwalifikacjach: 1276 - Liczba osób należących do kategorii NEET: 1582 - Odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 01.01.2015 - 31.12.2015: 67,24 01.01.2016 - 31.12.2016: 76,56 01.01.2017 - 31.12.2018: 79,92 01.01.2019 - 31.12.2020: 78,33 01.01.2021 - i połowa 2022: 50 Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju i realizowany w jego ramach projekt Stworzenie miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 42 60.b. Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (SENSE VR) - Liczba przeszkolonych osób: 194	
PO-III) Wyrównywanie szans życiowych i aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru wsparcia poprzez przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego [sfera społeczna].		

Kierunek działania	Osiągnięte wskaźniki realizacji celów Programu	Wskaźniki poziomu realizacji celów Programu
K15 - Aktywna polityka społeczna w celu neutralizacji zjawisk wykluczenia społecznego, marginalizacji i bierności, K16 - Walka z bezrobociem i biernością zawodową poprzez działania skierowane na podnoszenie kwalifikacji, aktywizację zawodową i rozwój osobowościowy mieszkańców, K17 - Poprawa bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii i dezintegracji społecznej, K18 - Przeciwdziałanie migracji zewnętrznej mieszkańców poprzez wzmacnianie identyfikacji mieszkańców z miastem oraz kształtowanie tożsamości lokalnej, K19 - Aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców oraz propagowanie aktywnego stylu życia, K20- Wsparcie i podniesienie aktywności organizacji pozarządowych, K21 - Wykorzystanie i rozwój istniejącego potencjału edukacyjnego, K22 - Kształtowanie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy, K23- Aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych.	Wakacyjna Akademia - Liczba osób biorących udział w warsztatach (w wieku 50 lat i więcej): 977. - Liczba zrealizowanych działań: 16 Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych (JCOP) - Liczba organizacji korzystających systematycznie z JCOP: 3 - Liczba osób korzystających z usług Centrum: 150 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 30 -Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 30 -Liczba zorganizowanych akcji dla seniorów: 60 -Liczba spotkań/warsztatów: 50 Festiwal organizacji pozarządowych -Liczba zorganizowanych spotkań: 1 - Liczba organizacji /osób biorących udział w społecznej akcji/festiwalu: 16 -Liczba spotkań/warsztatów: 10 - Liczba innych podmiotów uczestniczących w wydarzeniu: 20 Festiwal Sztuk Wszelkich Zderzenia Działań Wrażliwych - Liczba organizacji biorących udział w festiwalu: 10, - Liczba uczestników: 1381 - Liczba wydarzeń: 29 Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - Liczba dzieci biorących udział w prezentacji młodych talentów: 500, - Liczba zorganizowanych zabaw i animacji: 9 - Liczba artystów: 34 - Liczba osób: 3950 Jarmark Sztuki Wiosna Ludów - Liczba osób biorących udział w warsztatach: 500, - Liczba artystów poniżej 25 r. życia biorących udział w wydarzeniu: 3 Jastrzębskie Lato Muzyczne - Liczba mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w koncertach: 4750 - Liczba koncertów odbywających się w ramach projektu: 11 - Liczba wykonawców: 11	- Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób długotrwale bezrobotnych zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób z niepełnosprawnościami zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami zaplanowanych do objęcia wsparciem - Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania - Liczba dzieci biorących udział w prezentacji młodych talentów - Liczba mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym - Liczba zorganizowanych pokazów filmowych - Liczba wydarzeń kulturalnych

	Transgraniczne zaczytanie - Liczba partnerów zaangażowanych w realizację projektu: 2, - Liczba osób uczestniczących w warsztatach: 252, - Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie edukacji: 7 -Liczba uczestników wspólnych programów edukacyjnych oraz przygotowania zawodowego w celu transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży, zwiększenia możliwości edukacyjnych kształcenia wyższego i przygotowania zawodowego: 238 Letnie Kino Parkowe - Liczba zorganizowanych pokazów filmowych: 13 - Liczba osób korzystających z oferty: 1550 Muzyczne Środy - Liczba koncertów odbywających się w ramach projektu: 9, - Liczba osób uczestniczących w koncertach: 3450, - Liczba artystów (zespołów) biorących udział w wydarzeniu: 9 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 50, - Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 21, - Liczba nowopowstałych miejsc pracy: 7 Piknik w kurorcie - Liczba wydarzeń kulturalnych skierowana do mieszkańców: 6 - Liczba osób biorących udział w wydarzeniach: 1000 Wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane do mieszkańców Osiedla Gwarków, Przyjaźń, Zdrój, Zofiówka, 1000-lecia, Górne i Dolne - Liczba wydarzeń kulturalnych oraz sportowych skierowana do mieszkańców: 26 Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju - Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania: 2 Żelazny szlak rowerowy: - długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych i tras rowerowych: 0,585 km V polsko-czeskie spotkania branżowe - Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania: 3 - zrealizowane projekty we współpracy transgranicznej: 7	
--	---	--

	Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju: - Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoba]: 260 - Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego: 2 - Liczba placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS: 2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ na obszarze rewitalizowanym - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych: 27 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych: 16 - Liczba osób niepełnosprawnych zaplanowanych do objęcia wsparciem: 1 - Liczba osób 50 + zaplanowanych do objęcia programem: 6 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach: 27 Praktyka i Praca — aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ oraz Blżej pracy — aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+: Ad.5.a) -Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 134 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 76 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 10 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 37 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 120 - Liczba osób pracujących, po opuszczeniu programu: 92 - odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 164 - odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: 170 - odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: Od początku realizacji do marca 2019: 67 Od kwietnia 2019 do maja 2021: 0 - odsetek uczestników w wieku 50+ którzy podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: Od początku realizacji do marca 2019: 64 Od kwietnia 2019 do maja 2021: 100 - odsetek uczestniczek, które podejmą pracę do 3 miesięcy po zakończeniu programu: Od początku realizacji do marca 2019: 78 Od kwietnia 2019 do maja 2021: 78 Ad.5. b) - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 61 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 34 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 6	
--	---	--

	-Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 15 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 61 - Liczba osób pracujących, po opuszczeniu programu: 38 - odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, które podejmą pracę w okresie do 3 miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 79 Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju. Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w ZS 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju - Liczba szkół i kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego: 2 - Liczba osób objętych wsparciem — instytucje objęte wsparciem: 160 Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży górniczo-wiertniczej, E-ambasador: - Liczba zawodów, w których osoby kształcące się w zawodach lub osoby dorosłe posiadające kwalifikacje zawodowe będą mogły uzyskać dodatkowe umiejętności zawodowe opracowane w ramach Programu: 7 - Liczba programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów opracowanych we współpracy z pracodawcami: 19 Sektorowa Rama Kwalifikacji w Górnictwie: - Dostarczenie ostatecznego produktu (raportu końcowego oraz prezentacji multimedialnej): 1 O krok do przodu — Wsparcie dla osób z terenów rewitalizowanych - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu: 68 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 60 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 30 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 207 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 43 Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 na potrzeby mieszkaniowe i społeczne: - Liczba wybudowanych/przebudowanych /wyremontowanych/objętych innym robotami budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej: 1 - Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 64 Wakacyjne warsztaty międzypokoleniowe: - Liczba zrealizowanych działań: 8	
--	--	--

	- Liczba uczestników: 150 Drugi Dom: - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 10 - Liczba osób zaangażowanych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 80 Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu: 1, - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych: 1 - Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi: 65 000 - Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej: 1 876 580,24 Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu: - Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu: 1. - Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi: 1990 - Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej: 654 725,47 Krok w przód Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju -Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: 7 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 114 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje pracujących (łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek): 45 Postindustrialne dziedzictwo pogranicza: - Liczba elementów infrastruktury udostępniającej/zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: 1 - Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: 0,750 - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 10 000,00 Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju:	
--	---	--

	- Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy: 239 - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie: 9 Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 - Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów wiejskich: 25823 - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1,17 ha - Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 1310 Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 1768,62 m2 - Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [tony równoważnika CO2]: 143,00396 - Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 43,21061 MWh/rok - Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1165,72 GJ/rok - Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 1321,28 GJ/rok - Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny): 453441,67 kWh/rok - Stopień redukcji PM10: 0,62005 tony/rok Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 813 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 378 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 56 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 142 - Liczba osób z niskimi kwalifikacjami objętych wsparciem w programie: 558 - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: 177 Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój - Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 0 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 571 - Liczba osób objętych wsparciem: 1359 - Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem: 132 - Odsetek uczestników niepełnosprawnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie:	
--	--	--

	01.01.2015 - 31.12.2015: 25 01.01.2016 - 31.12.2016: 100 01.01.2017 - 31.12.2018: 72,73 01.01.2019 - 31.12.2020: 0 01.01.2021 - i połowa 2022: 7 - Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 01.01.2015 - 31.12.2015: 54,46 01.01.2016 - 31.12.2016: 65,32 01.01.2017 - 31.12.2018: 67,48 01.01.2019 - 31.12.2020: 0 01.01.2021 - i połowa 2022: 65 - Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 01.01.2015 - 31.12.2015: 56,44 01.01.2016 - 31.12.2016: 61,43 01.01.2017 - 31.12.2018: 69,23 01.01.2019 - 31.12.2020: 0 01.01.2021 - i połowa 2022: 27 - Odsetek uczestników niekwalifikujących się do żadnej z grup, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 01.01.2015 - 31.12.2015: 80,77 01.01.2016 - 31.12.2016: 85,71 01.01.2017 - 31.12.2018: 55,45 01.01.2019 - 31.12.2020: 72,09 01.01.2021 - i połowa 2022: 5 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci staży: 1174 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci dotacji: 223 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci doposażenia stanowiska pracy: 108 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie osoby bezrobotnej: 93 - Liczba zrealizowanych form wsparcia w postaci prac interwencyjnych: 25 - Liczba osób znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami lub osoby długotrwale bezrobotne lub/i osoby o niskich kwalifikacjach: 1276 - Liczba osób należących do kategorii NEET: 1582 - Odsetek uczestników w najtrudniejszej sytuacji, którzy podejmą pracę w okresie trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: 01.01.2015 - 31.12.2015: 67,24 01.01.2016 - 31.12.2016: 76,56 01.01.2017 - 31.12.2018: 79,92 01.01.2019 - 31.12.2020: 78,33 01.01.2021 - i połowa 2022: 50	
--	--	--

	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju i realizowany w jego ramach projekt Stworzenie miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 42 Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym oraz realizowany w jego ramach projekt Rewitalizacja budynku na potrzeby utworzenia miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych - Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 - Liczba obiektów dostosowanych do osób niepełnosprawnych: 1 - Wzrost zatrudnienie we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 4 - Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 2970/rok 60.b. Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR (SENSE VR) - Liczba przeszkolonych osób: 194.	
--	---	--

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdroju. Dane zostały opracowane na podstawie kart do raportu przesłanych przez Instytucje zgłaszające projekty do LPR.

6. ANALIZA ZMIAN WSKAŹNIKOWYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI

Ocenę stopnia realizacji celów Programu Rewitalizacji przeprowadzono na podstawie porównania stanu wskaźników bazowych wykorzystanych do wytyczenia obszaru rewitalizacji, ustalonego w momencie opracowania Programu, z obecnym poziomem wskaźników dotyczących sfery społecznej, przestrzennej oraz gospodarczej.


W celu zmonitorowania zmian wpływu programu rewitalizacji na obszarze objętym rewitalizacją wytypowano wskaźniki, które wykorzystano do wyznaczenia obszaru na etapie sporządzania programu rewitalizacji. Analizie poddano:

1. W sferze społecznej:
 - poziom interwencji policji w stosunku do liczby mieszkańców obszaru,
 - poziom bezrobocia w stosunku do liczby mieszkańców obszaru,
 - udział liczby osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców obszaru.
2. W sferze gospodarczej:
 - poziom przedsiębiorczości mierzony liczbą podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby mieszkańców obszaru.
3. W sferze przestrzennej:
 - średnią liczbę osób zamieszkujących w mieszkaniach na obszarze rewitalizacji.

6.1 POZIOM INTERWENCJI POLICJI

Na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji posłużono się wskaźnikiem, który uwzględniał poziom czynów zabronionych w stosunku do liczby mieszkańców. Jest on węższy niż ten uwzględniony na etapie oceny realizacji programu rewitalizacji. Zmiany poziomu interwencji w odniesieniu do liczby mieszkańców przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 5 Wskaźnik interwencji Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w stosunku do liczby mieszkańców na obszarze rewitalizacji w latach 2018-2021

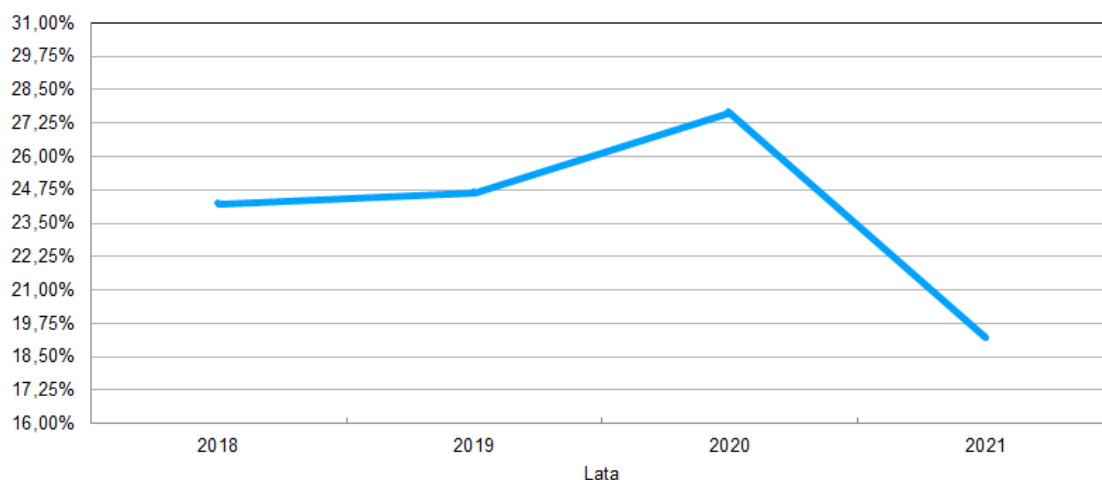

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju


W okresie 2019-2020 widoczny jest wzrost zjawiska o około 4 punkty procentowe w stosunku do roku 2018. Następnie roku 2020 nastąpiło wyraźne zwiększenie dynamiki spadku przestępstw. Jest to wynik wprowadzenia pierwszych obostrzeń w Polsce, związanych z ograniczeniem organizacji imprez, zgromadzeń, podróży, i w konsekwencji ograniczenia wychodzenia na zewnątrz oraz zakazu opuszczania domów przez dzieci do lat 18.

Zamknięte zostały również parki, bulwary i plaże, jak również salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i piercingu. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, iż w I półroczu 2022 odnotowano ponowny wzrost przestępstw na terenie Polski. Sytuacja na terenie rewitalizacji będzie możliwa do zbadania dopiero po zamknięciu pełnego roku.

6.2. POZIOM BEZROBOCIA

Kolejnym wskaźnikiem, który zmonitorowano, była liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób zamieszkujących obszar rewitalizacji. Wyniki analizy przedstawia poniższy wykres.

Wykres 6 Udział bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców obszaru rewitalizacji w odniesieniu do wskaźnika bezrobocia dla Polski w latach 2016, 2018-2021

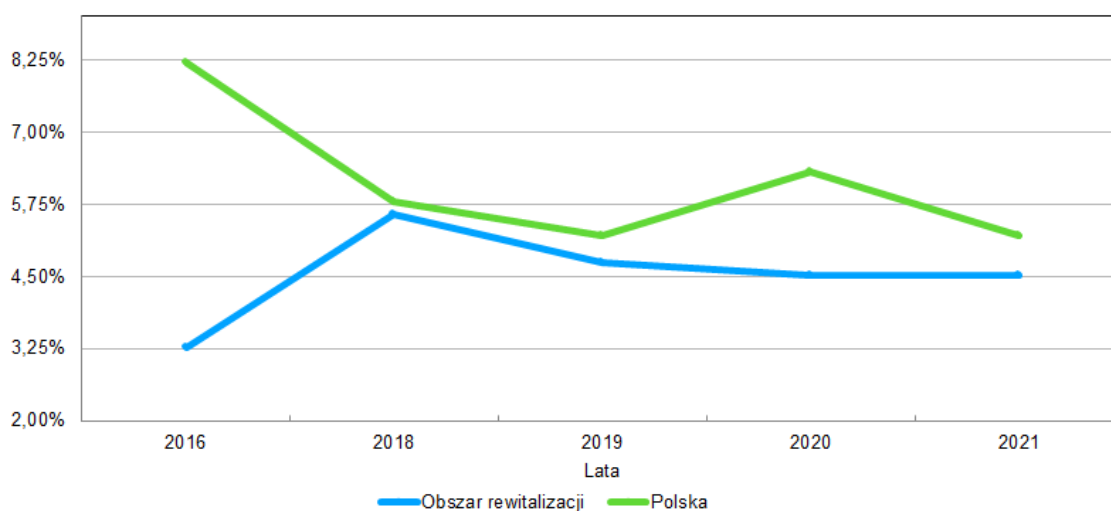


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych urzędu pracy w Jastrzębiu-Zdroju oraz GUS w Warszawie.

Zestawienie trendów zmiany poziomu bezrobocia na obszarze rewitalizacji w odniesieniu do zmiany dla całej Polski pokazuje, że zmiany wywołane programem rewitalizacji są pozytywne. Na obszarze kraju w 2021 r. zanotowano niewielki wzrost poziomu bezrobocia. Na obszarze rewitalizacji od 2018 do 2021 roku zarejestrowano jego systematyczny spadek. Tendencja spadkowa wyhamowała w 2021 roku, jednakże jest to skutek nałożonych restrykcji oraz zmian, jakie zaszły w gospodarce w okresie ogłoszonego w marcu 2020 stanu pandemii. Porównując II półrocze 2021 oraz I półrocze 2022 r. zauważalny jest ponowny spadek liczby bezrobotnych na obszarze rewitalizacji. Można zatem wnioskować, iż w 2022 dynamika wzrostu liczby bezrobotnych będzie słabła.

6.3. POZIOM WSPARCIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Na kolejnym wykresie przedstawiony został udział osób korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej na obszarze rewitalizowanym, na terenie województwa śląskiego oraz Polski.

Wykres 7 Udział osób objętych pomocą społeczną w stosunku do liczby mieszkańców obszaru rewitalizowanego, województwa śląskiego i Polski w latach 2016, 2018-2021

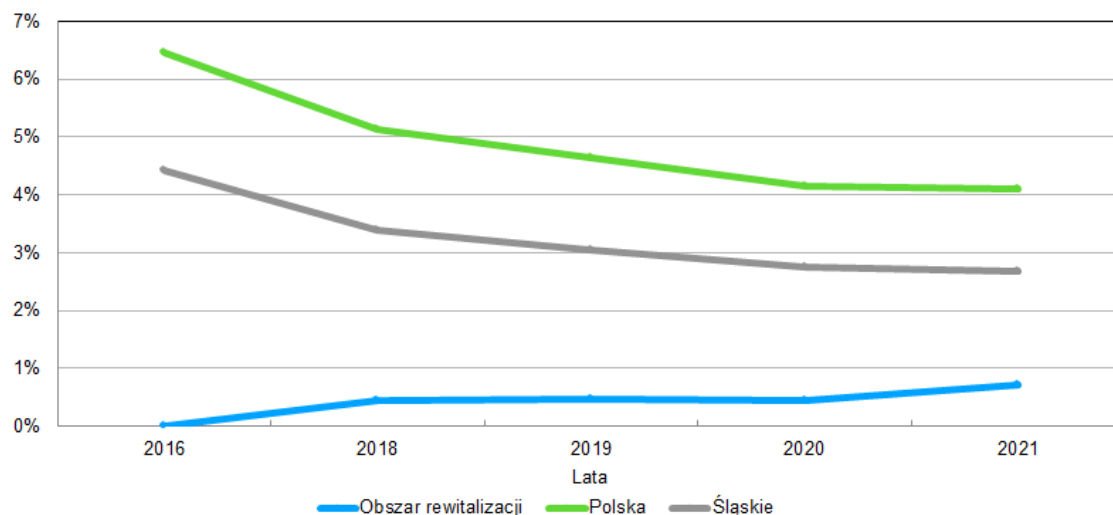


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz danych Bank Danych Lokalnych GUS w Warszawie.

W przypadku pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji, wskaźnik przez okres od 2018 do 2020 roku utrzymywał się na tym samym poziomie. Na obszarze Polski i Śląska w tym samym okresie uległ zmniejszeniu. Sytuacja zmieniła się w roku 2021, w okresie pandemii. Wtedy na terenie gminy pojawiły się nowe problemy społeczne i niezidentyfikowane wcześniej sytuacje kryzysowe. Analizując dane zebrane w I półroczu 2022 roku nadal zauważalna jest tendencja wzrostowa badanego wskaźnika. Okres pandemii oznaczał reorganizację codziennego życia społecznego w kluczowych jego aspektach, począwszy od życia prywatnego, do reorganizacji pracy wielu instytucji. Czas pandemii był sytuacją, którą trudno porównać z jakimkolwiek innym okresem w historii. Pandemii spowodowała zawieszenie funkcjonowania życia w wielu kluczowych jego wymiarach na terenie całego kraju. Prowadzenie działań zaradczych odbywały się na zasadach „eksperymentu”. Do chwili obecnej trudno stwierdzić, które działania krótkoterminowe oraz długoterminowe były funkcjonalne, a które nie.

6.4. POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wskaźnik przedsiębiorczości to udział podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym, które mają siedzibę na obszarze rewitalizacji, w stosunku do liczby mieszkańców. Wyniki analizy przedstawione zostały na poniższym wykresie.

Wykres 8 Udział podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby mieszkańców działających na obszarze rewitalizowanym, w województwie śląskim oraz w Polsce w latach 2013, 2018-2021

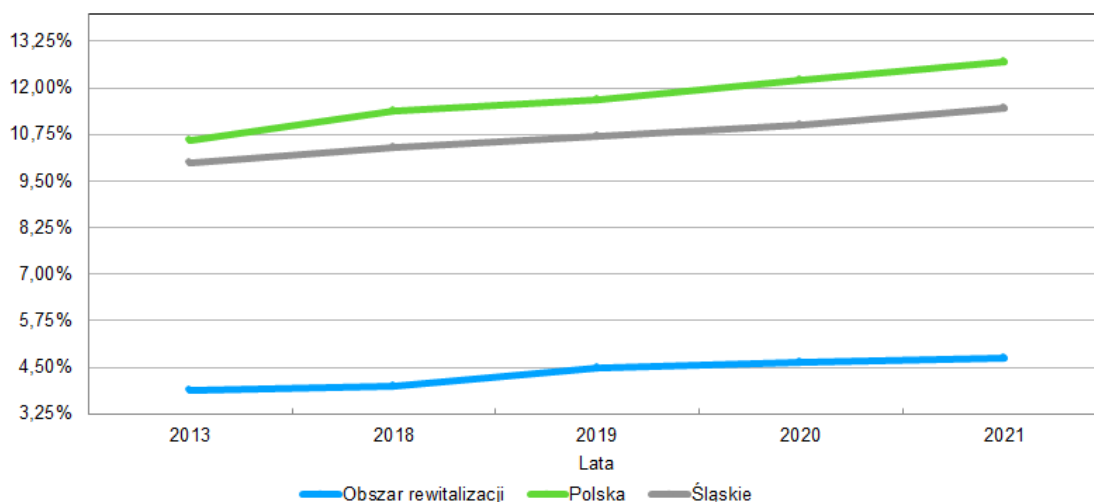

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju oraz danych Bank Danych Lokalnych GUS w Warszawie.


W badanym okresie poziom przedsiębiorczości na obszarze rewitalizowanym uległ nieznacznej poprawie. Podobne zmiany zarejestrowane zostały na całym Śląsku oraz w Polsce. Jednakże wskaźnik jest zależny od liczby mieszkańców obszaru rewitalizacji. Analizując liczbę podmiotów na obszarze rewitalizacji, do roku 2020 odnotowano wzrost w tym zakresie. Natomiast w roku 2021 widoczny jest znaczący spadek liczby podmiotów, jest to wynik narzuconych restrykcji w 2020 (13 marca 2020 roku zostały wprowadzone pierwsze ograniczenia działalności gospodarczej) oraz wyzwań, jakie przyniosła pandemia. Zebrane dane za I półrocze 2022 r. pokazują niewielki przyrost podmiotów gospodarczych na badanym obszarze, jednakże rosnące koszty prowadzenia biznesu oraz problemy ze znalezieniem pracowników sugerują, iż wynik na koniec roku może być niekorzystny.

Lata 2019-2020 pokazują, iż działania przewidziane w *Lokalnym Programie Rewitalizacji* przynosiły oczekiwany efekt. Jednakże przyjęte założenia oraz działania zaradcze nie zakładały problemów, z którymi obecnie borykają się przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, iż projekty przedstawione w *Lokalnym Programie Rewitalizacji* nie są katalogiem zamkniętym, ponieważ na bieżąco mogą być zgłaszane kolejne zadania. Miasto w miarę możliwości stara się reagować na sygnalizowane potrzeby, wprowadzając do Programu dodatkowe przedsięwzięcia. Tak przyjęta strategia działania może zaowocować w kolejnych latach wzrostem gospodarczym na obszarach rewitalizacji.

6.5. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W MIESZKANIACH

Na potrzeby oceny wpływu program rewitalizacji na obszar poddany rewitalizacji zbadano, jak zmieniała się średnia liczba osób zamieszkujących jedno mieszkanie w 2016 r. oraz w latach 2018-2021. Wyniki przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 9 Liczba mieszkańców przypadających na jedno mieszkanie na obszarze rewitalizowanym, w województwie śląskim oraz w Polsce w latach 2016, 2018-2021

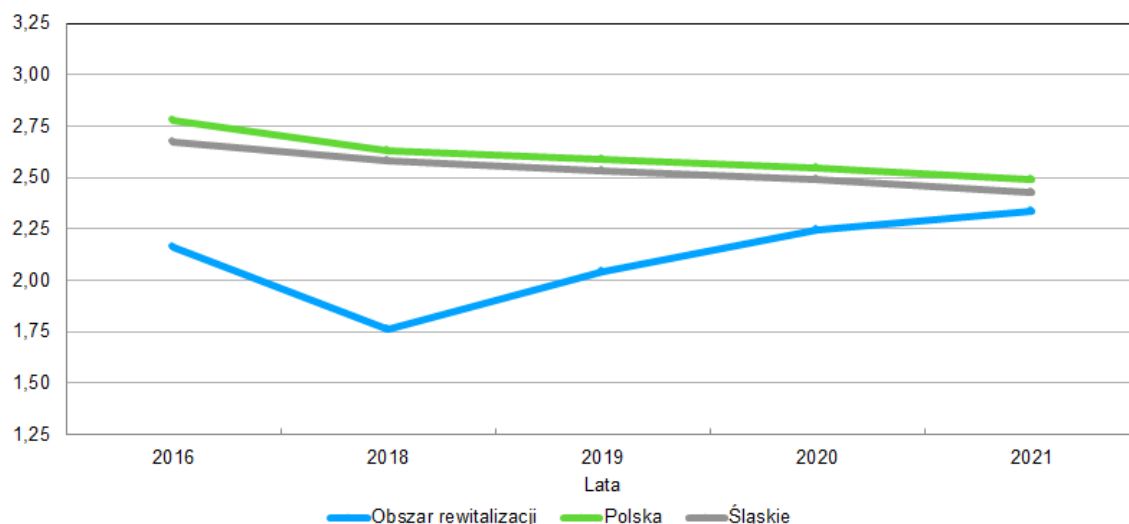

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju oraz danych Bank Danych Lokalnych GUS w Warszawie.

Na obszarze Polski i województwa śląskiego średnia liczba osób w jednym mieszkaniu była wyższa niż na obszarze rewitalizowanym i w badanym okresie nieznacznie się zmniejszyła. Odwrotny trend wystąpił na obszarze rewitalizowanym. Średnia liczba osób przypadających na jedno mieszkanie wzrosła powyżej poziomu z 2016 r. po wyraźnym spadku w 2018 r. Rosnący trend jest powodowany kurczącą się zdolnością kredytową potencjalnych nabywców mieszkań. Rok 2022 r. prawdopodobnie nie przyniósł poprawy w tym zakresie, ponieważ ceny mieszkań wzrastają w tempie niespotykanym od czasów boomu w latach 2006-2008. Co więcej, po serii podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej poważnie skurczyła się zdolność kredytowa potencjalnych nabywców mieszkań.

7. OCEN STOPNIA REALIZACJI CELÓW PROGRAMU REWITALIZACJI - WNIOSKI

Kluczowe założenia w zakresie efektów wdrażania niniejszego Programu, sformułowane w oparciu o materiały zebrane w części diagnozującej, przekładają się na docelową wizję obszaru rewitalizowanego, którą można sformułować w następujący sposób:

Jastrzębie-Zdrój w roku 2023 to miasto:

- spójne społecznie i gospodarczo,
- aktywnie i skutecznie przeciwdziałające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
- oferujące mieszkańcom stały dostęp do trwałych i konkurencyjnych miejsc pracy,
- dbające o zachowanie tożsamości lokalnej i kształtowanie dobrych relacji między mieszkańcami,
- umożliwiające efektywną współpracę różnych środowisk,
- gwarantujące swoim mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa,
- zapewniające wysoką estetykę i funkcjonalność przestrzeni miejskiej.

Powyżej wskazane punkty składają się na docelową wizję obszaru rewitalizacji, określoną w Lokalnym Programie Rewitalizacji, której odzwierciedleniem jest określony Cel Strategiczny, brzmiący następująco:

Neutralizacja problemów skoncentrowanych w granicach obszaru rewitalizacji w celu zapewnienia spójnego rozwoju społeczno-gospodarczego Jastrzębia-Zdroju.

Celem realizacji założonych w Programie Rewitalizacji projektów jest zagwarantowanie:

- rozwoju społecznego,
- rozwoju przestrzennego,
- rozwoju gospodarczego,

na terenie zdefiniowanym jako obszar rewitalizacji.

Warunkiem brzegowym wdrożenia nakreślonej wizji jest realizacja kompleksowych działań uwzględnionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji i – w ich efekcie – neutralizacja problemów koncentrujących się na wytyczonym obszarze rewitalizacji, co umożliwi zachowanie spójności społecznej miasta i stworzy warunki dla długofalowego i zrównoważonego rozwoju całego miasta.

Wszystkie monitorowane projekty i ich realizacja, czyli cały proces ewaluacji, pozwala zaobserwować jak realnie zmienia się miasto w wymiarze przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Podczas monitoringu przedstawiono bardzo szeroki zakres zrealizowanych i realizowanych projektów, oraz zadań Miasta, które wpłynęły na rozwiązanie czy zminimalizowanie zdiagnozowanych problemów zgłaszanych na konsultacjach w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

W pierwszym okresie sprawozdawczym, czyli od roku 2016 do marca 2019 roku, zrealizowano w pełni 22 projekty, co stanowi 34,4% wszystkich projektów listy głównej. Budżet projektów zrealizowanych w tym okresie wyniósł 3 138 727,69 zł

Przedmiotowe projekty ukierunkowane były na:

1. Działania aktywizujące osoby mniej uprzywilejowane w społeczeństwie, takie jak osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z których skorzystało 1037 seniorów, 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 30 osób z niepełnosprawnościami.
2. Działania związane ze współpracą transgraniczną, w które zaangażowało się 3 partnerów zaangażowanych i przyniosły realizację 7 projektów, z których skorzystało:
 - 238 uczestników wspólnych programów edukacyjnych oraz przygotowania zawodowego w celu transgranicznego wspierania zatrudnienia młodzieży, zwiększenia możliwości edukacyjnych kształcenia wyższego i przygotowania zawodowego,
 - 252 uczestników warsztatów.

3. Działania związane z szerzeniem wiedzy na temat ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i planów rozwoju. Korzyści z realizacji projektów związanych z ekonomią to m.in. organizacja 10 warsztatów, 7 nowych miejsc pracy i 21 podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem
4. Wydarzenia kulturalne i sportowe o charakterze integracyjnym, zorganizowane dla mieszkańców poszczególnych osiedli w celu ich aktywizacji oraz budowania sąsiedzkich relacji. Zrealizowano 26 projektów integracyjnych skierowanych dla mieszkańców poszczególnych osiedli.
5. Działania kulturalne związane z zagadnieniami takimi jak: film, muzyka, teatr, rozrywka, będące okazją do integracji międzypokoleniowej, z których skorzystało 15 681 osób.
6. Działania ukierunkowane na poprawę infrastruktury miejskiej, w których ramach powstało 0,585 km sieć ścieżek i tras o charakterze dydaktycznym, prowadzących po zabytkach przemysłowych oznaczonych tablicami informacyjnymi.
7. Doposażenie Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju i utworzenie profesjonalnych pracowni do praktycznej nauki zawodów: technik elektryk oraz technik informatyk, oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju i utworzenie profesjonalnych pracowni do praktycznej nauki zawodu: chłodnictwo i klimatyzacja. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 260 uczniów.

W drugim okresie sprawozdawczym, czyli od kwietnia 2019 r. do maja 2021 r., zrealizowano w pełni 14 projektów, co stanowi 21,9% wszystkich projektów listy głównej na łączną wartość 52 597 865,52 zł

Przedmiotowe projekty ukierunkowane były na:

1. Aktywizację zawodową osób zamieszkujących obszar rewitalizacji. W ramach podjętych działań wsparciem objęto 222 osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach i 17 osób niepełnosprawnych.
2. Aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu. W ramach prowadzonych działań wybudowano siłownię na wolnym powietrzu z elementami do street workout.
3. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Miasta. W ramach działań przeprowadzono prace termomodernizacyjne obejmujące powierzchnię 4 124 m² i zmodernizowano lub wybudowano 16 jednostek źródeł ciepła. Działania te przyczyniły się do zaoszczędzenia energii cieplnej w ilości 3 126,52 GJ/rok oraz elektrycznej w ilości 66,26 MWh/rok. Redukcja PM10 wyniosła 0,0289 tony/rok.
3. Poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia. W ramach podjętych działań dostosowano 1 obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do ulepszonych świadczeń zdrowotnych uzyskało dostęp 66,99 tys. osób.
4. Dodatkowo też w ramach pojedynczych projektów zorganizowano warsztaty międzypokoleniowe podczas 8 spotkań, w których wzięło udział 150 osób. Wykonano projekt sektorowych ram kwalifikacji dla Górnictwa w Polsce.

W trzecim okresie sprawozdawczym, czyli od czerwca 2021 r. do października 2022 r., zrealizowano w pełni 7 projektów, co stanowi 10,9% wszystkich projektów listy głównej na łączną wartość 41 224 722,78 zł.

Projekty z tej grupy dotyczyły następujących obszarów rewitalizacji:

1. Aktywizacji i wyrównywania szans mieszkańców z obszaru rewitalizacji. W ramach podjętych działań wsparciem objęto 321 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 43 osoby z niepełnosprawnościami
2. Aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych. W ramach działania wsparciem objęto 239 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy.

3. Działań infrastrukturalnych dotyczących takich obszarów rewitalizacji, jak: adaptacji lokali tymczasowych oraz lokali mieszkalnych na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Gagarina 116, z której skorzystały 64 osoby, rewitalizacji części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów, z której korzysta 1310 osób oraz przebudowy i zwiększenia efektywności energetycznej w budynku na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta, która przyczyniła się do zaoszczędzenia energii elektrycznej o 43,21061 MWh/rok oraz energii cieplnej o 1165,72 GJ/rok. Łącznie zredukowano emisję PM 10 o 0,62005 tony/rok.
4. Działań turystyczno-kulturalnych. Stworzono trwały i atrakcyjny produkt turystyczny, dzięki któremu dojdzie do rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czeskim. Oczekuje się, że działanie przyniesie wzrost odwiedzin do 10 000,00 osób.

Co istotne na moment sporządzenia raportu w trakcie realizacji było 12 projektów, co stanowiło 18,8% wszystkich projektów. Zaawansowanie finansowe według złożonych kart wynosi obecnie około 32 381 542,94 zł.

Dalsze działania zakładają m.in.:

- rewitalizację budynków na potrzeby utworzenia miejsca aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenów rewitalizowanych,
- aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz poprawiające BHP,
- staże,
- utworzenie świetlicy specjalistycznej Centrum Usług Społecznych,
- inwestycje polegające na dopasowaniu indywidualnego wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach działalności gospodarczej oraz udzielaniu wsparcia finansowego,
- inwestycje infrastrukturalne obejmujące m.in.: zabytkowy budynek Willi Antonina, obiekt Łazienki III w Parku Zdrojowym.

Zaplanowane w *Lokalnym Programie Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju* cele zostały w znacznym stopniu zrealizowane, a efekty realizacji projektów rewitalizacyjnych widoczne są w poszczególnych lokalizacjach i obszarach oddziaływania tych projektów. Warto podkreślić, iż w badanym okresie Miasto prowadziło szereg działań, które nie zostały ujęte w LPR, a które są odpowiedzią na zgłaszane na bieżąco przez mieszkańców problemy.

Projekty rewitalizacyjne wynikające z jastrzębskiego LPR oraz inne realizowane na bieżąco w zakresie rewitalizacji (niewpisane w LPR) są odpowiedzią na problemy zgłaszane przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych oraz problemy zdiagnozowane na podstawie wyznaczonych wskaźników na tych obszarach. Wszystkie te projekty miały znaczący wpływ na ograniczenie negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji.

Należy zatem przyjąć, iż Program Rewitalizacji zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami: poprzez prowadzoną partycypację społeczną, włączenie różnych grup interesariuszy w proces rewitalizacji oraz współpracę i działania różnych grup na rzecz realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym dla pozyskiwania środków na realizację projektów lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Podejmowane działania rewitalizacyjne skoncentrowane były na obszarze rewitalizacji oraz ukierunkowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów i zmierzały do zachowania zasad kompleksowości i komplementarności.

Zgromadzono kompletne, pełne oraz rzetelne dane i informacje służące do ewaluacji Programu Rewitalizacji, przeprowadzono zgodny z założeniami monitoring, w tym przeprowadzono proces aktualizacji ankiet zgodnie z potrzebami.

Mimo trwającej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19, LPR zrealizowano w zadowalającym stopniu. Potwierdzają to zebrane dane, gdzie na 64 projekty aż 43 zostały zrealizowane i zakończone w okresie wdrażania LPR, 12 jest w trakcie realizacji, a 5 jest planowanych do zrealizowania w przyszłości. Jedynie 4 projekty nie zostaną zrealizowane i są to projekty niezależne od miasta. Łącznie po zakończeniu wszystkich inwestycji poziom realizacji wszystkich projektów osiągnie 86 %.

8. UWAGI

Brak.

9. SPIS TABEL

TABELA 1 WSKAŹNIKI POZIOMU REALIZACJI CELÓW PROGRAMU	3
TABELA 2 PROJEKTY ZREALIZOWANE W OKRESIE DO MARCA 2019 R.....	6
TABELA 3 PROJEKTY ZREALIZOWANE W OKRESIE OD KWIETNIA 2019 R. DO MAJA 2021 R.....	20
TABELA 4 PROJEKTY ZREALIZOWANE OD CZERWCA 2021 DO PAŹDZIERNIKA 2022	33
TABELA 5 PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI.....	41
TABELA 6 PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI	59
TABELA 7 PROJEKTY, KTÓRYCH REALIZACJA JEST ZAWIESZONA.....	60
TABELA 8 FINANSOWA REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW PROGRAMU REWITALIZACJI	64
TABELA 9 FINANSOWA REALIZACJA PROGRAMU REWITALIZACJI DO PAŹDZIERNIKA 2022 R.....	72
TABELA 10 ANALIZA OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW MONITORINGOWYCH.....	74

10. SPIS WYKRESÓW

WYKRES 1 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW DO MARCA 2019 ROKU.....	16
WYKRES 2 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW OD KWIETNIA 2019 R. DO MAJA 2021	31
WYKRES 3 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW OD CZERWCA 2021 R. DO PAŹDZIERNIKA 2022	39
WYKRES 4 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW	62
WYKRES 5 WSKAŹNIK INTERWENCJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W JASTRZĘBIU-ZDROJU W STOSUNKU DO LICZBY MIESZKAŃCÓW NA OBSZARZE REWITALIZACJI W LATACH 2018-2021	89
WYKRES 6 UDZIAŁ BEZROBOTNYCH W STOSUNKU DO LICZBY MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI W ODNIESIENIU DO WSKAŹNIKA BEZROBOCIA DLA POLSKI W LATACH 2016, 2018-2021	90
WYKRES 7 UDZIAŁ OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ W STOSUNKU DO LICZBY MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZOWANEGO, WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I POLSKI W LATACH 2016, 2018-2021	91
WYKRES 8 UDZIAŁ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W STOSUNKU DO LICZBY MIESZKAŃCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM, W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ W POLSCE W LATACH 2013, 2018-2021	92
WYKRES 9 LICZBA MIESZKAŃCÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNO MIESZKANIE NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM, W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ W POLSCE W LATACH 2016, 2018-2021	93
